



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2022
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-03-00234**

Elab :2022-03-10

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia

DEP: SPORTECS SYNTHETIC GRASS SA DE CV - FACTURA NO. A 1623 INSTALACIÓN DE PASTO SINTETICO DE LA CANCHA DE FUTBOL AMERICANO UNIDAD SALTILLO. (ESTIMACIÓN 1) CONTRATO NO. 003/22 AD.MTTO. MONTO TOTAL \$ 5,390,728.67

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-5000	PRV	2448	PAG	470	SPORTECS SYNTHETIC GRASS SA DE CV	\$ 1,617,218.61	
5162-5000	PAR	6270100	PAG	470	FACTURA NO. A- 1623/SOL.MTTO.202-B INST. DE PASTO SINTETICO DE LA CANCHA DE FUTBOL AMERICANO	\$ 1,617,218.61	
1112-1505	BCO	RE-BNTE07			(PD 470 DEP) SPORTECS SYNTHETIC G - FACTURA NO. A 1623 INSTALACIÓ		\$ 1,617,218.61
2112-5000	PRV	2448	PAG	470	FACTURA NO. A- 1623/SOL.MTTO.202-B INST. DE PASTO SINTETICO DE LA CANCHA DE FUTBOL AMERICANO		\$ 1,617,218.61
TOTALES POLIZA						\$ 3,234,437.22	\$ 3,234,437.22

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / IxeBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/03/2022 14:59

Cuenta/ CLABE Ordenante	0118733476
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Ordenante	UAA750303NHA
Moneda	MXP
ID Tercero	2448
Nombre del Beneficiario	SPORTECS SYNTHETIC GRASS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0261038956
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Beneficiario	SSG130719FV7
Importe a Transferir	\$1,617,218.61
	\$0.00
Fecha Aplicación	07/03/2022
Número de Referencia	394
Propósito de la Transferencia	PGO FAC A1623 SPORTECS SYNTHETIC
Clave de Rastreo	46770
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CARLOS MONSIVAIS LEIJA
Fecha Captura	07/03/2022 02:58:01 p. m.
Ejecutó	CARLOS MONSIVAIS LEIJA
Fecha de Ejecución	07/03/2022 02:58:59 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Contra Recibo
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.
01 (844) 411-0200
UAA750303NHA

No.394

Beneficiario		2448	SPORTECS SYNTHETIC GRASS SA DE CV		7 DE MARZO DE 2022	
Factura	uid	SubTotal	I.V.A.	I.E.P.S.	Importe	
1623	PAGO DIRECTO DOCUMENTO 470	1,617,218.61	0.00	0.00	1,617,218.61	
				TOTALES	1,617,218.61	



UN MILLON SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 61/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: _____


COPIA

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2022

PAGO DIRECTO
FORMATO: F-7.14-1



Imprimir



DOCUMENTO No. 470

PAGO DIRECTO

Entidad Federativa :

5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Región :

5 -

Municipio :

30 - SALTILLO

Finalidad :

25611 - ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

Unidad Responsable :

410302001 -

Sub Programa :

4164 - Rehabilitación de Campos Deportivos

Solicitante

1516-MANDUJANO ALVAREZ JOSE ENRIQUE

Concepto

FACTURA NO. A 1623 INSTALACIÓN DE PASTO SINTETICO DE LA CANCHA DE FUTBOL AMERICANO UNIDAD SALTILLO. (ESTIMACIÓN 1) CONTRATO NO. 003/22 AD.MTTO. MONTO TOTAL \$ 5,390,728.67

BENEFICIARIO

2448 - SPORTECS SYNTHETIC GRASS SA DE CV

Cuenta Bancaria

-

Elaborado : 2022-03-02

Liberado :

Autorizado :

Part.	Descripción de la Partida	Importe
6270100	FACTURA NO. A- 1623/SOL.MTTO.202-B INST. DE PASTO SINTETICO DE LA CANCHA DE FUTBOL AMERICANO	\$ 1,617,218.61
	TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO	\$ 1,617,218.61



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

SPORTECS SYNTHETIC GRASS SA DE CV
SSG130719FV7

Folio Fiscal	
DEA8EC8A-29DF-4CF2-B9CF-B64B83D8718A	
Fecha y Hora de Emisión	
2022-03-01T10:34:26	
Fecha y Hora de Certificación	
2022-03-01T10:34:27	
Serie	Folio
A	1623

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 25198

No. de Certificado Emisor: 00001000000503942402

Datos del Receptor		
R.F.C	Nombre del Receptor	Uso CFDI
UAA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	P01

Conceptos							
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1.000000	E76	mts2	72154002	30% 1era. ANTIPO DEL CONTRATO 003/22 MTT. INSTALACION DE PASTO SINTETICO DE LA CANCHA DE FUTBOL AMERICANO UNIDAD SALTILLO		1394153.97	1394153.97

Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$223,064.64

Desglose de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

Importe con Letra:
UN MILLON SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS (61/100) M.N.


Subtotal	\$1,394,153.97
Impuestos Traslados	\$223,064.64
Total	\$1,617,218.61

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago
MXN	1	1	PUE	03

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000506236653	Versión CFDI:	3.3
	Sello Digital del Emisor TSCaAd/vntGKkIUajiDqBYOii6PnBw9hIZScAV8LaWmWU/pDj1VXWnSYy2XzPKLJgHirwUS9F29dRCHqPEx3ij3sWUJYZoFww/+0u9hQIKqmJSEuz4iIVU3RrrqH/GRqCs9K+qIHq+mn3LEoDa1ZIHsuXNTS8d2JP7Yn6caO3PUOeH1mtSA5pOaOJttUI9sB3C4nFjzzkGZrDeDXg+KWaaaQouGQllkugms+9tTMSyFZZO8TaqrpZj5JyB9Z/+9MU1m+0w9GENYSHB0MIE9pg9o6ZcuSpkiXwzGwiKKJudN/qgeiMMPyRgzQukraaEPG1NKJPMg/RUmCaQ==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT [1.1 dea8ec8a-29df-4cf2-b9cf-b64b83d8718a 2022-03-01T10:34:27 FID080111867 TSCaAd/vntGKkIUajiDqBYOii6PnBw9hIZScAV8LaWmWU/pDj1VXWnSYy2XzPKLJgHirwUS9F29dRCHqPEx3ij3sWUJYZoFww/+0u9hQIKqmJSEuz4iIVU3RrrqH/GRqCs9K+qIHq+mn3LEoDa1ZIHsuXNTS8d2JP7Yn6caO3PUOeH1mtSA5pOaOJttUI9sB3C4nFjzzkGZrDeDXg+KWaaaQouGQllkugms+9tTMSyFZZO8TaqrpZj5JyB9Z/+9MU1m+0w9GENYSHB0MIE9pg9o6ZcuSpkiXwzGwiKKJudN/qgeiMMPyRgzQukraaEPG1NKJPMg/RUmCaQ== 00001000000506236653]			

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Fecha de Impresión 01/03/2022 10:34:40 a. m.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obra y Servicios Relacionados con las mismas

Calzada Antonio Narro # 1923, col. Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208

Saltillo, Coah. A 31 de enero de 2022

CONSTANCIA

La Dirección General Administrativa de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro hace constar que:

El proveedor SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S.A. DE C.V., en cumplimiento al contrato 003/22 A.D. INSTALACION DE PASTO SINTETICO DE LA CANCHA DE FUTBOL AMERICANO UNIDAD SALTILLO, y con fundamento en el Artículo 48 de la Ley de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas, entrega a esta Universidad, a fin de garantizar el anticipo, el cumplimiento y vicios ocultos de las obligaciones contraídas en el referido contrato lo siguiente:

Cheque emitido por la Institución Bancaria BANORTE, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero.

Derivado de la cuenta: 00261038956

Cheque Número: 0001290

Cantidad: \$2'156,291.46 (dos millones ciento cincuenta y seis mil doscientos noventa y un pesos 46/100 M.N.) por el 40% de garantía de anticipo

Cheque Número: 0001289

Cantidad: \$467,717.98 (cuatrocientos sesenta y cuatro mil setecientos diecisiete pesos 98/100 M.N.) por el 10% de garantía de cumplimiento

Cheque Número: 0001288

Cantidad: \$467,717.98 (cuatrocientos sesenta y cuatro mil setecientos diecisiete pesos 98/100 M.N.) por el 10% de garantía de vicios ocultos

Sucursal: 0605, Saltillo, Coah. victoria

Titular de la cuenta: SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S.A. DE C.V.

Quedarán bajo resguardo de esta Dirección y a su vez serán liberados cuando haya concluido el servicio del objeto del contrato de forma satisfactoria para la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

ATENTAMENTE
ALMA TERRA MATER

M.C. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
Y PRESIDENTE DEL COYSRM

Ccp. Archivo



SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S.A. DE C.V.
R.F.C. 55G-130719-FV7



31 DE ENERO DE 2022

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

\$ 464,717.98

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 98/100 MN)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0605 SALTILLO VICTORIA
SALTILLO, COAH.
CTA. No. 0261038956

0001289

HOMERO ALCAMAR

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00171511590721002610389560001289

OBJETO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

10% ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE \$ 464,717.98 DEL CONTRATO

Complimiento

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
102-0000-001				464,717.98	
		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:
		<i>[Signature]</i>			
			SUMAS IGUALES		

0001289



SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S.A. DE C.V.
R.F.C. SGG-180719-FV7



31 DE ENERO DE 2022

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

\$ 464,717.98

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 98/100 MN)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0605 SALTILLO VICTORIA
SALTILLO, COAH.
CTA. No. 0261038958

0001288

HONERO ALAN V

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0009151159072100261038958 0001288

LEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

10% ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE \$ 464,717.98 DEL CONTRATO

Vicios Ocultos

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER		
102-0000-001				464,717.98			
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES	

0001288

31 DE ENERO DE 2022

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

\$ 2,156,291.46

MONEDA NACIONAL

(DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 MIN)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0805 SALTILLO VICTORIA
SALTILLO, COAH.
C.T.A. No. 029-1038956

0001290

HONERO A CASHA V.

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 25 5 1 590 7 2 1 00 26 10 38 9 56 0000 1 290

EPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

40% ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE \$ 2,156,291.46 DEL CONTRATO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
102-0000-001				2,156,291.46	
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:
				SUMAS IGUALES	

0001290



México • Nuevo León • Coahuila • Bajío • Península • Texas

Saltillo Coahuila, 01 de Marzo de 2022

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

A quien Corresponda:

Por medio de la presente enviamos un cordial saludo haciendo de su conocimiento que recibimos el pago del 30% del valor de la obra \$1,617,218.61 (un millón seiscientos diecisiete mil doscientos dieciocho pesos 61/100 M.N), que corresponde ala primera estimación.

Agradeciendo de antemano sus atenciones, quedamos de ustedes para cualquier aclaración.

Lic. Juan Antonio de la Fuente Alvear.

Representante Legal.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' and 'A' followed by a horizontal line, is written over a horizontal line. The signature is crossed out with a diagonal line.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'J' and 'A' followed by a horizontal line, is written on the right side of the page.



Saltillo, Coahuila a 27 Enero del 2022

Universidad Autónoma Antonio Narro.
At'n a quien corresponda.

Por medio de la presente se hace constar del inicio de los trabajos para la Cancha de Futbol Americano Unidad Saltillo, el día 27 de Enero del 2022. Así mismo se informa que la fecha de la terminación de los trabajo será el día 15 de Marzo del 2022(En condiciones de clima favorables).

Sin mas por el momento quedo a sus orden es.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ramos", written over a horizontal line.

C.P. Juan Antonio de la Fuente Alvear

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ramos", written to the right of the main signature line.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J.A.", written at the bottom right of the page.

Sportecs Synthetic Grass, S.A. de C.V.



Calendario de Obra
Ciente: UAAAN
Campo de Fútbol Americano
Ubicación: Saltillo, Coahuila.

Saltillo, Coahuila, Mex. 31 de Enero 2021

CANTIDAD DEL	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5												
	L	M	M	J	V	S	S	L	M	M	J	V	S	S	L	M	M	J	V	S	S	L	M	M	J	V	S	S	L	M	M	J	V	S	S	L	M	M	J	V	S
1																																									
1.1	Trazo y nivelación de terreno																																								
1.2	Despalme de terreno, espesor de 10cm																																								
1.3	Escalfado, Homogenizado y Compactado con una capa de espesor de 15 cm, al 90% PROCTOR, para despalme de Terraplen.																																								
1.4	Base Hidráulica de 15cm de espesor Homogenizada y compactada al 95% PROCTOR.																																								
1.5	Riego de Impregnación a razón de 1.5/m2																																								
2	Pasto Sintético																																								
2.1	Suministro de Alfombra SPORTECS Synthetic Grass tipo Fibrilado Proturf 50/850 tufting pelo cortado POLIETILENO HIBRIDO FIBRILADO FB SLIDE 2547 8800 dtex fibrilado retorcido y estabilizado con color de fibra; Field Green, de ancho e fibra 8-40 mm y cantidad de filamentos 7, con un espesor de fibra de 120 p m, con torzones de 35 T/m fibrilación de 1.2 mm y una resistencia a la tensión de 170 N Certificaciones aprobadas ISO 9001:2008 y Shaw Quality Systems, ISO 14001. Con una altura de base de 50 mm y una altura de 52 mm y peso hilado de 850 gr/m2, de ancho de rollo de 3.70 metros.																																								
2.2	Suministro de Alfombra SPORTECS Synthetic Grass tipo Fibrilado Proturf 50/850 tufting pelo cortado POLIETILENO HIBRIDO FIBRILADO FB SLIDE 2547 8800 dtex fibrilado retorcido y estabilizado con color de fibra; Amarillo para Zonas de Anulación.																																								
2.3	Suministro de Alfombra SPORTECS Synthetic Grass tipo Fibrilado Proturf 50/850 tufting pelo cortado POLIETILENO HIBRIDO FIBRILADO FB SLIDE 2547 8800 dtex fibrilado retorcido y estabilizado con color de fibra; Negro, para letras Institucionales.																																								
2.4	Suministro e Instalación de Logotipo Central. De acuerdo a Imagen. 50 m2																																								
2.5	Plantillas Para letras "UAAAN" Y "BUTRES".																																								
2.6	Instalación, cosido a mano, llenzo a llenzo, vulcanizado y adherido a la superficie, agregados de arena sílica 50-55 y tulle granulada 3-5mm y todo lo necesario para su correcta ejecución.																																								

NOTAS:
 LA SEMANA 1, SE CONSIDERA 7 DÍAS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO
 EL PROGRAMA DE OBRA PUEDE VARIAR EN CASO DE QUE SE PRESENTEN CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS INAPROPIADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
 EL HORARIO DE TRABAJO SE CONSIDERA DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A.M. A 6:00 P.M., Y LOS SABADOS DE 9:00 A.M. A 1:00 P.M.

Cliente: UAAAN
 Proyecto: Cancha de Futbol Americano
 Medidas totales: 9,062.54 M2
 Ubicado en: Saltillo, Coahuila

Saltillo, Coahuila; Mex. 12 de Enero del 2022

TERRAPLANEO					
	Descripción	M2	Unidad	Cantidad	Costo
1	Trazo y nivelación de terreno	9062.54	M2	\$3.22	\$ 29,181.38
2	Despalme de terreno, espesor de 10cm	9062.54	M2	\$18.40	\$ 166,750.74
3	Escalificado, Homogenizado y Compactado con una capa de espesor de 15 cm, al 90% PROCTOR, para desplante de Terrapié.	9062.54	M2	\$16.67	\$ 151,072.54
4	Base Hidraulica de 1.5cm de espesor Homogenizada y compactada al 95% PROCTOR.	9062.54	M2	\$111.55	\$ 1,010,926.34
5	Riego de Impregnación a razón de 1.5/m2	9062.54	M2	\$18.97	\$ 171,916.38
				Total	\$1,529,847.38

PASTO SINTETICO					
	Descripción	M2	Unidad	Cantidad	Costo
1	Suministro de Alfombra: SPORTECS Synthetic Grass tipo Fibrilado Proturf 50/850 tufting pelo cortado POLIETILENO HIBRIDO FIBRILADO FB SLIDE 2547 8800 dtex fibrilado retorcido y estabilizado con color de fibra; Field Green, de ancho de fibra 8.40 mm y cantidad de filamentos 7, con un espesor de fibra de 120 p/m, con torciones de 35 T/m fibrilación de 1.2 mm y una resistencia a la tensión de 170 N Certificaciones aprobadas ISO 9001:2008 y Shaw Quality Systems, ISO 14001. Con una altura de base de 50 mm y una altura de 52 mm y peso hilado de 850 gr/m2, de ancho de rollo de 3.70 metros.	8172.54	M2	\$238.98	\$ 1,953,073.61
2	Suministro de Alfombra: SPORTECS Synthetic Grass tipo Fibrilado Proturf 50/850 tufting pelo cortado POLIETILENO HIBRIDO FIBRILADO FB SLIDE 2547 8800 dtex fibrilado retorcido y estabilizado con color de fibra; Amarillo para Zonas de Anotación.	890.00	M2	\$308.07	\$ 274,182.30
3	Suministro de Alfombra: SPORTECS Synthetic Grass tipo Fibrilado Proturf 50/850 tufting pelo cortado POLIETILENO HIBRIDO FIBRILADO FB SLIDE 2547 8800 dtex fibrilado retorcido y estabilizado con color de fibra; Negro, para letras Institucionales.	266.00	M2	\$336.63	\$ 89,543.58
4	Suministro e Instalación de Logo tipo: Central De acuerdo a imagen. 50 m2	50.00	M2	\$388.50	\$ 19,425.00
5	Plantillas Para letras "UAAAN" Y "BÚTFRES"	9.00	Pza	\$2,000.00	\$ 18,000.00
6	Instalación, cosido a mano, llenos a llenzo, vulcanizado y adherido a la superficie, agregados de arena sílica 50-55 y águila granulada 3-5mm y todo lo necesario para su correcta ejecución.	9062.54	M2	\$105.00	\$ 951,566.70
				Total Pesos	\$3,305,791.19
				Descuento A Pasto de Colores, Plantillas y Logo tipo	\$188,458.68
				Subtotal	\$3,117,332.51

Cotización en Pesos MX



PESOS

Subtotal Terr.	\$1,529,847.38
Subtotal Pasto	\$3,117,332.51
Subtotal	\$4,647,179.89
IVA	\$743,548.78
Total	\$5,390,728.67

Programa de Pagos		
1	40% Anticipo	\$2,156,291.47
2	30% Al salir materiales de fabrica	\$1,617,218.60
3	30% Al finalizar la obra	\$1,617,218.60
		Total Ingresos IVA
		\$5,390,728.67

CONDICIONES:
 9 años de garantía en el pasto sintético. Con su mantenimiento adecuado
 9 Años de garantía contra defectos de fabrica
 5 años de garantía contra Instalación
 Esta garantía dejará de surtir efecto por causas imputables a la base o actos de abuso
TIEMPOS DE ENTREGA:
 12 días de suministro. 25 días de Instalación
NOTAS:
 Esta cotización tiene una vigencia de 15 días a partir de esta fecha

[Handwritten signature and notes]

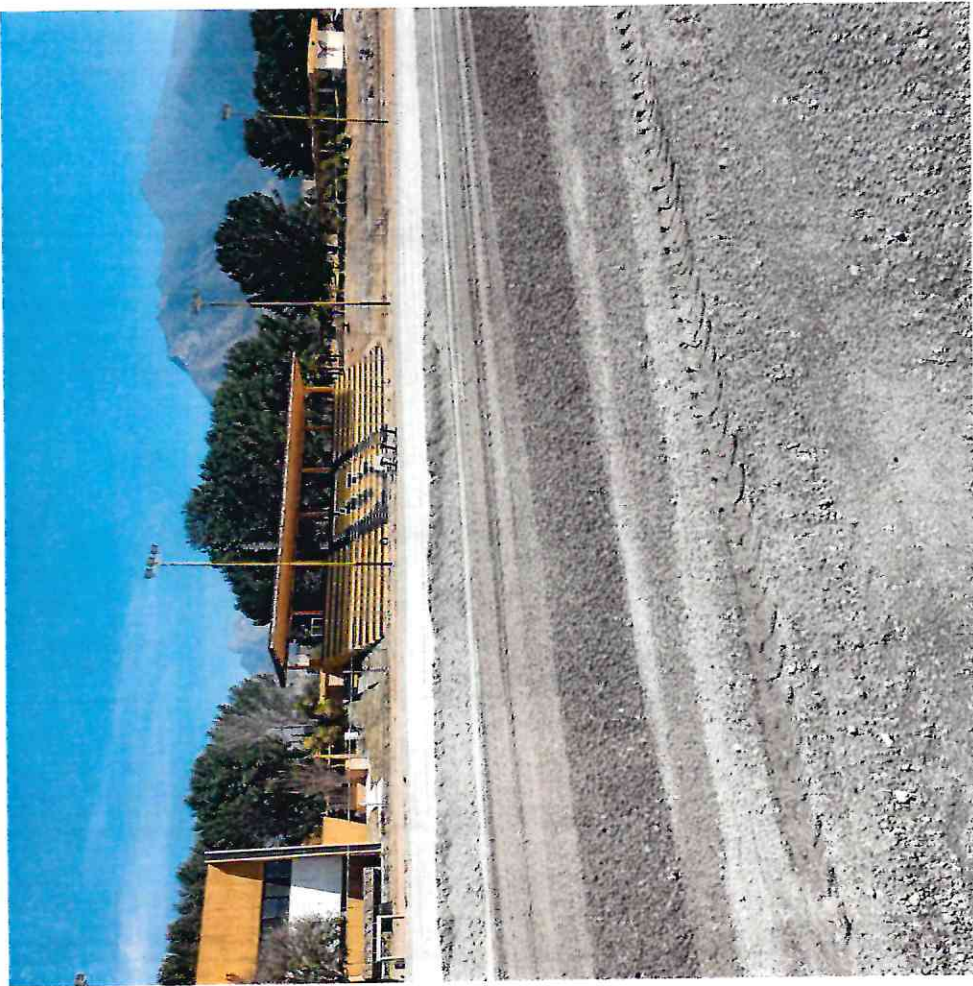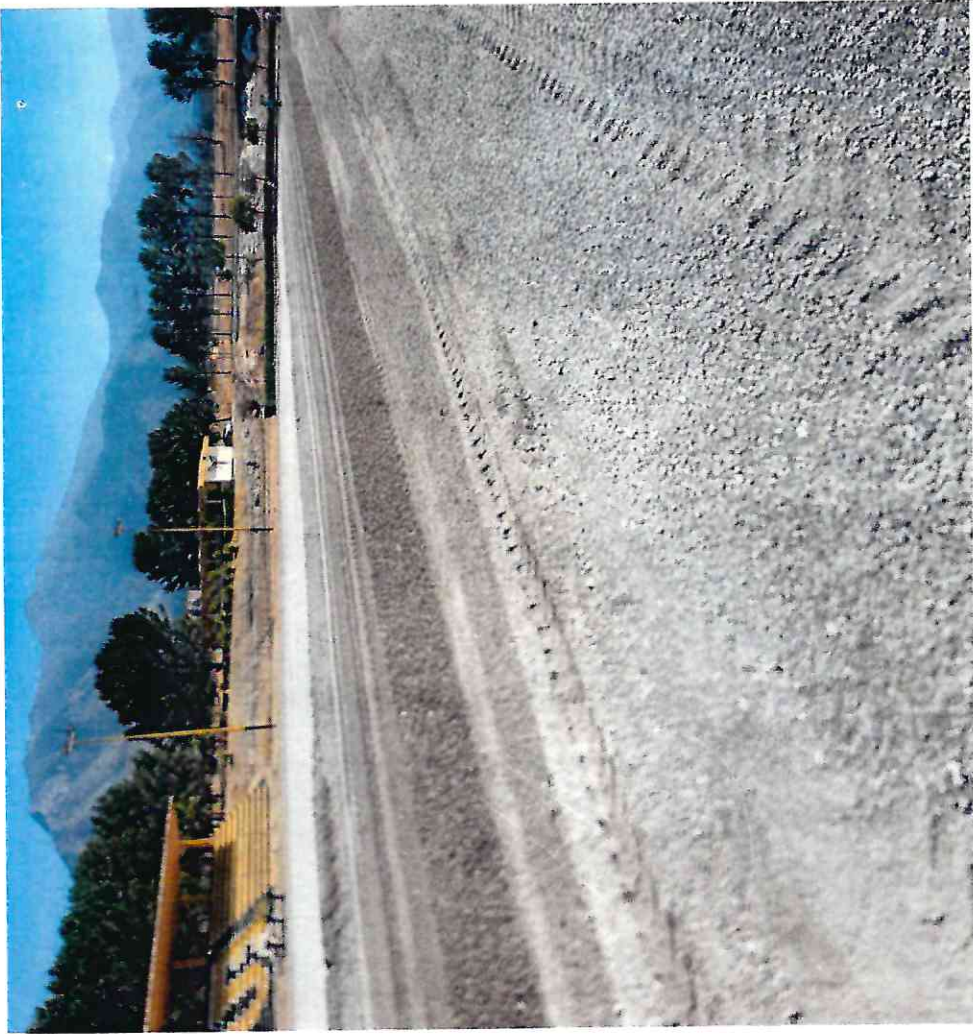


[Handwritten signatures in blue ink]

The image contains four distinct handwritten signatures in blue ink, arranged vertically. The signatures are stylized and cursive, with varying lengths and flourishes. They appear to be official signatures, likely from the individuals mentioned in the adjacent text.

1

2

3

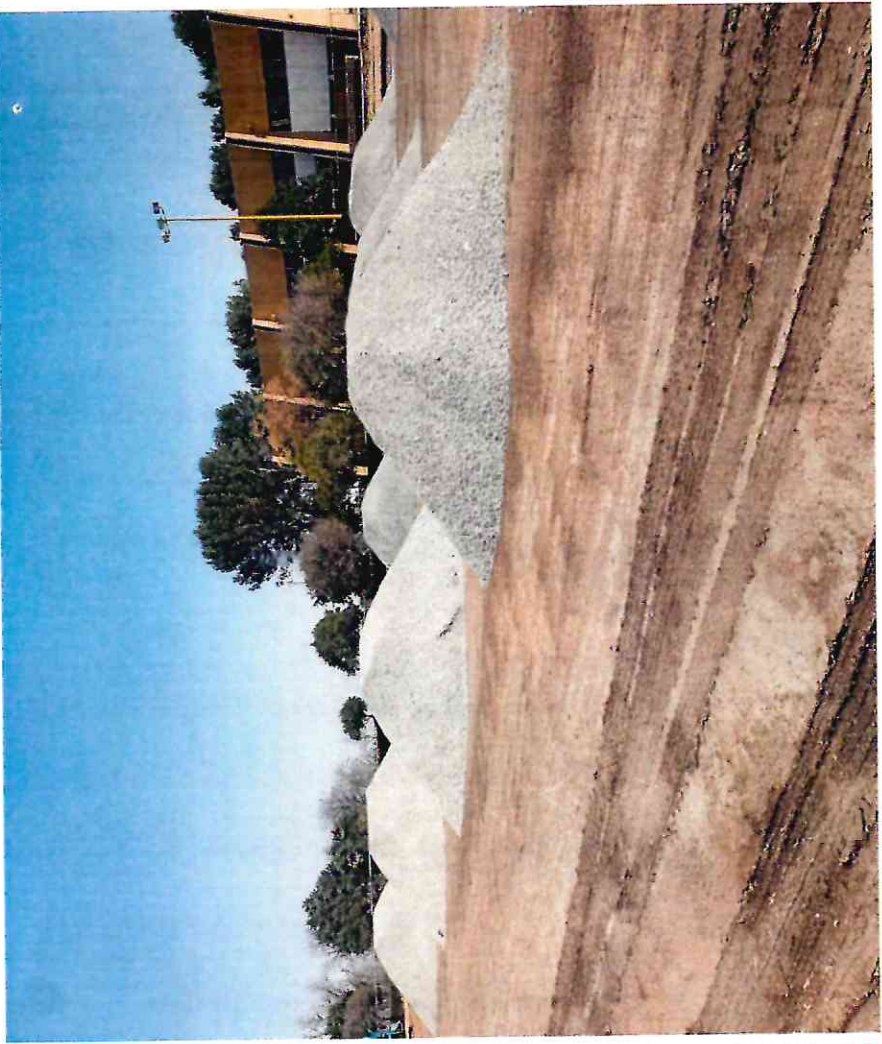

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signatures in blue ink]

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "S. M. ...".




Handwritten signature in black ink, possibly reading "S. M. ...".

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "S. M. ...".

Remodelacion cancha futbol americano UAAAN


- Miercoles 02 de Febrero de 2022


Iniciamos trabajos de terracerias en la cancha, comienza a trabajar la motoconformadora despalmando el terreno y haciendo un banco para posteriormente retirarlo del lugar


} } } 

- Jueves 03 de Febrero de 2022

Realizamos un levantamiento topografico del terreno para poder hacer el proyecto de niveles, marcamos con estacas niveles para poder conformar la terraceria, la motoconformadora continua despalmando el terreno.











- Viernes 04 de febrero de 2022
Continuamos con el despalme del terreno y
revisando niveles para continuar avanzando en
los trabajos de compensación y nivelación de
plataforma

- Sabado 05 de febrero de 2022
Terminamos con el despalme del 100% del
área, se colocaron estacas en toda la cancha para
poder afinar la terracería y dejar niveles para
humedecer el terreno compactar y comenzar a recibir
la base hidráulica

- Lunes 07 de febrero de 2022
No se realizaron trabajos por el día de asueto
y las lluvias del día de ayer

- Martes 08 de febrero de 2022
Se ajustó el diseño de la cancha y los
niveles. No se trabajó por la lluvia del fin
de semana

Revisado

- Miércoles 09 de Febrero de 2022

La motoconformadora trabaja cortando material de los extremos para dejar lista la plataforma

- Jueves 10 de Febrero de 2022

Avanzamos con los mismos trabajos, compensando áreas de bajas y rellenando con el material producto de corte marcado por el topógrafo

- Viernes 11 de Febrero de 2022

Analizamos la opción de cortar material de relleno de banco indicado por personal de la DAAAN, se ingresa una retroexcavadora para iniciar con estos trabajos, la motoconformadora continúa trabajando en la plataforma, el topógrafo revisa niveles para afinar la terracería

Revisión

Revisión

Revisión

Revisión

- Sabado 12 de febrero de 2022

Despues trabajar con la retroexcavadora en el banco, se opto por mejor suministrar material de otro punto, el banco resulto ser material muy duro, la maquinaria en la plataforma avanza con corte y relleno segun niveles

- Lunes 14 de febrero de 2022

Iniciamos con el retiro del despalme de la cancha, ingreso retroexcavadora y 2 camiones para estar acarreado el material fuera de la cancha, la motoconformadora termina de afinar la mitad de la cancha

- Martes 15 de febrero de 2022

Empezamos a suministrar material de banco para

el relleno de las areas a trabajar, homogenizamos y tendemos para ir armando y conformando las franjas.

- Miércoles 16 de Febrero de 2022



El día de hoy llegó el vibrador y la pipa, continuamos con el suministro de material de banco y el tendido de material. Por la tarde vino el laboratorio para ir revisando la primera parte de la terracería que ya comenzamos a trabajar, la motoconformadora avanza con los trabajos.



- Jueves 17 de Febrero de 2022

El topógrafo libera niveles de la primera mitad de la cancha, con esto y la liberación del laboratorio tenemos tramo para empezar a acarrear base hidráulica, en el otro tramo de la cancha las máquinas continúan armando las franjas y capas de terraplen, llegaron 30 ton de caucho para la cancha, se descargarán al fondo

de la misma






- Viernes 18 de Febrero de 2022

Realizamos un recorrido con el Ing. Mandujano, el subdirector y el rector para ver avances y pormenores de los trabajos realizados, dentro de esto, se acordó que la VAAAN retirará las "H" de gol de campo y la estructura que está en la parte posterior de esta misma, también se hizo recorrido a los campos de alado para realizar el proyecto de la cancha de futbol y la de softbol, definimos la data que se va a construir del lado de la otra cancha.

- Sabado 19 de Febrero de 2022

El laboratorio libero una franja mas, al dia de hoy tenemos la mitad de la cancha completamente liberada, continuamos con el movimiento de tierra en la otra mitad



- Lunes 21 de Febrero de 2022

Iniciamos con el acarreo de base hidráulica, se presento la empresa de ARGI para hacer un levantamiento del terreno para realizar el nuevo proyecto de las otras 2 canchas. Las maquinas avanzan con el tramo, seguimos con el suministro de material de banco para el terraplen

- Martes 22 de Febrero de 2022

Continuamos con el acarreo de base para la cancha y las maquinas trabajan adecuadamente.

- Miercoles 23 de Febrero de 2022

El topografo revisa capas y niveles, el laboratorio reviso compactacion y libera tramo para seguir trabajando, al dia de hoy tenemos 17 talvas de base suministradas en sitio

- Jueves 24 de Febrero de 2022

Se suministro más material de banco para seguir trabajando las terracerías, la motoconformadora trabaja en las capas superiores para poder liberar más tramo para la base, se suministraron 10 folios más de base el día de hoy

- Viernes 25 de Febrero de 2022

La motoconformadora comienza a tender la base, se homogeniza también, el topógrafo marca niveles para definir las pendientes, avanzamos con los trabajos sin contratiempos

- Sábado 26 de Febrero de 2022

El día de hoy llegaron 49 rollos de pasto sintético se descargó sobre la cancha, avanzamos con los trabajos de terracerías en las siguientes capas

-Lunes 28 de Febrero de 2022

Continuamos con el avance de las terracerias
trabaja motoconformadora, vibro y pipa, el día
de mañana continuamos con el suministro de
base hidraulica



~~Superump UMANAN~~
Sr. Merio GOTZ-M.

