



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2022
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-06-01349**

Elab :2022-06-24

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia

DEP: REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. - FACTURA NO. 1191 TRABAJOS PARA PISO DE CONCRETO EN EXTERIOR DE TALLERES DE IDIOMAS CONTRATO NO. 37/22AD.MTTO. MONTO TOTAL \$ 230,517.55

APLICADA

| Cuenta | Tipo | Refer. | Doc | Núm. | Descripción de la Partida | Cargo | Abono |
|-----------------------|------|---------------|-----|------|--|---------------|---------------|
| 2112-1000 | PRV | 2121 | PAG | 1950 | REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | \$ 230,517.55 | |
| 5135-1000 | PAR | 3510100 | PAG | 1950 | FACTURA NO. 1191/SOL. MTTO.1308 TRABAJOS PARA PISO DE CONCRETOS EN EXTERIOR DE TALLERES DE IDIOMAS | \$ 230,517.55 | |
| 1112-1401 | BCO | SA- HSBC02 | | | (PD 1950 DEP) REA INGENIERIA Y CON - FACTURA NO. 1191 TRABAJOS PARA | | \$ 230,517.55 |
| 2112-1000 | PRV | 2121 | PAG | 1950 | FACTURA NO. 1191/SOL. MTTO.1308 TRABAJOS PARA PISO DE CONCRETOS EN EXTERIOR DE TALLERES DE IDIOMAS | | \$ 230,517.55 |
| TOTALES POLIZA | | | | | | \$ 461,035.10 | \$ 461,035.10 |

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B.06-1349
4972



Pagos SPEI enviados

Fecha: 24/06/2022
Hora: 07:43:49
Página: 1

Fecha valor: 24/06/2022 Clave de Rastreo: HSBC298351
Fecha de liquidación: 24/06/2022 Hora de liquidación: 14:41:48 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4001749597
Nombre del Ordenante: A UAAAN
Referencia del ordenante: F 1191 REA
Comisión cobrada: 0.00
Moneda: MXN
Monto: 230,517.55


DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 072078008178259554 Referencia Numérica: 1950
Nombre del Beneficiario: REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA
Banco Receptor: BANORTE
Concepto de Pago: F 1191 REA



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2022
PAGO DIRECTO
 FORMATO: F-7.14-1

Imprimir



DOCUMENTO No. 1950 **PAGO DIRECTO** **PENDIENTE**

Entidad Federativa : **5 - COAHUILA DE ZARAGOZA** **Elaborado : 2022-06-20**

Región : **5 -** **Liberado :**

Municipio : **30 - SALTILLO** **Autorizado :**

Finalidad : **25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR**

Unidad Responsable : **410302011 -**

Sub Programa : **4040 - MANTENIMIENTO REHABILITACION DE AULAS**

Solicitante **1516-MANDUJANO ALVAREZ JOSE ENRIQUE**

Concepto **FACTURA NO. 1191 TRABAJOS PARA PISO DE CONCRETO EN EXTERIOR DE TALLERES DE IDIOMAS CONTRATO NO. 37/22AD.MTTO. MONTO TOTAL \$ 230,517.55**

BENEFICIARIO **PRV-2121 : REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

Cuenta Bancaria

| Part. | Descripción de la Partida | Importe |
|------------------------------------|--|----------------------|
| 3510100 | FACTURA NO. 1191/SOL. MTTO.1308 TRABAJOS PARA PISO DE CONCRETOS EN EXTERIOR DE TALLERES DE IDIOMAS | \$ 230,517.55 |
| TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO | | \$ 230,517.55 |





**REA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.**

REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV

RIC120111RV8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Blvd. Periférico Luis Echeverría Álvarez, 1342/6, Avícola, 25294, Saltillo, 12570, Saltillo,
Coahuila de Zaragoza, México
Tel. 8444303311

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA "ANTONIO NARRO"
UAA750303NHA
USO CFDI: I01 - Construcciones
CALZADA ANTONIO NARRO, 1923, BUENAVISTA, 25315, SALTILLO, Saltillo,
Coahuila, México

Factura 1191

FOLIO FISCAL (UUID)
0042F8D9-F207-4A61-8196-989274BFFACD
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000502403198
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2022-06-23T09:23:10
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2022-06-23T09:11:13
LUGAR DE EXPEDICIÓN
25294

CONCEPTOS

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------|---|-----------------|---------------|
| 1.00 | E48 - OBRA | RECIBÍ, DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO (COMITÉ DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS), LA CANTIDAD DE \$ 230,517.55 (DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 55/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 037-22 AD MTTO., DE FECHA 3 DE JUNIO DE 2022. RELATIVO A: "TRABAJOS PARA PISO DE CONCRETO EN EXTERIOR DE TALLERES DE IDIOMAS, EN UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO". | \$ 198,722.03 | \$ 198,722.03 |

Clave Prod. Serv. - 81101500 Ingeniería civil

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 198,722.03 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 31,795.52

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS,
55/100 MXN

SUBTOTAL \$ 198,722.03

TRaslado IVA TASA 0.160000 \$ 31,795.52

TOTAL \$ 230,517.55

TIPO DE COMPROBANTE

RMA DE PAGO
TODO DE PAGO

MONEDA

I - Ingreso

03 - Transferencia electrónica de fondos

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

V/lgMOubWECb7waW2619qN0iW7i5nsWryWIZJJB3WU2NqC9YcepeUETVCzE3Zxp17PGNak9Hpp8r9Qq+hSi9qdmLWqomgaMoJV4ILNu+hzE0arAVDOAp64v6/AcVldoEIAFXbyCz8B58fJZVRHmdG0kEj0i0bgtA0qVZuY5G4cvCiQcDvAihlnaK1j2iXe8MesZapP44n0g59XivTnyH5N94/zOoaNu127NmNOERHaU6M8P0qMeGbdTdpN61rGfsOeb4altfbk89Nvs9uvDozNd9PuNx4il6mi0kDjctKsbdjalokcFcVc6B9VZGpvsHBnBDFDFBPrdZAYrXQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JvEow8xUTpgxocf30JJegCN2Dy8fd2SwZ53VWK00kYEZx0NinLRAUnjAZMi1nCm+3i50/1k8U+GYjMExGWjgtArR9XF8FeoB+G25vsmvKBR/4G4WlhTrnDg0yun2f0DgTelGeudOweuglFnRLE8zvDYxLXF1wCq/LBcnoDfc9Vx24IBp1xHOjU90RcZ+stFJEfK+2+ZN3p8AP+X/i1CxOsSmALIkqBd+wbU2Gs4Gx7zdaGmdk3JhB7yoqXEBsmp+hiR2dPg8jrqaiXOJWmF3mZiAtllukGZDN66fb1SBwll3AS39KAWbsyVpT9TAI0py2slqhzmsK0vmfYg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.1|0042F8D9-F207-4A61-8196-989274BFFACD|2022-06-23T09:23:10|SVT110323827|V/lgMOubWECb7waW2619qN0iW7i5nsWryWIZJJB3WU2NqC9YcepeUETVCzE3Zxp17PGNak9Hpp8r9Qq+hSi9qdmLWqomgaMoJV4ILNu+hzE0arAVDOAp64v6/AcVldoEIAFXbyCz8B58fJZVRHmdG0kEj0i0bgtA0qVZuY5G4cvCiQcDvAihlnaK1j2iXe8MesZapP44n0g59XivTnyH5N94/zOoaNu127NmNOERHaU6M8P0qMeGbdTdpN61rGfsOeb4altfbk89Nvs9uvDozNd9PuNx4il6mi0kDjctKsbdjalokcFcVc6B9VZGpvsHBnBDFDFBPrdZAYrXQ==|00001000000413073350|]


Facturar en línea premium® CFDI


Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cdfi:Comprobante xmlns:cdfi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="25294" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I"
Total="230517.55" Moneda="MXN" SubTotal="198722.03"
Certificado="MIIGHjCCBAagAwlBAglUMDAwMDEwMDAwMDA1MDI0MDMxOTgwDQYJKoZlhcNAQELBQAwwgGEMSAwHgYDVQOQDBdVVV
RPUkIEQUQgQ0VSVeIGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwU0VSVkIDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVjJQIVUQVJQTEaMBGGA1UECwwR
U0FULUUFUyBBdXRob3JpdHxkKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbhRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYulEhJREFM
R08gNzcsIENPTC4gR1VFUJFk8xJDAMBGNVBBEMBTAMzAwMQswCQYDVQQGEwJNWEZMBCGA1UECAwQOIVREFEIERFIE1FWEIDTzETM
BEGA1UEBwwKQ1VBVUUhURU1PQzEVMBMGA1UELMMU0FUOTcWzAxTk4zMVwwWgYJKoZlhcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU
5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJQIVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJQIVZRU5URTAeFw0xOTEyMTAxNjM1MzBaFw0y
MzEyMTAxNjM1MzBaMIIHsMTewLWYDVQQDEyhsRUeG5U5HRU5JRVRJQSBZIEPTKVTIFNBIERFIENWMTewLWYDVQQQeEYhSRU
Eg5U5HRU5JRVRJQSBZIEPTKVTIFNBIERFIENWMTewLWYDVQQKEyhsRUeG5U5HRU5JRVRJQSBZIEPTKVTIFNBIERFIENWMSUwLWYDVQQtExxSSUMxMjAxMTF5JggLyBDQVZSNjYwODI3REQ1MR4wHAYDVQQFExUgLyBDQVZSNjYwODI3SENMUkxEMDAXCj
AIBGNVBAstAS4wggEiMAOGCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCe+A6+swlUxmXxXIABs/Sct8maJveggglmR8DRoa9OvNb7gl2kzZ5R
HzPoSRqKlsYqJjk4yVecCk6+UBvqnvYLDG094HLUqZd7LQluGjNwOemAH7eRvOzilpbrj5ZR9QikExFgPhuh+Q8PYD93mNJD/XHmhVl/rC8AxAH9
tOfdmG14Eb8Jy5Sd/5BxDEoJ0Bc/XJq6Tf2iq5J3QZXQyGMC6Ebd09d2leiJdvrvEklOk/cBaEKE2dO+vmOzNrOlAvmWZOCfpT0x+30cgg7SDIDJYE6
OtT5IPrILMXgvEIszuONoeC8AypGeou/Gltz7YbH35IOxOP9eQiBJAoxFCfAgMBAAGjHTAbMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVROpBAQDAgB
AMA0GCSqGSIb3DQEBcWUAA4ICAQAzaDwm1ox9oiEEj/jt7eaFrG/lez3J/XGaVaEhQwUwVlWsw9T2WDDpckd33t8uaYMNJUTdsfxuOYhCdiOLc
GSqExUw/e3uYYyLqyxAv+mAM7QTIrVgBj4Ceb11MYTPzhfq5XB3GgEyldPnjOniJm3032eu3D76MkvtpvHdwKXanQLtRY7eJVaSVJToeW4Y4V
MAHew6SRPYam/WVOHnwT0yoyD/6OZT9zM7LXHPgNrig9BJIVJrvR3lKqLQaBt1QsCt+P3zKz317rDc/yMCdxGPLxHYeHaDNoQqxLNSAp82D0m
Sv0KOEzQmu7DCzed2PJmnlAfDveg4nGAsAX1sITWxt6Qtp7En2UqrfR1hNEBlIMR9C7q6GNzgjNnmz79hh4K26ESGCSFsVgC/RG0lkezEjGbAETI
f69F. zLcA2gPa4DRMuqoDknyWnaObqJy4IP1Ho1DaAVHS0JGhki0H5npgY6Cv3oCbX4/NEpMszJjBBo69TWS6HPA9NjgU1PFUSH6kJKEHW
RFHab03le4EM5G+9NU+mLt0WmwAg9ZalaJfwg6Hlt30/3/XqX77KhpW8Tnc3Da1rVOYC1s8odXN2FiR5oqjEhAaYal4R01EquD3JEGpb1jotBn4E
l8K0K9mRMIO7NjUP6/AotBh6f8W75EUfS9YfRICbyRFgw==" NoCertificado="00001000000502403198" FormaPago="03"
Sello="V/IgMOubWECb7waW26I9qNOfiW7i5nsWryWfZJB3WU2NqC9YcepeUETVZcE3Zxpt7PGNak/9Hpp/8r9Oq+hSi9qdmLywQomqaMoJV4
ILNu+bz/E0arAVDOAp64v6/AcvldoEtAFXbyCz8BS8fJZVRHmdG0kEj0i0bgtA0qVZoY5G4cvCiQXDaihlNaKtj2lZxEMesZapP44n0gS9XlvT/nyH5N
94/zOoaNu127NmN0ERHaU6M8P0qMeGbdTDpN61rGfsOeb4altlbKB9Nvs9uvDozNd9PuNx4il6mi0kDjctKSbdjalokcFcVC6B9VZGpvsHBnBDFDB
PrdZAYrXQ==" Fecha="2022-06-23T09:11:13" Folio="1191" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><cdfi:Emisor
RegimenFiscal="601" Nombre="REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV" Rfc="RIC120111RV8"/><cdfi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD
AUTONOMA AGRARIA "ANTONIO NARRO" Rfc="UAA750303NHA" UsoCFDI="I01"/><cdfi:Conceptos><cdfi:Concepto Importe="198722.03"
ValorUnitario="198722.03" Descripcion="RECIBÍ ,DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO (COMITÉ DE OBRAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS), LA CANTIDAD DE \$ 230,517.55 (DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS
55/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 037-22 AD MITTO., DE FECHA 3
DE JUNIO DE 2022. RELATIVO A : "TRABAJOS PARA PISO DE CONCRETÓ EN EXTERIOR DE TALLERES DE IDIOMAS, EN UNIVERSIDAD AUTONOMA
AGRARIA ANTONIO NARRO". Unidad="OBRA" Cantidad="1" ClaveProdServ="81101500"
ClaveUnidad="E48"><cdfi:Impuestos><cdfi:Traslados><cdfi:Traslado Importe="31795.524800" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"
Impuesto="002" Base="198722.03"/></cdfi:Traslados></cdfi:Impuestos></cdfi:Concepto></cdfi:Conceptos><cdfi:Impuestos
Totr ImpuestosTrasladados="31795.52"><cdfi:Traslados><cdfi:Traslado Importe="31795.52" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"
Impuesto="002"/></cdfi:Traslados></cdfi:Impuestos><cdfi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="JvEow8xUTpgxoef30JjegCN2Dy8fd2SwZ53VWKQ0KcYEZX0NinLRAUnjAZMi1nCM+3i50/1k8U+GYjMEXGwJgtAnfR9XF8FeoB+G25vsl
mvKBR/4G4wllhTnrDq0yun2f0DGtelGeuDOweuglFnRLE8zvDYxLXF1wCq/LBCnoDfc9Vx24IBp1xHOjU90RcZ+stFJEtFK+2+Zn3pRBAP+X/i1CxOs
SmAlIkqBd+wbU2Gs4Gx7zdaGmdk3JhB7yoqXEbsmp+hiR2dPg8j1qaiXOJWmF3mZiAtlluKGZDN66fb1SBwllI3AS39K/WbSyVpT9TAI0py2slqhz
mSKOvmfyg==" NoCertificadoSAT="00001000000413073350"
SelloCFD="V/IgMOubWECb7waW26I9qNOfiW7i5nsWryWfZJB3WU2NqC9YcepeUETVZcE3Zxpt7PGNak/9Hpp/8r9Oq+hSi9qdmLywQomqaM
oJV4ILNu+bz/E0arAVDOAp64v6/AcvldoEtAFXbyCz8BS8fJZVRHmdG0kEj0i0bgtA0qVZoY5G4cvCiQXDaihlNaKtj2lZxEMesZapP44n0gS9XlvT/ny
H5N94/zOoaNu127NmN0ERHaU6M8P0qMeGbdTDpN61rGfsOeb4altlbKB9Nvs9uvDozNd9PuNx4il6mi0kDjctKSbdjalokcFcVC6B9VZGpvsHBnB
DFDBPrdZAYrXQ==" FechaTimbrado="2022-06-23T09:23:10" UUID="0042F8D9-F207-4A61-8196-989274BFFACD"
RfcProvCertif="SVT110323827"/></cdfi:Complemento></cdfi:Comprobante>





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obra y Servicios Relacionados con las mismas

Calzada Antonio Narro # 1923, col. Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208

AHORIT

Saltillo, Coah. A 3 de junio de 2022

CONSTANCIA

La Dirección General Administrativa de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro hace constar que:

El proveedor **REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, en cumplimiento al contrato **037/22 AD. MTTO. "TRABAJOS PARA PISO DE CONCRETO EN EXTERIOR DE TALLERES DE IDIOMAS"**, y con fundamento en el Artículo 48 de la Ley de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas, entrega a esta Universidad, a fin de garantizar el anticipo, el cumplimiento y vicios ocultos de las obligaciones contraídas en el referido contrato lo siguiente:

Cheque emitido por la Institución Bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero.

Derivado de la cuenta: 00817825955

Cheque Número: 0004960

Cantidad: \$19,872.00 (diecinueve mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.) por el 10% de garantía de Vicios Ocultos.

Cheque Número: 0004961


Cantidad: \$19,872.00 (diecinueve mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.) por el 10% de garantía de cumplimiento.

Sucursal: Saltillo, Coah.

Titular de la cuenta: REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Quedarán bajo resguardo de esta Dirección y a su vez serán liberados cuando haya concluido el servicio del objeto del contrato de forma satisfactoria para la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

**ATENTAMENTE
ALMA TERRA MATER**


**M.C. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
Y PRESIDENTE DEL COYSRM**

Ccp. Archivo



REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV

BANORTE

1 L 3058292

RIC120111RV8
PERIF L ECHEVERRIA 1342 6
AVICOLA
SALTILLO

C.P. 25294
COAHUILA

SALTILLO, COAHUILA

FECHA: 03 - JUNIO - 2022 | \$ 19,872.20

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGUIAR ANTONIO NARRO

(DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

156158

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0083 SALTILLO PZA. FUND.
CTA 081782595-5

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

4448511590721008178259550004960

EDICIÓN 2013

REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV

BANORTE

1 L 3004060

RIC120111RV8
PERIF L ECHEVERRIA 1342 6
AVICOLA
SALTILLO

C.P. 25294
COAHUILA

SALTILLO, COAHUILA

FECHA: 03 - JUNIO - 2022 | \$ 19,872.20

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGUIAR ANTONIO NARRO

(DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

156158

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0083 SALTILLO PZA. FUND.
CTA 081782595-5

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

3058511590721008178259550004960

EDICIÓN 2013

Reunión
[Handwritten signature]



**REA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.**

Boulevard Periférico Luis Echeverría 1342 6 Colonia Avícola
Saltillo, Coahuila, C.P. 25294 TEL. (01) 844-4-30-33-11
e-mail: rea_ic@hotmail.com

EXPERIENCIA A TU SERVICIO

Saltillo, Coahuila a 23 de Junio del 2022

**ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA
ENCARGADO DEL AREA DE MANTENIMIENTO
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**

P R E S E N T E.

Me refiero al Contrato No. **037/22 AD MTTT. "TRABAJOS PARA PISO DE CONCRETO EN EXTERIOR DE TALLERES DE IDIOMAS"**, en UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, SALTILLO COAHUILA., Recibí de la UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO la cantidad de: \$230,517.55 (DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 55/100 M.N.) por Concepto de Pago de Estimación No.1 correspondiente al 100.00% del monto Contratado.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

cc.p.- **ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA** - Supervisión de Obras y Mantenimiento UAAAN
c.c.p.- **ING. JULIO CESAR REYNA MONCADA**.- Residente de Obra. REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV
c.c.p.- ARCHIVO



**REA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.**

Boulevard Periférico Luis Echeverría 1342 6 Colonia Avícola
Saltillo, Coahuila, C.P. 25294 TEL. (01) 844-4-30-33-11
e-mail: rea_ic@hotmail.com

EXPERIENCIA A TU SERVICIO

PRESUPUESTO

OBRA PISO DE CONCRETO EN EXTERIOR DE TALLERES DE IDIOMAS DE LA UAAAN

SALTILLO COAHUILA

JUNIO DE 2022

CONTRATISTA: REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV

UBICACIÓN UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|----------|---|--------|----------|--------------|--------------|
| 1 | PRELIMINARES Y ALBAÑILERIA | | | | |
| 1.01 | DEMOLICIÓN DE PISO Y/O FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 12 CM. DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: ACARREOS DEL MATERIAL NO ÚTIL (ESCOMBRO), DENTRO Y HACIA FUERA DE LA OBRA. | M2 | 110.00 | \$ 87.94 | \$ 9,673.40 |
| 1.02 | PISO DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 RESISTENCIA NORMAL, FABRICADO CON REVOLVEDORA, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 19 MM (3/4"), LOS AGREGADOS GRUESOS Y FINOS UTILIZADOS SERÁN PROCEDENTES DE MATERIALES EXTRAÍDOS EN MANTO DE ROCA (PIEDRA DE CERRO), TRITURADOS Y CRIBADOS; TERMINADO PULIDO, JUNTAS FRIAS, INCLUYE: FABRICACION, ACARREOS, VACIADO, NIVELACION DEL CONCRETO, CIMBRA EN FRONTERAS, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 237.00 | \$ 377.80 | \$ 89,538.60 |
| 1.03 | RELLENO CON MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA (BAILARINA), AGUA, EN CAPAS DE 15 CM., INCLUYE: EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO. | M3 | 13.64 | \$ 238.75 | \$ 3,256.55 |
| 1.04 | RETIRO DE TOCÓN Y RAICES DE ÁRBOL, (DIMENSIONES VER EN OBRA) ; INCLUYE: ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA (MATERIAL NO UTIL) DENTRO Y HACIA FUERA DE LA OBRA , UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2.00 | \$ 10,346.28 | \$ 20,692.56 |
| 1.05 | LIMPIEZA DE PISO DE MOSAICO DE PASTA, CERAMICA ETC. CON CEPILLO AGUA, Y DETERGENTE EN POLVO Y AGUA HASTA LA ENTERA SATISFACCION DE LA SUPERVISION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 90.28 | \$ 38.63 | \$ 3,487.52 |
| 1.06 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE LADRILLO Y/O BLOCK DE CONCRETO, INCLUYE: DEMOLICIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 38.00 | \$ 194.67 | \$ 7,397.46 |
| 1.07 | DESMONTAJE DE FALSO PLAFÓN HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS, INCLUYE: DESMONTAJE, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIAL, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 60.00 | \$ 143.72 | \$ 8,623.20 |
| 1.08 | FORJADO DE CANALÓN PLUVIAL DE DIMENSIONES APROXIMADAS 25X25X30CM, REHUBICACIÓN DE REJILLA METALICA EXISTENTE, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 26.00 | \$ 367.43 | \$ 9,553.18 |
| 1.09 | APLANADO EN MUROS, MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 A PLOMO ACABADO FINO A LLANA O FLOTA; 2 CMS. PROMEDIO DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE : FILETEADO, REMATES Y EMBOQUILLADO; HASTA 3.50 M. DE ALTURA, ANDAMIOS, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 158.80 | \$ 187.64 | \$ 29,797.23 |
| 1.10 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR VINILICA MARCA BEREL DE LINEA, DOS MANOS DEL COLOR A ESCOGER. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 158.80 | \$ 66.73 | \$ 10,596.72 |



Sánchez Comunicaciones

Electricidad - Telecomunicaciones - Construcción

Asunto: COTIZACIÓN
JUNIO DEL 2022

PISO DE CONCRETO EN EXTERIOR DE TALLERES DE IDIOMAS DE LA UAAAN UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Por este medio, le presentamos la cotización requerida que consiste en lo siguiente:

| Partida | Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe MN |
|---------|----------|--------|---|-----------------|---------------|
| 1 | | | PRELIMINARES Y ALBAÑILERIA | | \$ 218,639.28 |
| 1.01 | 110.00 | M2 | DEMOLICIÓN DE PISO Y/O FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 12 CM. DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: ACARREOS DEL MATERIAL NO ÚTIL (ESCOMBRO), DENTRO Y HACIA FUERA DE LA OBRA. | \$ 95.52 | \$ 10,507.20 |
| 1.02 | 237.00 | M2 | PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 RESISTENCIA NORMAL, FABRICADO CON REVOLVEDORA, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 19 MM (3/4"), LOS AGREGADOS GRUESOS Y FINOS UTILIZADOS SERÁN PROCEDENTES DE MATERIALES EXTRAÍDOS EN MANTO DE ROCA (PIEDRA DE CERRO), TRITURADOS Y CRIBADOS; TERMINADO PULIDO, JUNTAS FRIAS, INCLUYE: FABRICACION, ACARREOS, VACIADO, NIVELACION DEL CONCRETO, CIMBRA EN FRONTERAS, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | \$ 416.14 | \$ 98,625.18 |
| 1.03 | 13.64 | M3 | RELLENO CON MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA (BAILARINA), AGUA, EN CAPAS DE 15 CM., INCLUYE: EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO. | \$ 252.48 | \$ 3,443.83 |
| 1.04 | 2.00 | PZA | RETIRO DE TOCÓN Y RAICES DE ÁRBOL, (DIMENSIONES VER EN OBRA) ; INCLUYE: ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA (MATERIAL NO UTIL) DENTRO Y HACIA FUERA DE LA OBRA , UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | \$ 11,658.24 | \$ 23,316.48 |
| 1.05 | 90.28 | M2 | LIMPIEZA DE PISO DE MOSAICO DE PASTA, CERAMICA ETC. CON CEPILLO AGUA, Y DETERGENTE EN POLVO Y AGUA HASTA LA ENTERA SATISFACCION DE LA SUPERVISION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | \$ 41.42 | \$ 3,739.40 |
| 1.06 | 38.00 | M2 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE LADRILLO Y/O BLOCK DE CONCRETO, INCLUYE: DEMOLICIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | \$ 203.64 | \$ 7,738.32 |
| 1.07 | 60.00 | M2 | DESMONTAJE DE FALSO PLAFÓN HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS, INCLUYE: DESMONTAJE, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIAL, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | \$ 158.24 | \$ 9,494.40 |
| 1.08 | 26.00 | ML | FORJADO DE CANALÓN PLUVIAL DE DIMENSIONES APROXIMADAS 25X25X30CM, REHUBICACIÓN DE REJILLA METALICA EXISTENTE, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | \$ 399.82 | \$ 10,395.32 |

[Handwritten signatures and initials]



Sánchez Comunicaciones

Electricidad - Telecomunicaciones - Construcción

Asunto: COTIZACIÓN
JUNIO DEL 2022

**PISO DE CONCRETO EN EXTERIOR DE TALLERES DE IDIOMAS DE LA UAAAN
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**

| | | | | | | | |
|--------------------|--------|----|---|----|--------|----|-------------------|
| 1.09 | 158.80 | M2 | APLANADO EN MUROS, MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 A PLOMO ACABADO FINO A LLANA O FLOTA; 2 CMS. PROMEDIO DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE : FILETEADO, REMATES Y EMBOQUILLADO; HASTA 3.50 M. DE ALTURA, ANDAMIOS, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | \$ | 207.31 | \$ | 32,920.83 |
| 1 | 158.80 | M2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR VINILICA MARCA BEREL DE LINEA, DOS MANOS DEL COLOR A ESCOGER. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | \$ | 74.28 | \$ | 11,795.66 |
| 1.11 | 73.20 | M2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN VENTANAS EXISTENTES PARA INTERIOR Y EXTERIOR MARCA BEREL DE LINEA, DOS MANOS DEL COLOR A ESCOGER. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | \$ | 91.02 | \$ | 6,662.66 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 218,639.28 |
| IVA 16.00 % | | | | | | | 34,982.28 |
| TOTAL | | | | | | | 253,621.56 |

Se requiere de un 50% de anticipo y el resto contra estamacion semanal
Esperando le sea de utilidad la información presentada, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente
Jesús Sánchez Gutiérrez
Apoderada Legal

SÁNCHEZ COMUNICACIONES SA DE CV. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR #198 RESIDENCIAL FATIMA
CP 25203 SALTILLO, COAHUILA, MEXICO RFC: SCO-100120-MA9
TEL: 431.32.80 EMAIL: sanchezcomunicaciones@hotmail.com



CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
GRAVA AZUL, S.A. DE C.V.

NUBES 747 SAN ANGEL .CP 25298 SALTILLO, COAH. RFC: CCG1611031T5
TEL: (844) 111-60-36 E-mail: g_aconstrucciones@outlook.com

PISO DE CONCRETO EN EXTERIOR DE TALLERES DE IDIOMAS DE LA UAAAN
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA

| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|-----------------|--|--------|----------|--------------|---------------|
| 1 | PRELIMINARES Y ALBAÑILERIA | | | | \$ 210,373.63 |
| 1.01 | DEMOLICIÓN DE PISO Y/O FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 12 CM. DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: ACARREOS DEL MATERIAL NO ÚTIL (ESCOMBRO), DENTRO Y HACIA FUERA DE LA OBRA. | M2 | 110.00 | \$ 92.09 | \$ 10,129.90 |
| 1.02 | PISO DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 RESISTENCIA NORMAL, FABRICADO CON REVOLVEDORA, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 19 MM (3/4"), LOS AGREGADOS GRUOSOS Y FINOS UTILIZADOS SERÁN PROCEDENTES DE MATERIALES EXTRAÍDOS EN MANTO DE ROCA (PIEDRA DE CERRO), TRITURADOS Y CRIBADOS; TERMINADO PULIDO, JUNTAS FRIAS, INCLUYE: FABRICACION, ACARREOS, VACIADO, NIVELACION DEL CONCRETO, CIMBRA EN FRONTERAS, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 237.00 | \$ 397.98 | \$ 94,321.26 |
| 1.03 | RELLENO CON MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA (BAILARINA), AGUA, EN CAPAS DE 15 CM., INCLUYE: EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO. | M3 | 13.64 | \$ 258.81 | \$ 3,530.17 |
| 1.04 | RETIRO DE TOCÓN Y RAÍCES DE ÁRBOL, (DIMENSIONES VER EN OBRA); INCLUYE: ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA (MATERIAL NO UTIL) DENTRO Y HACIA FUERA DE LA OBRA, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2.00 | \$ 10,985.34 | \$ 21,970.68 |
| 1.05 | LIMPIEZA DE PISO DE MOSAICO DE PASTA, CERAMICA ETC. CON CEPILLO AGUA, Y DETERGENTE EN POLVO Y AGUA HASTA LA ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPERVISION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 90.28 | \$ 41.09 | \$ 3,709.61 |
| 1.06 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE LADRILLO Y/O BLOCK DE CONCRETO, INCLUYE: DEMOLICIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 38.00 | \$ 207.68 | \$ 7,891.84 |
| 1.07 | DESMONTAJE DE FALSO PLAFÓN HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS, INCLUYE: DESMONTAJE, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIAL, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 60.00 | \$ 153.48 | \$ 9,208.80 |
| 1.08 | FORJADO DE CANALÓN PLUVIAL DE DIMENSIONES APROXIMADAS 25X25X30CM, REHUBICACIÓN DE REJILLA METALICA EXISTENTE, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 26.00 | \$ 387.92 | \$ 10,085.92 |
| 1.09 | APLANADO EN MUROS, MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 A PLOMO ACABADO FINO A LLANA O FLOTA; 2 CMS. PROMEDIO DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE : FILETEADO, REMATES Y EMBOQUILLADO; HASTA 3.50 M. DE ALTURA, ANDAMIOS, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 158.80 | \$ 199.64 | \$ 31,702.83 |
| 1.10 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR VINILICA MARCA BEREL DE LINEA, DOS MANOS DEL COLOR A ESCOGER. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 158.80 | \$ 71.42 | \$ 11,341.50 |
| 1.11 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN VENTANAS EXISTENTES PARA INTERIOR Y EXTERIOR MARCA BEREL DE LINEA, DOS MANOS DEL COLOR A ESCOGER. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 73.20 | \$ 88.54 | \$ 6,481.13 |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 210,373.63 |
| IVA | | | | | \$ 33,659.78 |
| TOTAL | | | | | \$ 244,033.41 |

CÉDULA DE IDENTIFICACION FISCAL



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



CCG1611031T5
Registro Federal de Contribuyentes

CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA GRAVA
AZUL
Nombre, denominación o razón
social

idCIF: 16110172955
VALIDA TU INFORMACIÓN
FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
**SALTILLO , COAHUILA DE ZARAGOZA A 25 DE
AGOSTO DE 2021**



CCG1611031T5

Datos de Identificación del Contribuyente:

| | |
|-----------------------------------|--|
| RFC: | CCG1611031T5 |
| Denominación/Razón Social: | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRAVA AZUL |
| Régimen Capital: | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| Nombre Comercial: | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRAVA AZUL |
| Fecha inicio de operaciones: | 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 |
| Estatus en el padrón: | ACTIVO |
| Fecha de último cambio de estado: | 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 |

Datos de Ubicación:

| | |
|---|--|
| Código Postal:25298 | Tipo de Vialidad: CALLE |
| Nombre de Vialidad: NUBES | Número Exterior: 747 |
| Número Interior: | Nombre de la Colonia: SAN ANGEL |
| Nombre de la Localidad: SALTILLO | Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: SALTILLO |
| Nombre de la Entidad Federativa: COAHUILA DE ZARAGOZA | Entre Calle: CALLE CELESTES |
| Y Calle: CALLE LAS LIRIAS | Correo Electrónico: gaytanclau@hotmail.com |
| Tel. Móvil Lada: 044 | Número: 8448699651 |



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, CP. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaCAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

Actividades Económicas:

| Orden | Actividad Económica | Porcentaje | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|-------|---|------------|--------------|-----------|
| 3 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada | 23 | 03/11/2016 | |
| 1 | Construcción de obras de urbanización | 21 | 03/11/2016 | |
| 1 | Alquiler de maquinaria para construcción, minería y actividades forestales | 15 | 03/11/2016 | |
| 4 | Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas | 13 | 16/11/2016 | |
| 6 | Administración y supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil u obra pesada | 10 | 03/11/2016 | |
| 5 | Preparación de terrenos para la construcción | 8 | 03/11/2016 | |
| | Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios | 5 | 16/11/2016 | |
| 8 | Otro autotransporte foráneo de carga general | 3 | 01/11/2017 | |
| 9 | Servicio de mudanzas | 2 | 01/11/2017 | |

Regímenes:

| Régimen | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|--------------|-----------|
| Régimen General de Ley Personas Morales | 03/11/2016 | |

Obligaciones:

| Descripción de la Obligación | Descripción Vencimiento | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|--|--------------|-----------|
| Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 03/11/2016 | |
| Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales. | Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio. | 03/11/2016 | |
| Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 03/11/2016 | |
| Pago definitivo mensual de IVA. | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 03/11/2016 | |
| Declaración de proveedores de IVA | A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 03/11/2016 | |
| Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 16/11/2016 | |
| Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 01/04/2017 | |

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades


HACIENDA
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Contacto
 Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
 Atención telefónica desde cualquier parte del país:
 MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
 (+52) 55 627 22 728

conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello:
Sello Digital:

||2021/08/25|CCG1611031T5|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||
QdoLe5tGXOvJg24BjoNhrBH7FGmXCc3xlvqJU+Jgrye3W3lc74aMqRgSkdyb3seS3SHgflQoyCf+/dIDokuJ0mCi
vDvxvUUKazaVEpzkvmz8m49aoZyCh063bAER0nUGPSksPCezeCUilz+G3rjM1SSifOPYox7Qn0ESZMUrY=



[Handwritten signature]



HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA



SAT

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.

Atención telefónica desde cualquier parte del país:

MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país:

(+52) 55 627 22 728

[Handwritten signature]



**REA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.**

Boulevard Periférico Luis Echeverría 1342 6 Colonia Avícola
Saltillo, Coahuila, C.P. 25294 TEL. (01) 844-4-30-33-11
e-mail: rea_ic@hotmail.com

EXPERIENCIA A TU SERVICIO

Saltillo, Coahuila a 03 de Junio del 2022

**ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA
ENCARGADO DEL AREA DE MANTENIMIENTO
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**

P R E S E N T E.

Me refiero al Contrato No. **037/22 AD MTTT. "TRABAJOS PARA PISO DE CONCRETO EN EXTERIOR DE TALLERES DE IDIOMAS"** en UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, SALTILLO COAHUILA., le informo a usted que se da inicio a los trabajos con fecha del día 03 de Junio de 2022.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

**ING. RODOLFO CÁRDENAS VILLA
REPRESENTANTE LEGAL**

cc.p.- **ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA** - Supervisión de Obras y Mantenimiento UAAAN
c.c.p.- **ING. JULIO CESAR REYNA MONCADA**.- Residente de Obra. REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV
c.c.p.- ARCHIVO



**REA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.**

Boulevard Periférico Luis Echeverría 1342 6 Colonia Avícola
Saltillo, Coahuila, C.P. 25294 TEL. (01) 844-4-30-33-11
e-mail: rea_ic@hotmail.com

EXPERIENCIA A TU SERVICIO

Saltillo, Coahuila a 23 de Junio del 2022

**ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA
ENCARGADO DEL AREA DE MANTENIMIENTO
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**

P R E S E N T E.

Me refiero al Contrato No. **037/22 AD MTTT. "TRABAJOS PARA PISO DE CONCRETO EN EXTERIOR DE TALLERES DE IDIOMAS"**, en UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, SALTILLO COAHUILA., le informo a usted que se dan por terminados los trabajos con fecha del día 17 de Junio de 2022.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

**ING. RODOLFO CÁRDENAS VILLA
REPRESENTANTE LEGAL**

cc.p.- **ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA** - Supervisión de Obras y Mantenimiento UAAAN
c.c.p.- **ING. JULIO CESAR REYNA MONCADA**.- Residente de Obra. REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV
c.c.p.- ARCHIVO



**REA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.**

Boulevard Periférico Luis Echeverría 1342-6
Col. Avícola, C.P. 25294, Saltillo, Coahuila
Teléfono (844) 4-30-33-11

CARATULA DE ESTIMACION

23 de Jun de 2022

| | | | | | |
|--|---|---------|----------------------------|------------|---|
| CONTRATO NO: | 037/22 AD. MTTO. | PERIODO | 03 Jun 2022 al 17 Jun 2022 | ESTIM. No. | 1 |
| UBICACIÓN | UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO | | | | |
| OBRA | "TRABAJOS PARA PISO DE CONCRETO EN EXTERIOR DE TALLERES DE IDIOMAS" | | | | |
| NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS A LOS QUE CORRESPONDA INCLUYE: SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN , INSTALACIÓN, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, APLICACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRAZO, HERRAJES, CORTES, FLETES, ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA, VELADOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | | | | |

PERIODO DEL CONTRATO:

INICIO: **03-jun-22**
TERMINO: **17-jun-22**

| ESTIMACION | | RETENCIONES | |
|--|-------------------|--|---|
| IMPORTE ESTA ESTIMACION: | 198,722.03 | RETENCION I.V.C.(-): | |
| AMORTIZACION DEL ANTICIPO SIN IVA (-): | - | OTROS (-): | - |
| SUBTOTAL: | 198,722.03 | TOTAL RETENCIONES: | - |
| 16% iva: | 31,795.52 | | |
| TOTAL | 230,517.55 | | |
| NETO A PAGAR | 230,517.55 | (DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 55/100 M.N.) | |

RECIBI

ING. RODOLFO CARDENAS VILLA
REPRESENTANTE LEGAL
REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV

Vo. Bo.

ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA
SUPERVISIÓN DE OBRA
UAAAN



REA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.

Boulevard Periférico Luis Echeverría 1342-6
Col. Avícola, C.P. 25294, Saltillo, Coahuila
Teléfono (844) 4-30-33-11

ESTADO DE CUENTA

23 de Jun de 2022

CONTRATO NO.: 037/22 AD. MTTO.

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

OBRA: "TRABAJOS PARA PISO DE CONCRETO EN EXTERIOR DE TALLERES DE IDIOMAS"

NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS A LOS QUE CORRESPONDA INCLUYE: SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, APLICACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRAZO, HERRAJES, CORTES, FLETES, ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA, VELADOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

PERIODO DEL CONTRATO:

INICIO: 03-jun-22

TERMINO: 17-jun-22

IMPORTE CONTRATADO IVA INC.: 230,517.55

| ESTIM No.- | PERIODO DE ESTIMACION DE | IMPORTE ESTIMACION | AMORTIZ ANTIC.SIN IVA | SUBTOTAL | I.V.A. | TOTAL | R E T E N C I O N E S | | SALDO A PAGAR |
|----------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------|-------------------|
| | | | | | | | OTROS | TOTAL-RET | |
| 1 | 03-jun-22 17-jun-22 | 198,722.03 | | 198,722.03 | 31,795.52 | 230,517.55 | | | 230,517.55 |
| TOTALES | | 198,722.03 | - | 198,722.03 | 31,795.52 | 230,517.55 | - | - | 230,517.55 |

SALDO CONTRATADO IVA INC.: - 0.00

Reyes C

SALDO POR AMORTIZAR IVA INC.: -

[Signature]

ING. RODOLFO CARDENAS VILLA
CONTRATISTA

[Signature]

ARC. MARIO GUTIERREZ MENDOZA
SUPERVISOR UAAAN



Boulevard Periférico Luis Echeverría 1342-6
Col. Avícola, C.P. 25294, Saltillo, Coahuila
Teléfono (844) 4-30-33-11

EXPERIENCIA A TU SERVICIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

FECHA: 23/06/2022

| | |
|------------------|---|
| DATOS GENERALES: | |
| OBRA | "TRABAJOS PARA PISO DE CONCRETO EN EXTERIOR DE TALLERES DE IDIOMAS" |
| UBICACIÓN | UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO |
| | PERIODO ESTIM. DEL |
| | 03/06/2022 |
| | AL |
| | 17/06/2022 |
| | ESTIM. No. |
| | 1 |

| CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | UNIDAD | VOLUMEN | P.U. | IMPORTE |
|--|--|--------|----------|--------------|---------------|
| "TRABAJOS PARA PISO DE CONCRETO EN EXTERIOR DE TALLERES DE IDIOMAS" | | | | | |
| PRELIMINARES Y ALBAÑILERIA | | | | | |
| 1.01 | DEMOLICIÓN DE PISO Y/O FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 12 CM. DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: ACARREOS DEL MATERIAL NO | M2 | 110.79 | \$ 87.94 | \$ 9,742.87 |
| 1.02 | PISO DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 RESISTENCIA | M2 | 222.01 | \$ 377.80 | \$ 83,875.38 |
| 1.03 | RELLENO CON MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA (BAILARINA), AGUA, EN CAPAS DE | M3 | 17.48 | \$ 238.75 | \$ 4,173.35 |
| 1.04 | RETIRO DE TOCÓN Y RAICES DE ARBOL, (DIMENSIONES VER EN OBRA); INCLUYE: ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA | PZA | 2.00 | \$ 10,346.28 | \$ 20,692.56 |
| 1.05 | LIMPIEZA DE PISO DE MOSAICO DE PASTA, CERAMICA ETC. CON CEPILLO AGUA, Y DETERGENTE EN POLVO Y AGUA HASTA LA | M2 | 213.30 | \$ 38.63 | \$ 8,239.78 |
| 1.06 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE LADRILLO Y/O BLOCK DE CONCRETO, INCLUYE: DEMOLICIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, | M2 | 34.34 | \$ 194.67 | \$ 6,684.97 |
| 1.07 | DES-MONTAJE DE FALSO PLAFÓN HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS. INCLUYE: DES-MONTAJE, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, | M2 | 60.00 | \$ 143.72 | \$ 8,623.20 |
| 1.08 | FORJADO DE CANALÓN PLUVIAL DE DIMENSIONES APROXIMADAS 25X25X30CM. REHUBICACIÓN DE REJILLA METALICA EXISTENTE, | ML | 26.00 | \$ 367.43 | \$ 9,563.18 |
| 1.09 | APLANADO EN MUROS, MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 A PLOMO ACABADO FINO A LLANA O FLOTA; 2 CMS. PROMEDIO DE | M2 | 162.35 | \$ 187.64 | \$ 30,463.35 |
| 1.10 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR VINILICA MARCA BEREL DE LINEA, DOS MANOS DEL COLOR A | M2 | 179.85 | \$ 66.73 | \$ 12,001.39 |
| 1.11 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE-EN-VENTANAS EXISTENTES PARA INTERIOR Y EXTERIOR MARCA BEREL DE LINEA, | M2 | 56.01248 | \$ 83.41 | \$ 4,672.00 |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 198,722.03 |
| 16% DE IVA | | | | | \$ 31,795.53 |
| TOTAL A ESTIMAR | | | | | \$ 230,517.56 |

ING. RODOLFO CARDENAS VILLA

ARC. MARIO GUTIERREZ MENDOZA



REA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.

Boulevard Periférico Luis Echeverría 1342-6
Col. Avícola, C.P. 25294, Saltillo, Coahuila
Teléfono (844) 4-30-33-11

CONTRATO No 037/22 AD. MITTO.

EXPERIENCIA A TU SERVICIO

OBRA "TRABAJOS PARA PISO DE CONCRETO EN EXTERIOR DE TALLERES DE IDIOMAS"

FECHA 23 de Jun de 2022

PERIODO 03 Jun 2022 al 17 Jun 2022

NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS A LOS QUE CORRESPONDA INCLUYE: SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, APLICACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRAZO, HERRAJES, CORTES, FLETES, ACARREROS, RETIRO DE ESCOMBRÓ A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA, VELADOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

UBICACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO MARRO

ESTIMACION No 1



[Handwritten signature]

CONTRATISTA

ING. RODOLFO CARDENAS VILLA

SUPERVISOR

ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA

[Handwritten signature]



REA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.

Boulevard Periférico Luis Echeverría 1342-6
Col. Avícola, C.P. 25294, Saltillo, Coahuila
Teléfono (844) 4-30-33-11

CONTRATO No 037/22 AD. MITTO.

EXPERIENCIA A TU SERVICIO
"TRABAJOS PARA PISO DE CONCRETO EN EXTERIOR DE TALLERES DE IDIOMAS"

OBRA

FECHA 23 de Jun de 2022

PERIODO

03 Jun 2022 al 17 Jun 2022

NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS A LOS QUE CORRESPONDA INCLUIVE: SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, APLICACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRAZO, HERRAJES, CORTES, FLETES, ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA, VELADOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

UBICACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

ESTIMACION No 1



CONTRATISTA

ING. RODOLFO CARDENAS VILLA

SUPERVISOR

ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA



REA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.

Boulevard Periférico Luis Echeverría 1342-6
Col. Avícola, C.P. 25294, Saltillo, Coahuila
Teléfono (844) 4-30-33-11

CONTRATO No 037/22 AD. MITTO.

EXPERIENCIA A TU SERVICIO

OBRA "TRABAJOS PARA PISO DE CONCRETO EN EXTERIOR DE TALLERES DE IDIOMAS"

FECHA 23 de Jun de 2022


PERIODO 03 Jun 2022 al 17 Jun 2022

NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS A LOS QUE CORRESPONDA INCLUIE: SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, APLICACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRAZO, HERRAJES, CORTES, FLETES, ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA, VELADOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

UBICACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

ESTIMACION No 1

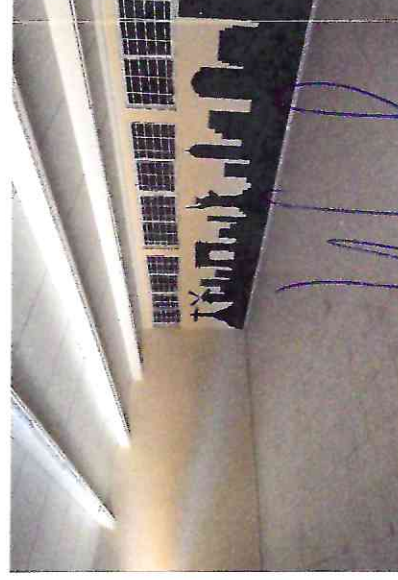

CONTRATISTA

ING. RODOLFO CARDENAS VILLA

SUPERVISOR

ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA



REA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.

Boulevard Periférico Luis Echeverría 1342-6
Col. Avícola, C.P. 25294, Saltillo, Coahuila
Teléfono (844) 4-30-33-11

CONTRATO No 037/22 AD. MITO. **EXPERIENCIA A TU SERVICIO**
"TRABAJOS PARA PISO DE CONCRETO EN EXTERIOR DE TALLERES DE IDIOMAS"


OBRA 23 de Jun de 2022

PERIODO 03 Jun 2022 al 17 Jun 2022

NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS A LOS QUE CORRESPONDA INCLUYE: SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, APLICACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRAZO, HERRALES, CORTES, FLETES, AGARREROS, RETIRO DE ESCOMBRIO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA, VELADOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

LUBICACIÓN UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

ESTIMACION No 1

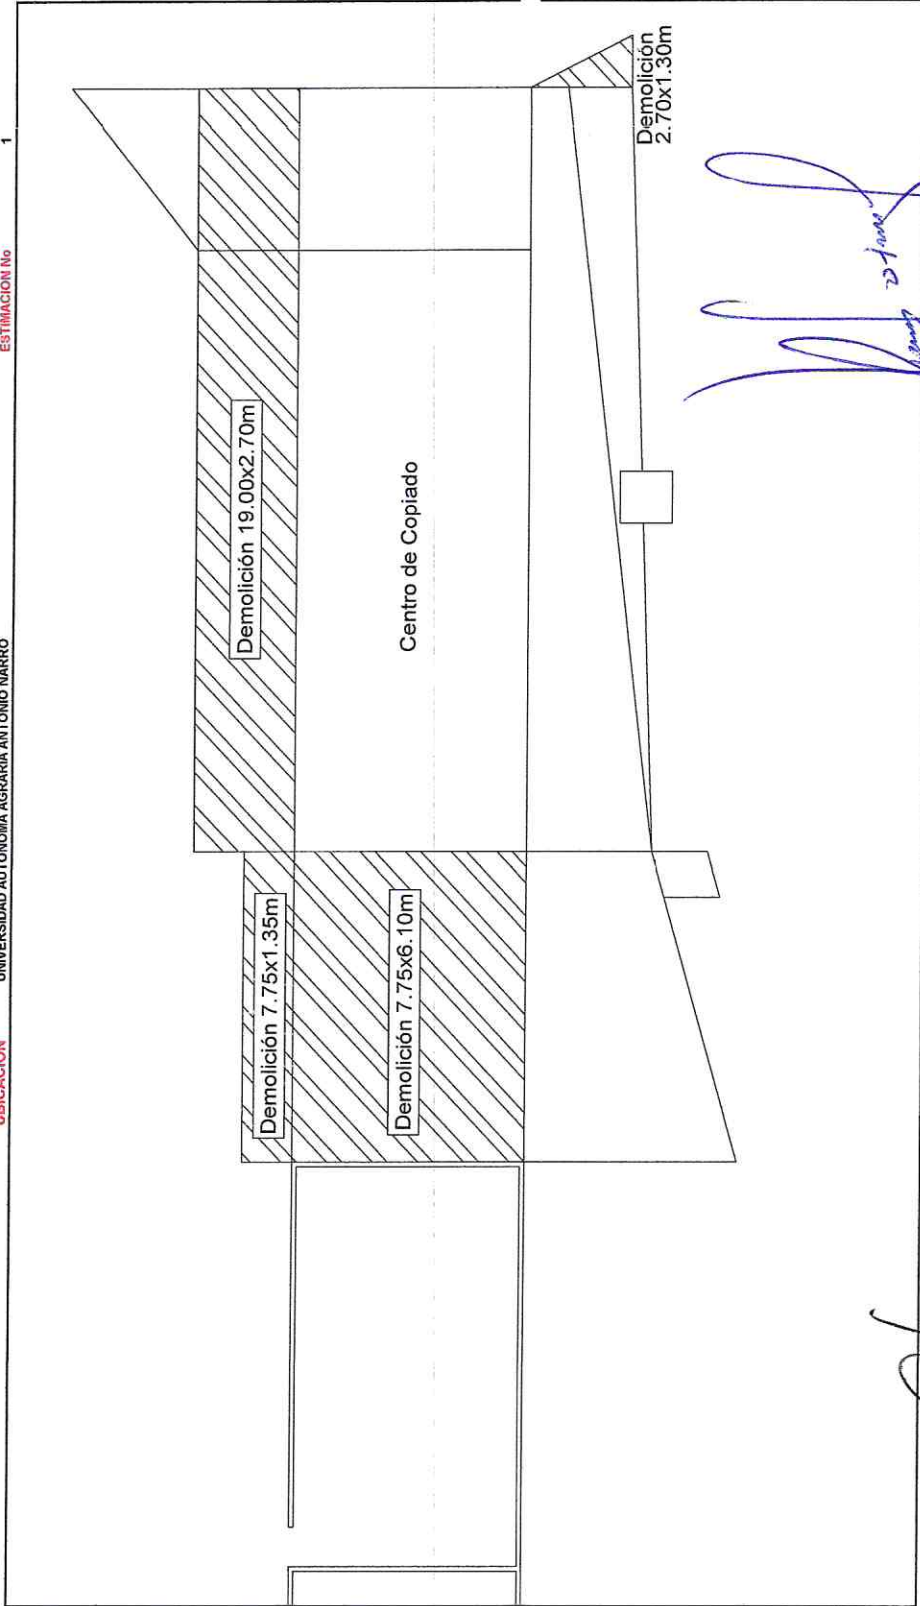

[Handwritten signature]

CONTRATISTA

ING. RODOLFO CARDENAS VILLA

[Handwritten signature]
SUPERVISOR

ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA



REA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.

Boulevard Periférico Luis Echeverría 1342-6
Col. Avícola, C.P. 25294, Saltillo, Coahuila
Teléfono (844) 4-30-33-11

CONTRATO No 037/22 AD. MTT0.

OBRA

"TRABAJOS PARA PISO DE CONCRETO EN EXTERIOR DE TALLERES DE IDIOMAS"

EXPERIENCIA A TU SERVICIO

FECHA 23 de Jun de 2022

PERIODO 03 Jun 2022 al 17 Jun 2022

2022


NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS A LOS QUE CORRESPONDA INCLUIRE: SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, APLICACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRAZO, HERRAJES, CORTES, FILETES, ACARRIROS, RETIRO DE ESCOMBRO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA, VELADOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

UBICACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

ESTIMACION No

1

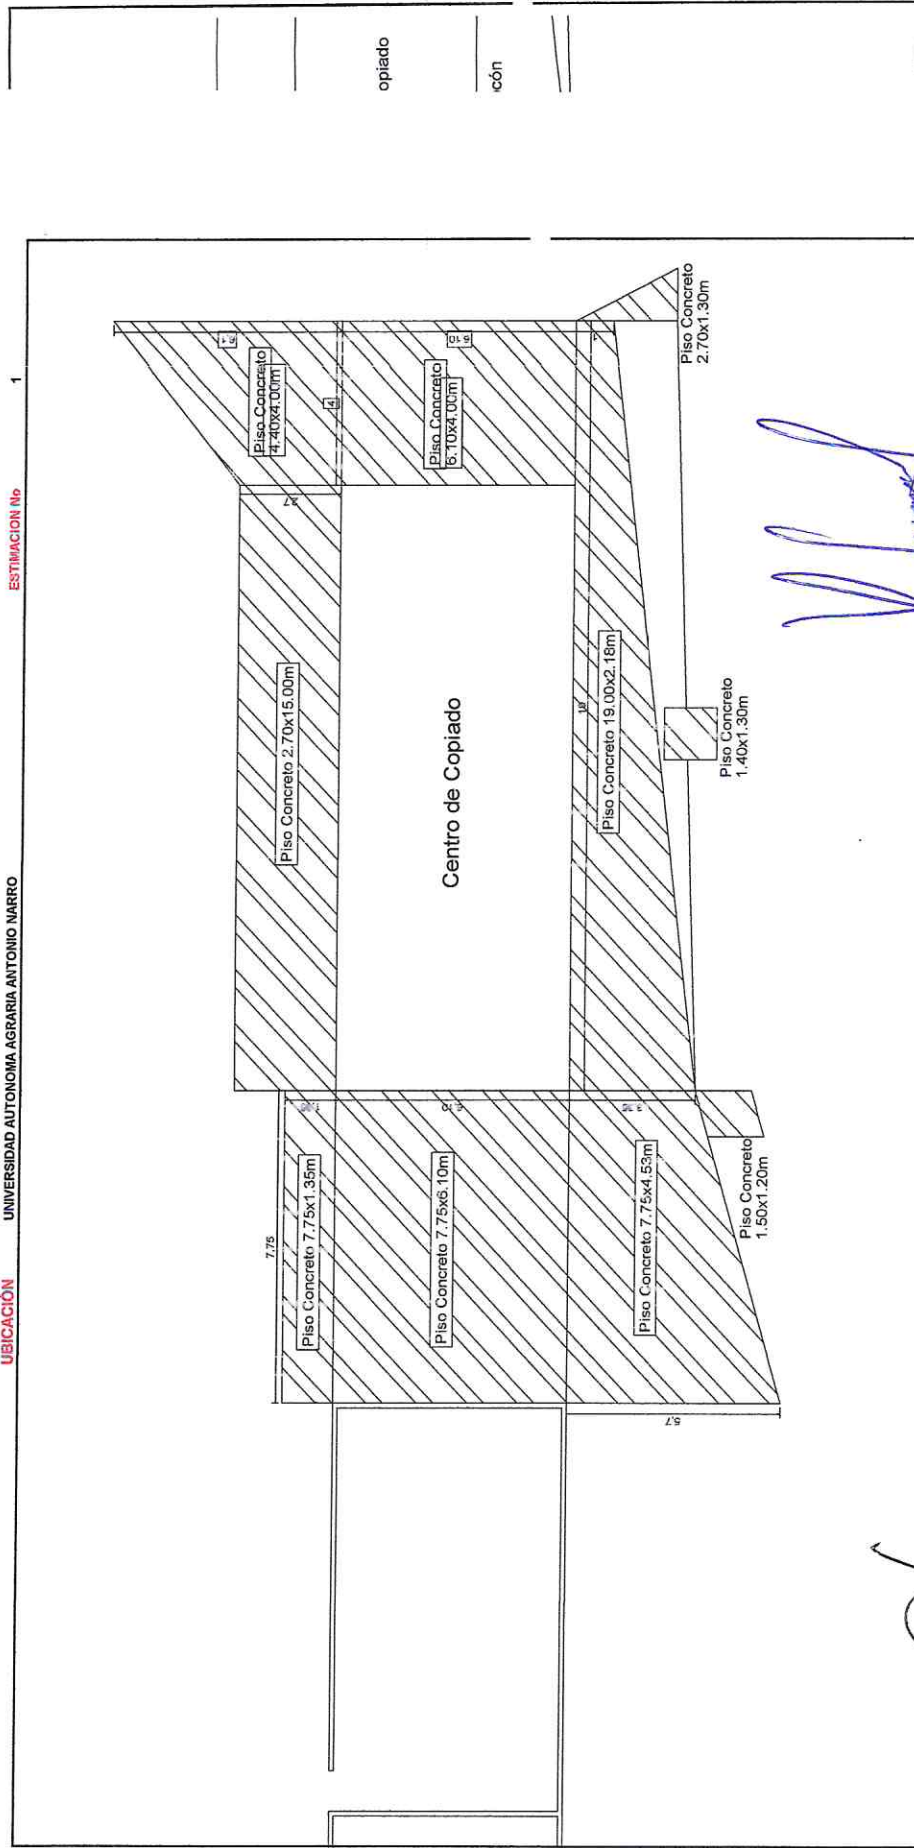

opiado

cón

R

CONTRATISTA

ING. RODOLFO CARDENAS VILLA

SUPERVISOR

ARO. MARIO GUTIERREZ MENDOZA



REA INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.

Boulevard Periférico Luis Echeverría 1342-6
Col. Avícola, C.P. 25294, Saltillo, Coahuila
Teléfono (844) 4-30-33-11


CONTRATO No 037/22 AD. MTT0. **EXPERIENCIA A TU SERVICIO**
OBRA "TRABAJOS PARA PISO DE CONCRETO EN EXTERIOR DE TALLERES DE IDIOMAS"

FECHA 23 de Jun de 2022
PERIODO 03 Jun 2022 al 17 Jun 2022

NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS A LOS QUE CORRESPONDA INCLUIR: SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, APLICACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRAZO, HERRAJES, CORTES, FLETES, ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA, VELADOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

UBICACIÓN UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

ESTIMACION No 1

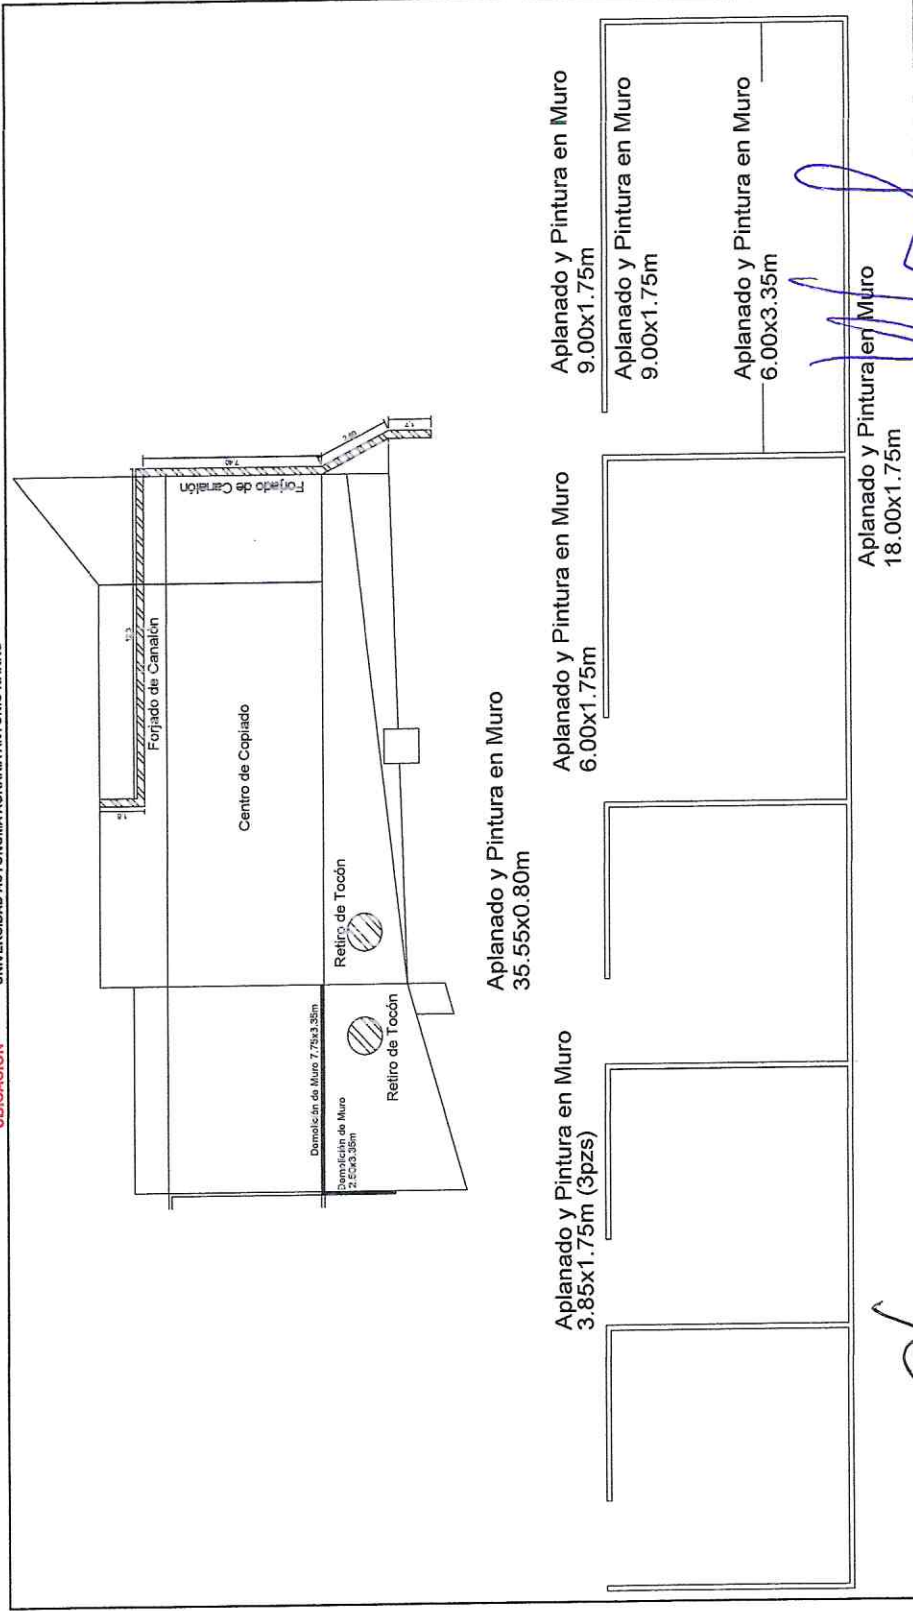

CONTRATISTA

ING. RODOLFO CARDENAS VILLA

SUPERVISOR

ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA

Fecha:


No.

Viernes 03 de Junio de 2022.

Con fecha del día Viernes 03 de Junio de 2022 se da Apertura a la Presente Bitácora de Obra correspondiente a los Trabajos para Piso de Concreto en Exteriores de Talleres de Talleres" con Número de Contrato: 037/22 AD, MITO, con Ubicación en el interior de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narsa.

Como parte de la Supervisión de Obra de la "Universidad Autónoma Agraria Antonio Narsa" estará a cargo el Arq. Mario Gutiérrez Mendoza.


Por parte de la Empresa Constructora "REA Ingeniería y Construcciones SA de CV" estará a cargo el Ing. Julio César Reyna Mancada.



Arq. Mario Gutiérrez Mendoza



Ing. Julio César Reyna Mancada



Fecha:

No.

Viernes 03 de Junio de 2022

Se da inicio a los trabajos de demolición de piso de concreto existente realizando cortes con disco y al posterior retiro de escombros hacia Fuera de la Universidad.

Se trabaja en la excavación en el perímetro de árboles para el retiro de raíces y tocónes.

Se realiza el suministro de materiales para el colado de piso de concreto.

Lunes 06 de Junio de 2022.

Se continúan los trabajos de demolición de piso de concreto, relleno con material producido de banco y retiro de escombros hacia Fuera de la Universidad.

Se trabaja en el retiro de raíces y tocónes de árboles.

Se trabaja en el retiro de falsa plafón existente en Aula y retiro de escombros hacia Fuera de la Universidad.

Fecha:

No.

Miércoles 08 de Junio de 2022.

Se trabajó en el sellado y compactación con material producido la Banca para la posterior colocación de malla alacristalada y colado de piso de concreto.

Se trabajó en la demolición de muros de labilla y retiro de escombros hacia Fuera de la Universidad.

Se terminan los trabajos de retiro de raices y troncos de árboles, se realiza el retiro de desechos hacia Fuera de la Universidad.





Viernes 10 de Junio de 2022.

Se trabajó en el colado de piso de concreto y la preparación para el forjado de canalón pluvial realizando a su vez la modificación de rejilla metálica.

Se inician los trabajos de aplomado de muros con pasta gruesa y fina a base de arena y cemento en exterior de aulas.

Se trabajó en la limpieza de puertas, portones y ventanas para la posterior aplicación de pintura.



Fecha:

No.

Lunes 13 de Junio de 2022.

Se continúan los trabajos de colado de piso de concreto y forjado de canchales plumb para la posterior colocación de rejilla metálica.

Se continúan los trabajos de aplanados de pasta en muros por cara exterior de Aulas.

Se trabaja en la aplicación de pintura guita en muros y la aplicación de pintura emaltada en portones y ventanas de barranca.


A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' shape with a horizontal bar, and a circular stamp to its right containing illegible text.

Miércoles 15 de Junio de 2022.

Se continúan los trabajos de colado de piso de concreto y forjado de canchales plumb así como la modificación y colocación de rejilla metálica.

Se terminan los trabajos de aplanados de pasta en muros y se continúan los trabajos de aplicación de pintura.

Se trabaja en la limpieza de piso de concreto y muros en interior de Aulas.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' shape with a horizontal bar, and a circular stamp to its right containing illegible text.

Fecha:

No.

Viernes 17 de Junio de 2022.

Se terminan los trabajos de colado de piso de concreto y aplicación de pintura.

Se trabaja en la limpieza de obra y retiro de escombros.

Con fecha del día Viernes 17 de Junio de 2022 se han por terminados los trabajos correspondientes al Contrato: 0351/22 AD MITA.

"Trabajos para Piso de Concreto en Exterior de Talleres de Idiomati".



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|---|
| NUMERO CONTRATO | 037/22/AD/MTTO. | FECHA INICIO PROGRAMADA | 03/06/2022 |
| NUMERO CONVENIO | | FECHA TERMINO PROGRAMADA | 17/06/2022 |
| DESCRIPCION | TRABAJOS PARA PISO DE CONCRETO EN EXTERIOR DE TALLERES DE IDIOMAS. | | |
| CONTRATISTA | ING. RODOLFO CARDENAS VILLA | | |
| MONTO DEL CONTRATO | \$230,517.55 | FECHA INICIO REAL | |
| MONTO DEL CONVENIO | | FECHA TERMINO REAL | |
| ESTIMACIONES: | | | |
| ESTIMACIONES | IMPORTE | DIF. A FAVOR UAAAN | TOTAL DE LA OBRA. |
| | \$230,517.55 | | \$230,517.55 |
| | | | DEL 03 AL 17 DE JUNIO DEL 2022 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SUMATORIA | \$230,517.55 | | \$230,517.55 |
| EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO. | | | |
| OBSERVACIONES | | | |
| FIRMA DEL USUARIO: | | | |
| SUPERVISOR | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO | SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES | CONTRATISTA |
| | | | |
| ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA | ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA. | ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ | REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ING. RODOLFO CARDENAS VILLA |



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra

| | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------------------|
| NUMERO CONTRATO | 037/22/AD/MITTO. | FECHA INICIO PROGRAMADA | 03/06/2022 |
| NUMERO CONVENIO | | FECHA TERMINO PROGRAMADA | 17/06/2022 |
| DESCRIPCION | TRABAJOS PARA PISO DE CONCRETO EN EXTERIOR DE TALLERES DE IDIOMAS. | FECHA INICIO REAL | |
| CONTRATISTA | ING. RODOLFO CARDENAS VILLA | FECHA TERMINO REAL | |
| MONTO DEL CONTRATO | \$230,517.55 | FECHA DEL CONVENIO | |
| MONTO DEL CONVENIO | | | |
| ESTIMACIONES: | | | |
| ESTIMACIONES | IMPORTE | DIF. A FAVOR UAAAA | TOTAL DE LA OBRA. |
| | \$230,517.55 | | DEL 03 AL 17 DE JUNIO DEL 2022 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SUMATORIA | \$230,517.55 | | \$230,517.55 |

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

OBSERVACIONES

FIRMA DEL USUARIO:

SUPERVISOR

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

 ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA.

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

 ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ

CONTRATISTA

 REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ING. RODOLFO CARDENAS VILLA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO


Datos Generales de la Obra

| | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------------------|
| NUMERO CONTRATO | 037122/AD/MITTO. | FECHA INICIO PROGRAMADA | 03/06/2022 |
| NUMERO CONVENIO | | FECHA TERMINO PROGRAMADA | 17/06/2022 |
| DESCRIPCION | TRABAJOS PARA PISO DE CONCRETO EN EXTERIOR DE TALLERES DE IDIOMAS. | | |
| CONTRATISTA | ING. RODOLFO CARDENAS VILLA | | |
| MONTO DEL CONTRATO | \$230,517.55 | FECHA INICIO REAL | |
| MONTO DEL CONVENIO | | FECHA TERMINO REAL | |
| ESTIMACIONES: | | | |
| ESTIMACIONES | IMPORTE | DIF. A FAVOR UAAAN | TOTAL DE LA OBRA. |
| | \$230,517.55 | | \$230,517.55 |
| | | | DEL 03 AL 17 DE JUNIO DEL 2022 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SUMATORIA | \$230,517.55 | | \$230,517.55 |


EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

OBSERVACIONES


FIRMA DEL USUARIO:

SUPERVISOR

 ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO


 ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA.

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES


 ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ

CONTRATISTA


 REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES,
 S.A. DE C.V. ING. RODOLFO CARDENAS VILLA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra

| | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------------------|
| NUMERO CONTRATO | 037122/AD/IMITO. | FECHA INICIO PROGRAMADA | 03/06/2022 |
| NUMERO CONVENIO | | FECHA TERMINO PROGRAMADA | 17/06/2022 |
| DESCRIPCION | TRABAJOS PARA PISO DE CONCRETO EN EXTERIOR DE TALLERES DE IDIOMAS. | | |
| CONTRATISTA | ING. RODOLFO CARDENAS VILLA | | |
| MONTO DEL CONTRATO | \$230,517.55 | FECHA INICIO REAL | |
| MONTO DEL CONVENIO | | FECHA TERMINO REAL | |
| ESTIMACIONES: | | | |
| ESTIMACIONES | IMPORTE | DIF. A FAVOR UAAAA | TOTAL DE LA OBRA. |
| | \$230,517.55 | | \$230,517.55 |
| | | | DEL 03 AL 17 DE JUNIO DEL 2022 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SUMATORIA | \$230,517.55 | | \$230,517.55 |

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

OBSERVACIONES

FIRMA DEL USUARIO:

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| SUPERVISOR | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO | SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES | CONTRATISTA |
| | | | |
| ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA | ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA. | ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ | REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ING. RODOLFO CARDENAS VILLA |

