



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Anticipos y Pagos - 2022  
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-04-00300**

Elab :2022-04-08

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia DEP: CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO - FACTURA NO. B58A1 REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS-DORMITORIOS-MODULO 01 CONTRATO NO. 007/22 AD.MTTO. MONTO TOTAL \$ 383,820.80 (FINIQUITO)

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	1539	PAG	1063	CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO	\$ 230,292.48	
5135-1000	PAR	3510100	PAG	1063	FACTURA NO. B58A1/SOL.MTTO. 485-G REMOD. Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS-DORM. MODULO 01	\$ 230,292.48	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 1063 DEP) CLAUDIA VERÓNICA DUR - FACTURA NO. B58A1 REMODELACIÓN		\$ 230,292.48
2112-1000	PRV	1539	PAG	1063	FACTURA NO. B58A1/SOL.MTTO. 485-G REMOD. Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS-DORM. MODULO 01		\$ 230,292.48
<b>TOTALES POLIZA</b>						\$ 460,584.96	\$ 460,584.96

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B.04-300  
1380



**Pagos SPEI enviados**

Fecha: 08/04/2022

Hora: 08:51:17

Página: 1

Fecha valor 08/04/2022 Clave de Rastreo: HSBC378153  
Fecha de liquidación: 08/04/2022 Hora de liquidación: 15:48:13 MX

**DETALLES DEL CARGO**

Cuenta Ordenante: 4001749597  
Nombre del Ordenante: A UAAAN  
Referencia del ordenante: F 383 GLOMARSA  
Comisión cobrada: 0.00  
Moneda: MXN  
Monto: 230,292.62


**DETALLES DEL ABONO**

Cuenta del Beneficiario: 058078160677600388 Referencia Numérica: 1022  
Nombre del Beneficiario: SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GLOMARSA  
Banco Receptor: BANREGIO  
Concepto de Pago: F 383 GLOMARSA



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Anticipos y Pagos - 2022  
PAGO DIRECTO  
FORMATO: F-7.14-1

Imprimir



**DOCUMENTO No. 1063**                      **PAGO DIRECTO**

**Entidad Federativa :**                      **5 - COAHUILA DE ZARAGOZA**

**Región :**    **5 -**

**Municipio :**    **30 - SALTILLO**

**Finalidad :**    **25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR**

**Unidad Responsable :**    **410302011 -**

**Sub Programa :**    **4132 - Mantenimiento y Remodelación de los Internados**

**Solicitante**    **549-BURCIAGA VERA GUSTAVO ALFONSO**

**Concepto**    **FACTURA NO. B58A1 REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS-DORMITORIOS-MODULO 01 CONTRATO NO. 007/22 AD.MTTO. MONTO TOTAL \$ 383,820.80 (FINIQUITO)**

**BENEFICIARIO**    **1539 - CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO**

**Cuenta Bancaria**

Liberado :  
Autorizado :



Part.	Descripción de la Partida	Importe
3510100	FACTURA NO. B58A1/SOL.MTTO. 485-G REMOD. Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS-DORM. MODULO 01	\$ 230,292.48
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 230,292.48



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

RFC emisor: DUAC790607IK3  
 Nombre emisor: CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO  
 RFC receptor: UAA750303NHA  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI O NARRO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1E4D6-35ED-44FF-AAB8-3F2A457B58A1  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 25000 2022-04-05 23:15:48  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72102900	NA	1	E48	SERVICIO	198528.00	198528.00				
Descripción	FINIQUITO DEL DEL 60 % DE LOS TRABAJOS APROBADOS DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS-DORMITORIO-MODULO 01 de la UAAAN contrato 007/22 AD MITO PROVEEDOR 1536 SOLICITUD 485-G				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	198528.00	Tasa	16.0000%	31764.48

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 198,528.00  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 31,764.48  
 Total \$ 230,292.48

**Sello digital del CFDI:**

aRGIPQJJ80iOvZ8US4B+PfofZezTkhnlLA67JagcnMAeILP3sProxj3ohCXaIkMUzPQSVAZz/k8TIVVU9r1jNp/7Zxl/Uml4ken3EJpcNj3pTu/x+R3pq/PGYroR2cdrEsPOgoFEdrfX/1CFLxmfq+ZvqQh0sp2hbFBb5lxHSll0Wj6NLRdZdOb0Xnjeib/ZUGCRvdjswk4bh04agKGCfThWcg9wHueEXdUtrvnV2CD/RQuUxpWrcQD+Wp3gFkzOisANFla3WwIYVUHWp+uge2yrf728BXXgjeKNqa01HY2GIRRZ2DXwEEid4mEjvVtpYk8e9Q7HDfphcfjof5g==

**Sello digital del SAT:**

gAOuw4q+ZZ70uDQoUzDoI4TU+F+e6WH8GPhiKu8a/hkZweviXaVdk7BKjFcZ8Rkb67hf3Z5jraPv9xby6BpFKVKQ5eq2bW0WIMuNwCKNfG5HcddZZsYi0+NCmkTKG5yOtkPyYOrgJ92UbLxaaobxZiDoQwHeDA+HPILbIC+jgX+9+pOYZUIEHKGVJ+8xMancOolz9625UDovzmm1ll0JvJXJF+qOBM8pPOCF+vUBFDZm9OMUq0mcG7e+TBNr67v49pFAHTZMUxJeMN+14cFHslBVJMvHEFdMW1fnEHJ7HUQyF4KP/xyZARRvZ+LhXctG8ZHjq034jpnjrw+wlkw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA1E4D6-35ED-44FF-AAB8-3F2A457B58A1|2022-04-05T23:18:50|SAT970701NN3|aRGIPQJJ80iOvZ8US4B+PfofZezTkhnlLA67JagcnMAeILP3sProxj3ohCXaIkMUzPQSVAZz/k8TIVVU9r1jNp/7Zxl/Uml4ken3EJpcNj3pTu/x+R3pq/PGYroR2cdrEsPOgoFEdrfX/1CFLxmfq+ZvqQh0sp2hbFBb5lxHSll0Wj6NLRdZdOb0Xnjeib/ZUGCRvdjswk4bh04agKGCfThWcg9wHueEXdUtrvnV2CD/RQuUxpWrcQD+Wp3gFkzOisANFla3WwIYVUHWp+uge2yrf728BXXgjeKNqa01HY2GIRRZ2DXwEEid4mEjvVtpYk8e9Q7HDfphcfjof5g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-04-05 23:18:50  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



*[Handwritten signatures in blue ink]*

RFC emisor:	DUAC790607IK3	Folio fiscal:	AAA1E4D6-35ED-44FF-AAB9-3F2A457B58A1
Nombre emisor:	CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO	No. de serie del CSD:	00001000000504465028
RFC receptor:	UAA750303NHA	Código postal, fecha y hora de emisión:	25000 2022-04-05 23:15:48
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI O NARRO	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72102400	NA	1	E48	SERVICIO	198528.00	198528.00				
<b>Descripción</b>	FINIQUITO DEL DEL 60 % DE LOS TRABAJOS APROBADOS DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS-DORMITORIO-MODULO 01 de la UAAAN contrato 007/22 AD MTTO PROVEEDOR 1536 SOLICITUD 485-G				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	198528.00	Tasa	16.0000%	31764.48

<b>Moneda:</b>	Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>	\$ 198,528.00
<b>Forma de pago:</b>	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	<b>Impuestos Traslados</b>	IVA 16.0000% \$ 31,764.48
<b>Método de pago:</b>	Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>	\$ 230,292.48

**Sello digital del CFDI:**

aRGIPQJ.180iOvZ8U94B+PfcfZezTkhnLA67JagcnMAeILP3sProxj3ohCXatkMUzPQsvAZz/k8TIVVU9r1jNp/7Zxl/Uml4ken3EJpcNj3pTu/x+R3pq/PGYroR2cdrEsPOgoFEdrfX/1CFLxmfq+ZvqQh0sp2hbFBb5lxHSiloVMj6NLRdZdOb0Xnjeib/ZUGCRvdjswk4bh04agKgcFThWcg8wHueEXdUtrvnV2CD/RQuUxpWrcQD+Wp3gFkzOisANFla3WwIYVUHHWp+uge2yrf728BXXgjeKNqa01HY2GIRRZ2DXwEEid4mEjvVtpYk8e9Q7HDfphcfjof5g==

**Sello digital del SAT:**

gAOuw4q+ZZ70uDQoUzDoI4TU+F+e6WfH8GPhiKu6a/hkZwsviXaVdk7BKjFcZ8Rmb67hf3Z5jraPv9xby6BpFKVKQ5eq2bW0WIMuNwCKNfG5HcddZZsYi0+NCmkTKG5vOtkPyYOrgJ92UjB LxaaasobZiDoQwHeDA+PiLbIC+jgX+9+pOYUIEHKGvJ+8xManoOotz9625UDovzmm1lI0JvJXJF+qOBM8pPOCf+vUbFDZm9OMUq0mcG7e+TBNr67v49pFAHTZMUxJeMN+14cFHsIBVjM vHEFdMW1fnEHj7HUQyF4KP/xvZARRvZ+LhXctG8ZHjq034jpnjrw+wlkw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA1E4D6-35ED-44FF-AAB9-3F2A457B58A1|2022-04-05T23:18:50|SAT970701NN3|aRGIPQJ.180iOvZ8U94B+PfcfZezTkhnLA67JagcnMAeILP3sProxj3ohCXatkMUzPQsvAZz/k8TIVVU9r1jNp/7Zxl/Uml4ken3EJpcNj3pTu/x+R3pq/PGYroR2cdrEsPOgoFEdrfX/1CFLxmfq+ZvqQh0sp2hbFBb5lxHSiloVMj6NLRdZdOb0Xnjeib/ZUGCRvdjswk4bh04agKgcFThWcg8wHueEXdUtrvnV2CD/RQuUxpWrcQD+Wp3gFkzOisANFla3WwIYVUHHWp+uge2yrf728BXXgjeKNqa01HY2GIRRZ2DXwEEid4mEjvVtpYk8e9Q7HDfphcfjof5g=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2022-04-05 23:18:50  
 No. de serie del certificado SAT      00001000000504465028



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro*

**Comité de Obras y Servicios Relacionados  
con las mismas**

Calzada Antonio Narro 1923, Colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315  
Conmutador (844) 4110200 ext. 2014. Tel.dir (844) 411 02 08  
e-mail: administrativa@uaaan.edu.mx - Página Web: www.uaaan.edu.mx



Saltillo, Coah. A 04 de marzo de 2022

**CONSTANCIA**

La Dirección General Administrativa de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro hace constar que:

El proveedor CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO, en cumplimiento al contrato 007/22 AD. MTTO. REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS-DORMITORIO-MODULO 01., y con fundamento en el Artículo 48 de la Ley de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas, entrega a esta Universidad, a fin de garantizar el anticipo, el cumplimiento y vicios ocultos de las obligaciones contraídas en el referido contrato lo siguiente:

Cheque emitido por la Institución Bancaria BBVA BANCOMER, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero.

Derivado de la cuenta: 00473551407

Cheque Número: 000051

Cantidad: \$153,528.32 (ciento cincuenta y tres mil quinientos veinte ocho pesos 32/100 M.N.) por el 40% de garantía de Anticipo

Cheque Número: 000052

Cantidad: \$33,088.00 (treinta y tres mil ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) por el 10% de garantía de cumplimiento

Cheque Número: 000053


Cantidad: \$33,088.00 (treinta y tres mil ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) por el 10% de garantía de vicios ocultos

Sucursal: 0297, Saltillo, Coah. Lourdes

Titular de la cuenta: CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO

Quedarán bajo resguardo de esta Dirección y a su vez serán liberados cuando haya concluido el servicio del objeto del contrato de forma satisfactoria para la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

**ATENTAMENTE**  
**ALMA TERRA MATER**

  
M.C. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ  
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO  
Y PRESIDENTE DEL COYSRM

Ccp. Archivo

# BBVA

32137688

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 4/Marzo/22

Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro \$ 153,528.32

Ciento cincuenta y tres mil quinientos veinty ocho 32/100 Moneda Nacional

**CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO**  
OFICINA : 0941 PLAZA MIRASIERRA SALTILLO  
No DE CUENTA: 00479009787  
SALTILLO, COAH.

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.

Firma (s)

4 30 11 5 10 780 1 75 00 4 79009 78 7 000000 5 1

CUENTA No. CHEQUE No.

# BBVA

80061292

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 4/Marzo/22

Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro \$ 33,088.00

treinta y tres mil ochenta y ocho 00/100 Moneda Nacional

**CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO**  
OFICINA : 0941 PLAZA MIRASIERRA SALTILLO  
No DE CUENTA: 00479009787  
SALTILLO, COAH.

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.

Firma (s)

5 5 1 5 1 0 780 1 75 00 4 79009 78 7 000000 5 2

CUENTA No. CHEQUE No.

# BBVA

45418963

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 4/Marzo/22

Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro \$ 33,088.00

treinta y tres mil ochenta y ocho 00/100 Moneda Nacional

**CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO**  
OFICINA : 0941 PLAZA MIRASIERRA SALTILLO  
No DE CUENTA: 00479009787  
SALTILLO, COAH.

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.

Firma (s)

9 1 68 1 5 1 0 780 1 75 00 4 79009 78 7 000000 5 3

CUENTA No. CHEQUE No.



Saltillo Coahuila a 28 de Febrero del 2022

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

A QUIEN CORRESPONDA

A través de este medio se informa que el día 28 de febrero del 2022 se da inicio los trabajos aprobados de REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS-DORMITORIO-MODULO 01 de la UAAAN contrato 007/22 AD MTTO.

Sin más por el momento quedo de usted.

Atte.

Claudia Verónica Duran Arellano

Soluciones integrales



[Leonardo Moreno, cel:844174 70 18, E-mail mse.salttillo@gmail.com]

**Gracias por hacer negocios con nosotros!**





**SOLUCIONES  
INTEGRALES**  
MULTISERVICIOS

# COTIZACIÓN

[Ramon Corona 1229]

[Saltillo Coahuila]

Teléfono: [844 174 70 18]

Asesor de venta: [Leonardo Moreno]

PROVEEDOR # 1539

FECHA

25/02/2022

## CLIENTE

[Ing. GUSTAVO BURCIAGA VERA]

JEFE DE MANTENIMIENTO

[UAAAN] UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Saltillo Coahuila

SOLICITUD REMODELACION DE BAÑOS DE MODULO 01

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
DEMOLICION DE VITROMURO	72,00	\$80,00	5760,00
DEMOLICION DE VITROPISO	20,00	\$80,00	1600,00
RETIRO DE LINEAS HIDRAULICAS EXISTENTES DE COBRE, RETIRO DE SANITARIO Y DE LAVABO.	88,00	\$150,00	13200,00
RETIRO DE APARATO SANITARIO Y DE LAVABO	8,00	\$200,00	1600,00
MAMPARA DE ALUMINIO CON ACRILICO EN DIVISION DE REGADERA.	8,00	\$5.000,00	40000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUELETOS CON TUBOPLUS DE 1/2 PULG., MEZCADORA RUGO Y CEBOLLETA ELVEX	4,00	\$3.500,00	14000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOPLUS DE 1/2PULG. PARA AGUA FRIA Y CALIENTE PARA LAVABO.	120,00	\$400,00	48000,00
COLOCACION DE VITROMURO DE 33X33 CMS. DE PRIMERA COLOR CLARO.	96,00	\$480,00	46080,00
COLOCACION Y SUMINISTRO DE VITROPISO ANTIDERRAPANTE EN BAÑO.	24,00	\$480,00	11520,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS COMPLETO, MARCA CATO, VITROMEX	4,00	\$3.500,00	14000,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO Y PEDESTAL COMPLETO, MARCA CATO VITROMEX.	4,00	\$3.500,00	14000,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGUITORIO COMPLETO.	4,00	\$4.200,00	16800,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y PUERTA MULTIPANEL	4,00	\$4.800,00	19200,00
RESANES Y RESTIRAMIENTO EN AREA DE RERGADERAS Y APLICACIÓN DE TEXTRURIZADO.	40,00	\$350,00	14000,00
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA BEREL 2 MANO, INCLUYE PREPARACION Y RESTIRAMIENTO.	400,00	\$70,00	28000,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED AHORRATIVA.	8,00	\$700,00	5600,00
SUMINISTRO Y REPOSICION DE APAGADOR COMPLETO.	8,00	\$350,00	2800,00

*Recepción*

*[Handwritten signature]*


LIMPIEZA Y SONDEO DE LINEA GENERAL DE DRENAJE Y PRUEBA AL REGISTRO EXTERIOR	80,00	\$200,00	16000,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ALIMENTACION DE 3/4" PARA SU CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA.	4,00	\$680,00	2720,00
HERRAJES Y CONEXIONES EN BOILER, MINGITORIO, TAZA, WC, LAVABO, PILETA, ASEO Y RESUMIDERO DE 4 PLG.	28,00	\$357,15	10000,00
ESPEJO LAVABO	4,00	\$800,00	3200,00


Subtotal	330880,00
Imponible	0,00
Impuesto %	0,16
Total Impuesto	52940,80
Otros	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>383820,80</b>

**TERMINOS Y CONDICIONES**

~~CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO~~  
~~SOLUCIONES INTEGRALES~~

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros  
 [Leonardo Moreno, cel:844174 70 18, E-mail mse.saltillo@gmail.com]



# CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

## OBRA CIVIL, ELECTRIFICACION Y SERVICIOS EN GENERAL

Arq. Jaime Alberto González Reyes

REG. FED. DE CAUS. GORJ-740403-465 C.U.R.P. GORJ740403HCLNYM06

CALLE EURIPIDES No. 563 FRACC. VALLE DORADO TEL. 01(844)418-09-04 CEL. 044-844-155-14-09

NEXTEL 231-13-83 I.D. 72\*8\*26653 SALTILLO, COAHUILA

FECHA

25-feb-22

AUTONOM AGRARIA ANTONIO NARRO

DIRECCION: CALZADA ANTONIO NARRO

ATENCION: GUSTAVO BURCIAGA

REMODELACION DE 4 BAÑOS DE MODULO 01

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
72,00	DEMOLICION DE VITROMURO	\$100,00	\$7.200,00
20,00	DEMOLICION DE VITROPISO	\$100,00	\$2.000,00
88,00	RETIRO DE LINEAS HIDRAULICAS EXISTENTES DE COBRE, RETIRO DE SANITARIO Y DE LAVABO.	\$175,00	\$15.400,00
8,00	RETIRO DE APARATO SANITARIO Y DE LAVABO	\$205,00	\$1.640,00
8,00	MAMPARA DE ALUMINIO CON ACRILICO EN DIVISION DE REGADERA.	\$5.500,00	\$44.000,00
4,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUELETOS CON TUBOPLUS DE 1/2 PULG., MEZCADORA RUGO Y CEBOLLETA ELVEX	\$4.000,00	\$16.000,00
120,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOPLUS DE 1/2PULG. PARA AGUA FRIA Y CALIENTE PARA LAVABO.	\$350,00	\$42.000,00
96,00	COLOCACION DE VITROMURO DE 33X33 CMS. DE PRIMERA COLOR CLARO.	\$500,00	\$48.000,00
24,00	COLOCACION Y SUMINISTRO DE VITROPISO ANTIDERRAPANTE EN BAÑO.	\$500,00	\$12.000,00
4,00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS COMPLETO, MARCA CATO, VITROMEX	\$2.800,00	\$11.200,00
4,00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO Y PEDESTAL COMPLETO, MARCA CATO VITROMEX.	\$3.200,00	\$12.800,00
4,00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGUITORIO COMPLETO	\$4.100,00	\$16.400,00
4,00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y PUERTA MULTIPANEL	\$4.700,00	\$18.800,00
40,00	RESANES Y RESTIRAMIENTO EN AREA DE RERGADERAS Y APLICACIÓN DE TEXTRURIZADO.	\$400,00	\$16.000,00
400,00	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA BEREL 2 MANO, INCLUYE PREPARACION Y RESTIRAMIENTO.	\$80,00	\$32.000,00
8,00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED AHORRATIVA.	\$680,00	\$5.440,00
8,00	SUMINISTRO Y REPOSICION DE APAGADOR COMPLETO.	\$400,00	\$3.200,00

8,00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS POLARIOZADOS.	\$400,00	\$3.200,00
80,00	LIMPIEZA Y SONDEO DE LINEA GENERAL DE DRENAJE Y PRUEBA AL REGISTRO EXTERIOR	\$300,00	\$24.000,00
4,00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ALIMENTACION DE 3/4" PARA SU CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA.	\$650,00	\$2.600,00
28,00	HERRAJES Y CONEXIONES EN BOILER, MINGITORIO, TAZA, WC, LAVABO, PILETA, ASEO Y RESUMIDERO DE 4 PLG.	\$340,00	\$9.520,00
		<b>SUBTOTAL</b>	\$343.400,00
		<b>IVA</b>	\$54.944,00
		<b>TOTAL</b>	\$398.344,00

SE REQUIERE DE UN ANTICIPO DEL 50% AL INICIAR
<i>Sujeto a cambio sin previo aviso</i>

*Ruiz*



30 ANIVERSARIO



PR133  
26-FEBRERO-22

ACTUALIZADO

RFC. CDI910523133  
UAAAN  
Presente

COMERCIALIZADORA DISCOM, es una empresa seria establecida en esta ciudad desde hace más de veinticinco años dedicándose a realizar trabajos profesionales.

REMODELACION DE BAÑOS MODULO 01

UBICACION DE LA OBRA: UAAAN, Coahuila

CONCEPTO (Incluye material y mano de obra)	U.M.	CANT.	P.U.	IMPORTE
DEMOLICION DE VITROMURO DEMOLICION DE VITROPISO RETIRO DE LINEAS HIDRAULICAS EXISTENTES DE COBRE, RETIRO DE SANITARIO Y DE LAVABO. RETIRO DE APARATO SANITARIO Y DE LAVABO MUPARA DE ALUMINIO CON ACRILICO EN DIVISION DE REGADERA. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUELETOS CON TUBOPLUS DE 1/2 PULG., MEZCADORA RUGO Y CEBOLLETA ELVEX SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOPLUS DE 1/2PULG. PARA AGUA FRIA Y CALIENTE PARA LAVABO. COLOCACION DE VITROMURO DE 33X33 CMS. DE PRIMERA COLOR CLARO. COLOCACION Y SUMINISTRO DE VITROPISO ANTIDERRAPANTE EN BAÑO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS COMPLETO, MARCA CATO, VITROMEX SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO Y PEDESTAL COMPLETO, MARCA CATO VITROMEX. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGUITORIO COMPLETO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y PUERTA MULTIPANEL RESANES Y RESTIRAMIENTO EN AREA DE RERGADERAS Y APLICACIÓN DE TEXTRURIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA BEREL 2 MANO, INCLUYE PREPARACION Y RESTIRAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED AHORRATIVA. SUMINISTRO Y REPOSICION DE APAGADOR COMPLETO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS POLARIOZADOS. LIMPIEZA Y SONDEO DE LINEA GENERAL DE DRENAJE Y PRUEBA AL REGISTRO EXTERIOR SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ALIMENTACION DE 3/4"PARA SU CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA. HERRAJES Y CONEXIONES EN BOILER, MINGITORIO, TAZA, WC, LAVABO, PILETA, ASEO Y RESUMIDERO DE 4 PLG. ESPEJO LAVABO				
SUBTOTAL	LOTE	1	\$ 350,000	\$ 350,000
IVA				\$ 56,000
AL				\$ 406,000

Nuestras garantías aparte de estar respaldadas por COMERCIALIZADORA DISCOM tienen el aval y soporte de la marcas que representamos.

Condiciones: Anticipo del 60 % para efectos de programar pedido de material sujeto a disponibilidad en bodega o en planta. El inicio de obra se realizará una vez que se tenga el material en nuestras instalaciones y sujeto a programa de trabajo y que las condiciones climatológicas lo permitan. El pago del Saldo por parte del Cliente se realizará un vez entregado a este último la obra de acuerdo con estimaciones semanales previamente pactadas por el cliente y COMERCIALIZADORA DISCOM, S. A. DE C.V

LIC. MIGUEL ANGEL MORA ARENAS

GERENTE GENERAL

*Reunyal*  
AUTORIZA





Saltillo Coahuila a 28 de Marzo del 2022

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

A QUIEN CORRESPONDA

A través de este medio se informa que el día 28 de Marzo 2022 se dan por terminado los trabajos aprobados de REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS-DORMITORIO-MODULO 01 de la UAAAN contrato 007/22 AD MTTO.

Sin más por el momento quedo de usted

Atte.

Claudia Verónica Duran Arellano

Soluciones integrales





[Leonardo Moreno, cel:844174 70 18, E-mail mse.saltillo@gmail.com]

**Gracias por hacer negocios con nosotros!**

ESTE REPORTE FOTOGRAFICO AMPARA EL SERVICIO DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS DE DORMITORIOS MODULOS

INICIO DEL MTTD

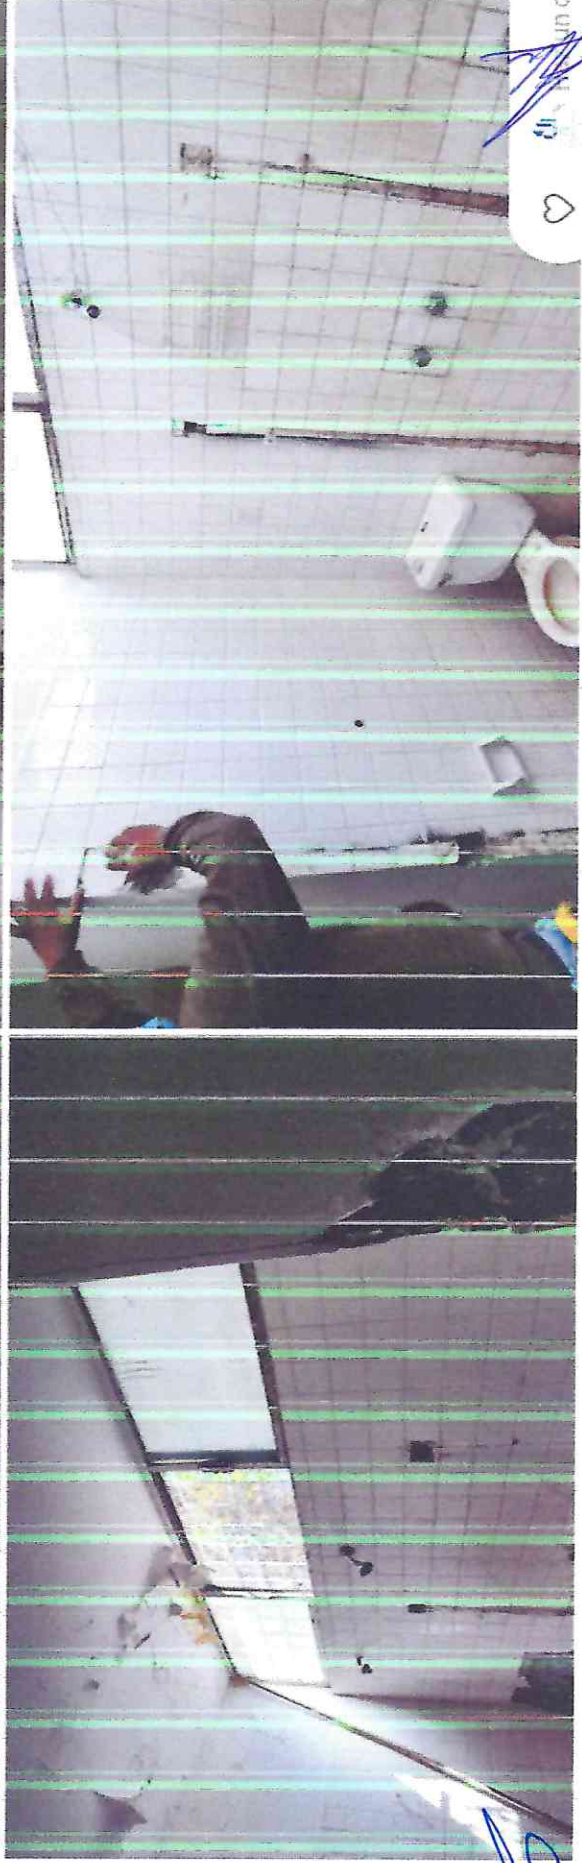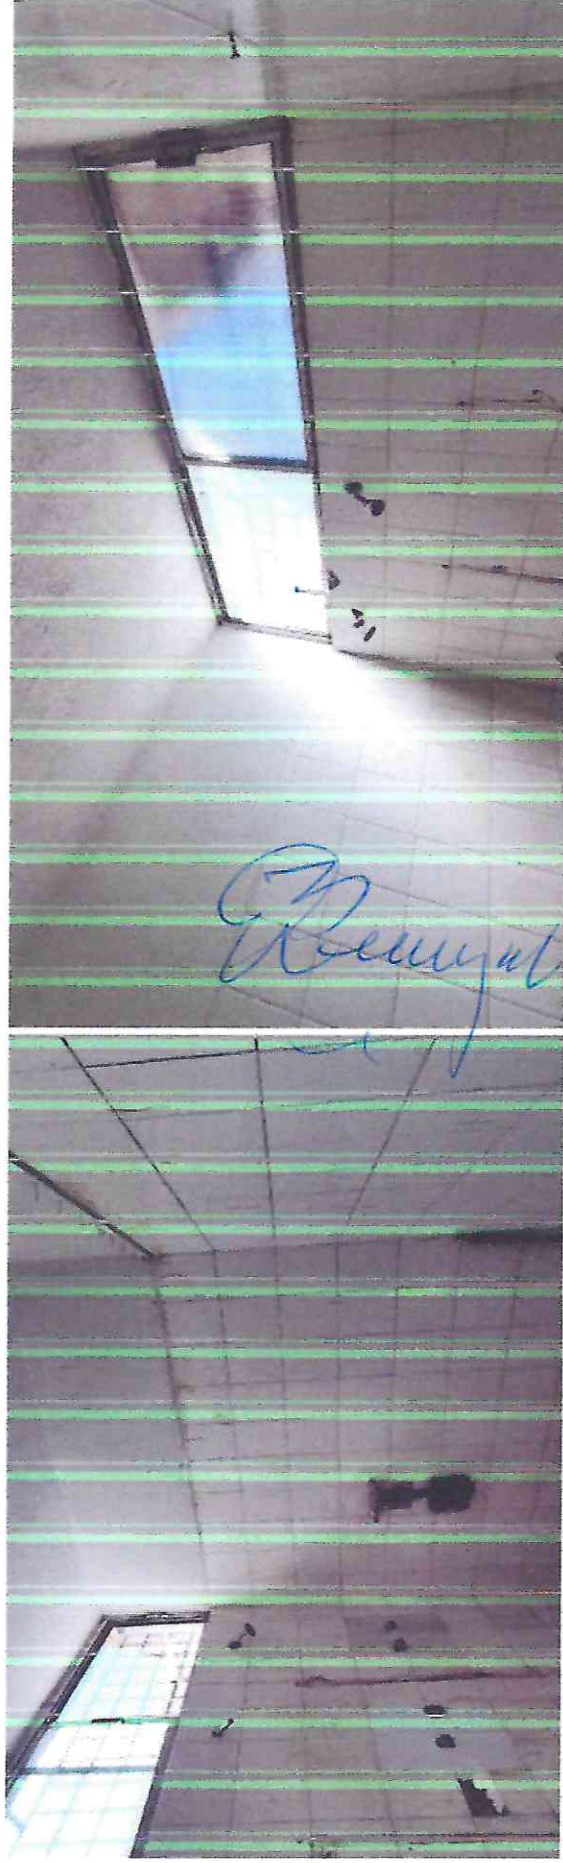

ESTE REPORTE FOTOGRAFICO AMPARA EL SERVICIO DE REMODELACION  
Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS DE DORMITORIOS MODULOS

INICIO DEL MTTO



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ESTE REPORTE FOTOGRAFICO AMPARA EL SERVICIO DE REMODELACION  
Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS DE DORMITORIOS MODULOS

INICIO DEL MITTO




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ESTE REPORTE FOTOGRAFICO AMPARA EL SERVICIO DE REMODELACION  
Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS DE DORMITORIOS MODULOS

INICIO DEL MTT0

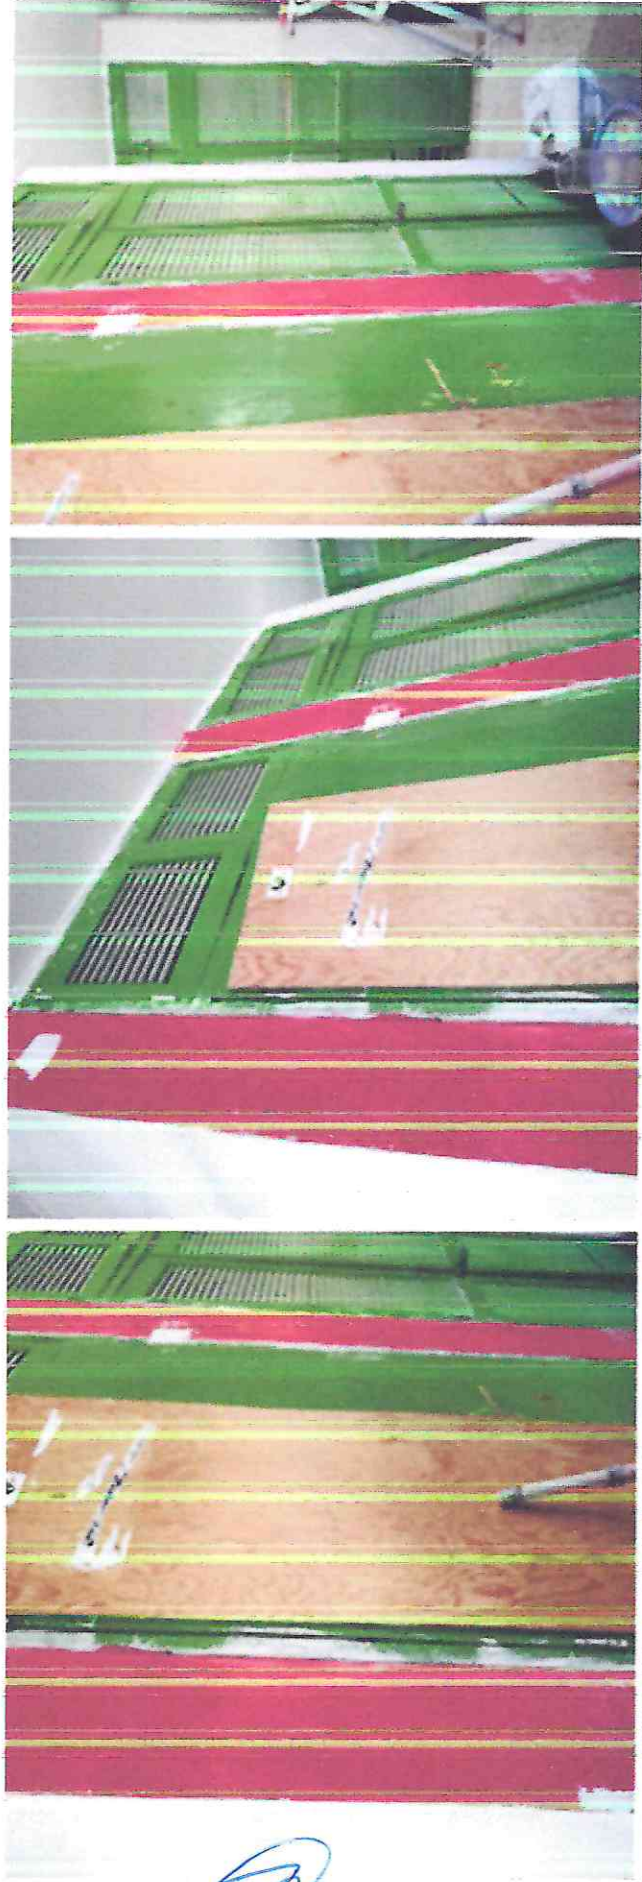



*Reyes*

*[Signature]*

*[Signature]*

ESTE REPORTE FOTOGRAFICO AMPARA EL SERVICIO DE REMODELACION  
Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS DE DORMITORIOS MODULOS

DURANTE EL MTTO

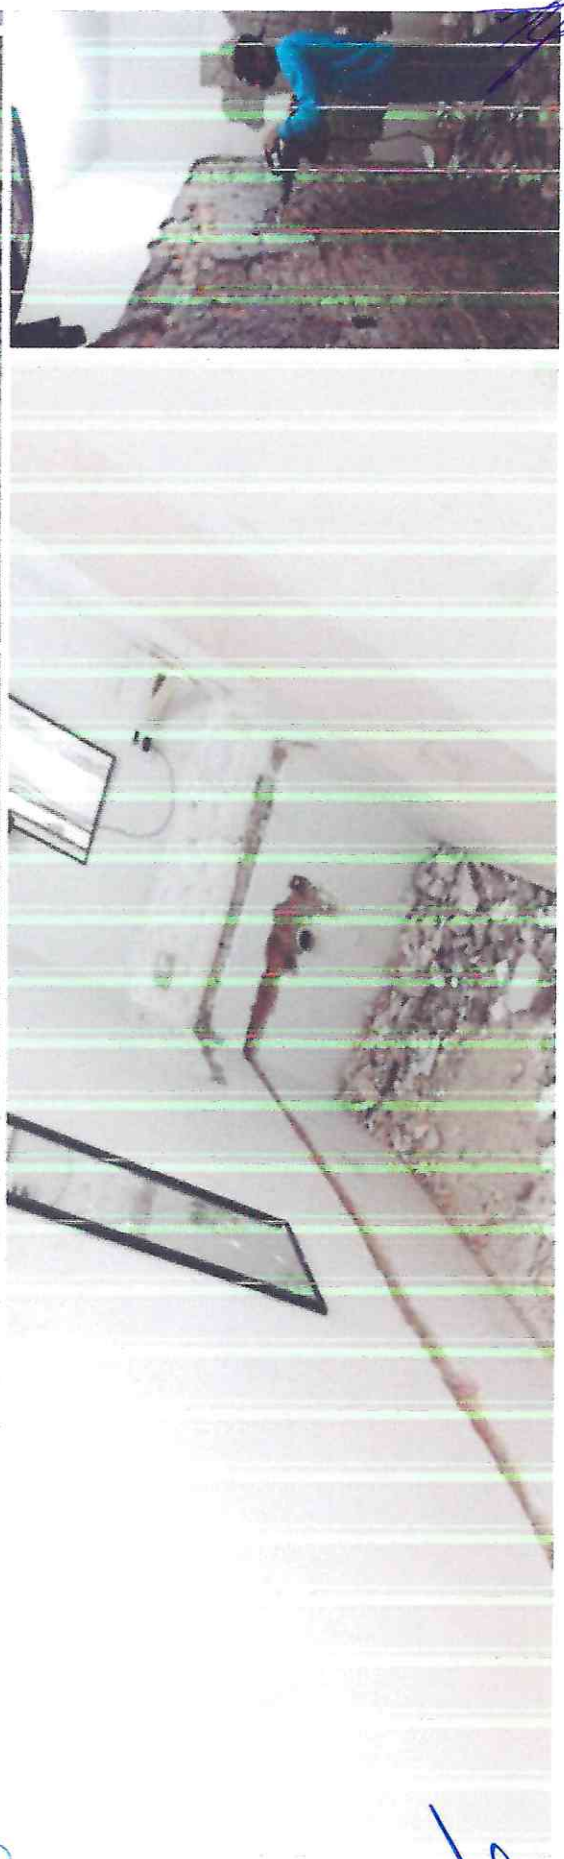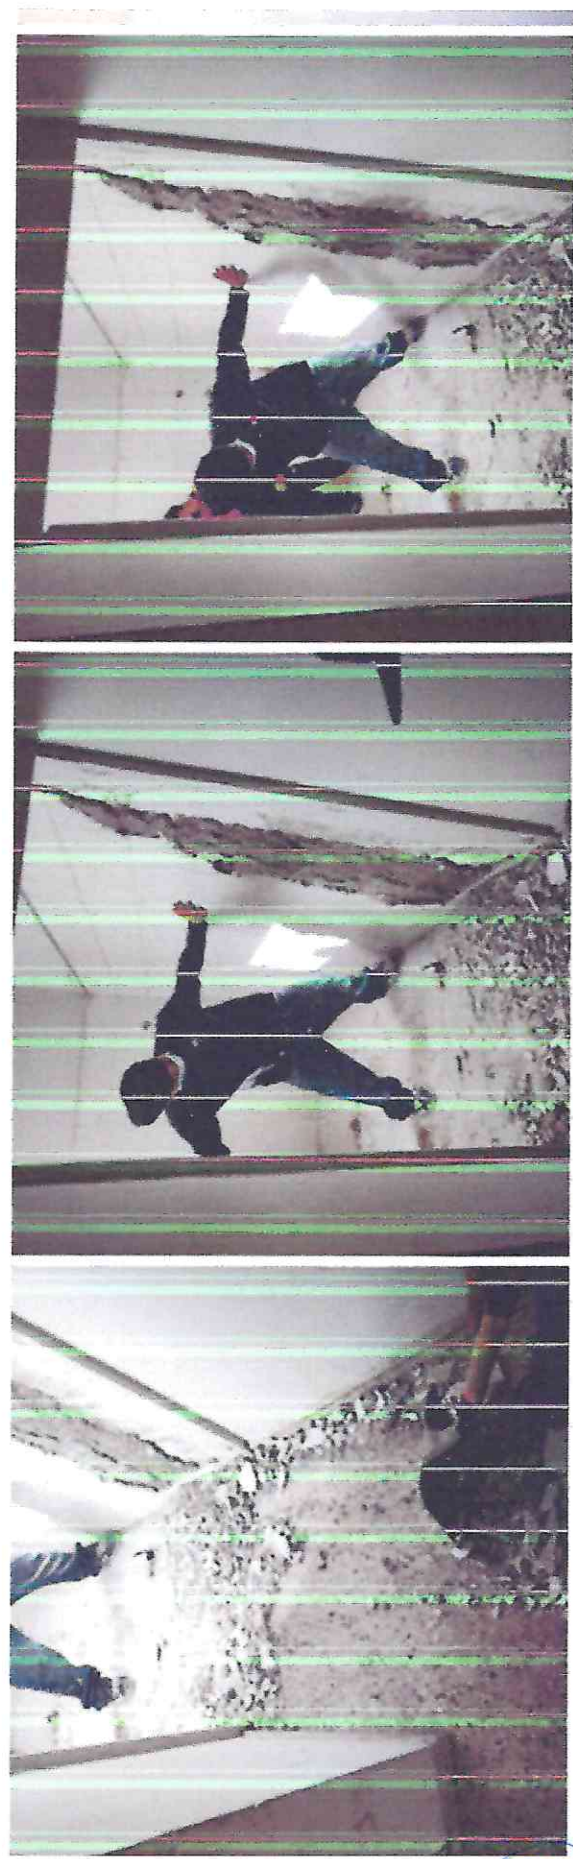


*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

ESTE REPORTE FOTOGRAFICO AMPARA EL SERVICIO DE REMODELACION  
Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS DE DORMITORIOS MODULOS

DURANTE EL MTTO

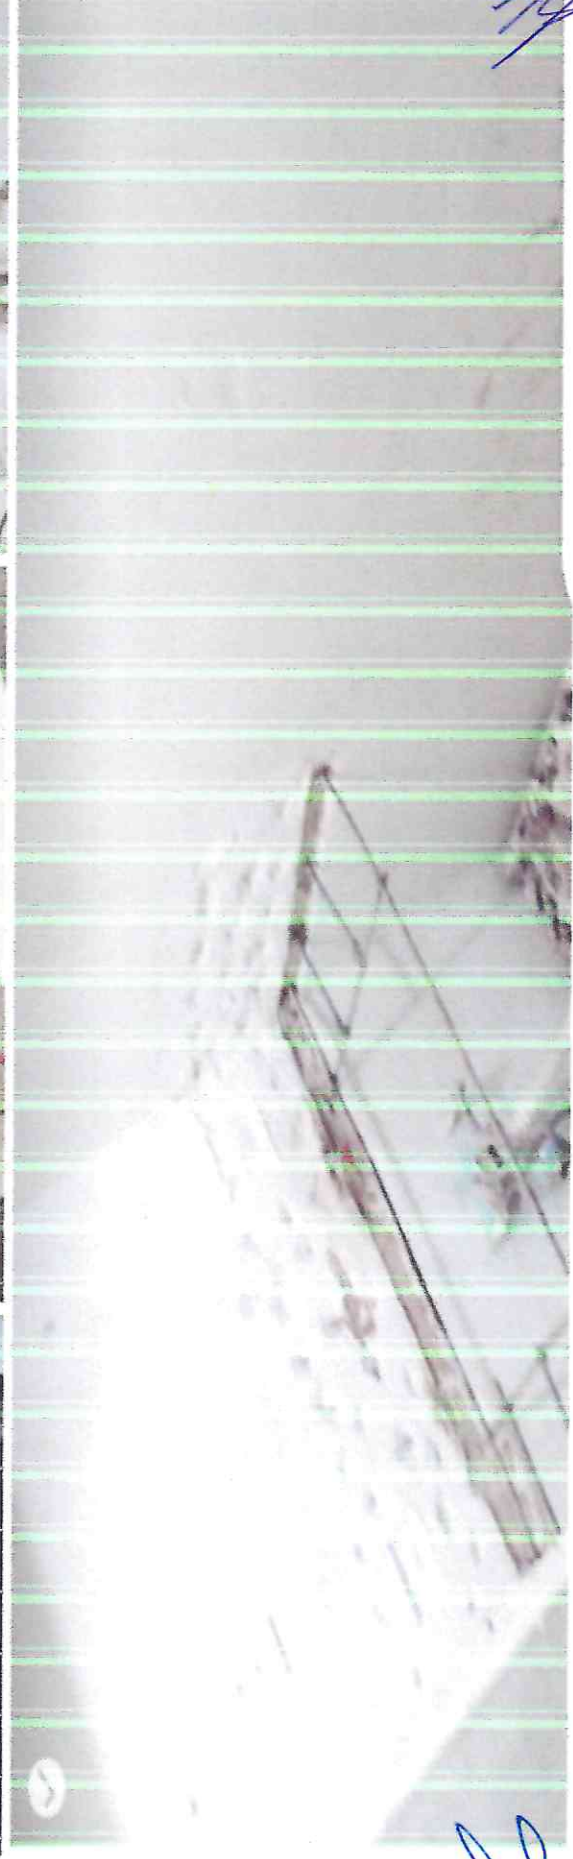

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

ESTE REPORTE FOTOGRAFICO AMPARA EL SERVICIO DE REMODELACION  
Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS DE DORMITORIOS MODULOS

DURANTE EL MTTO




Ruiz

RP

ESTE REPORTE FOTOGRAFICO AMPARA EL SERVICIO DE REMODELACION  
Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS DE DORMITORIOS MODULOS

DURANTE EL MTTO

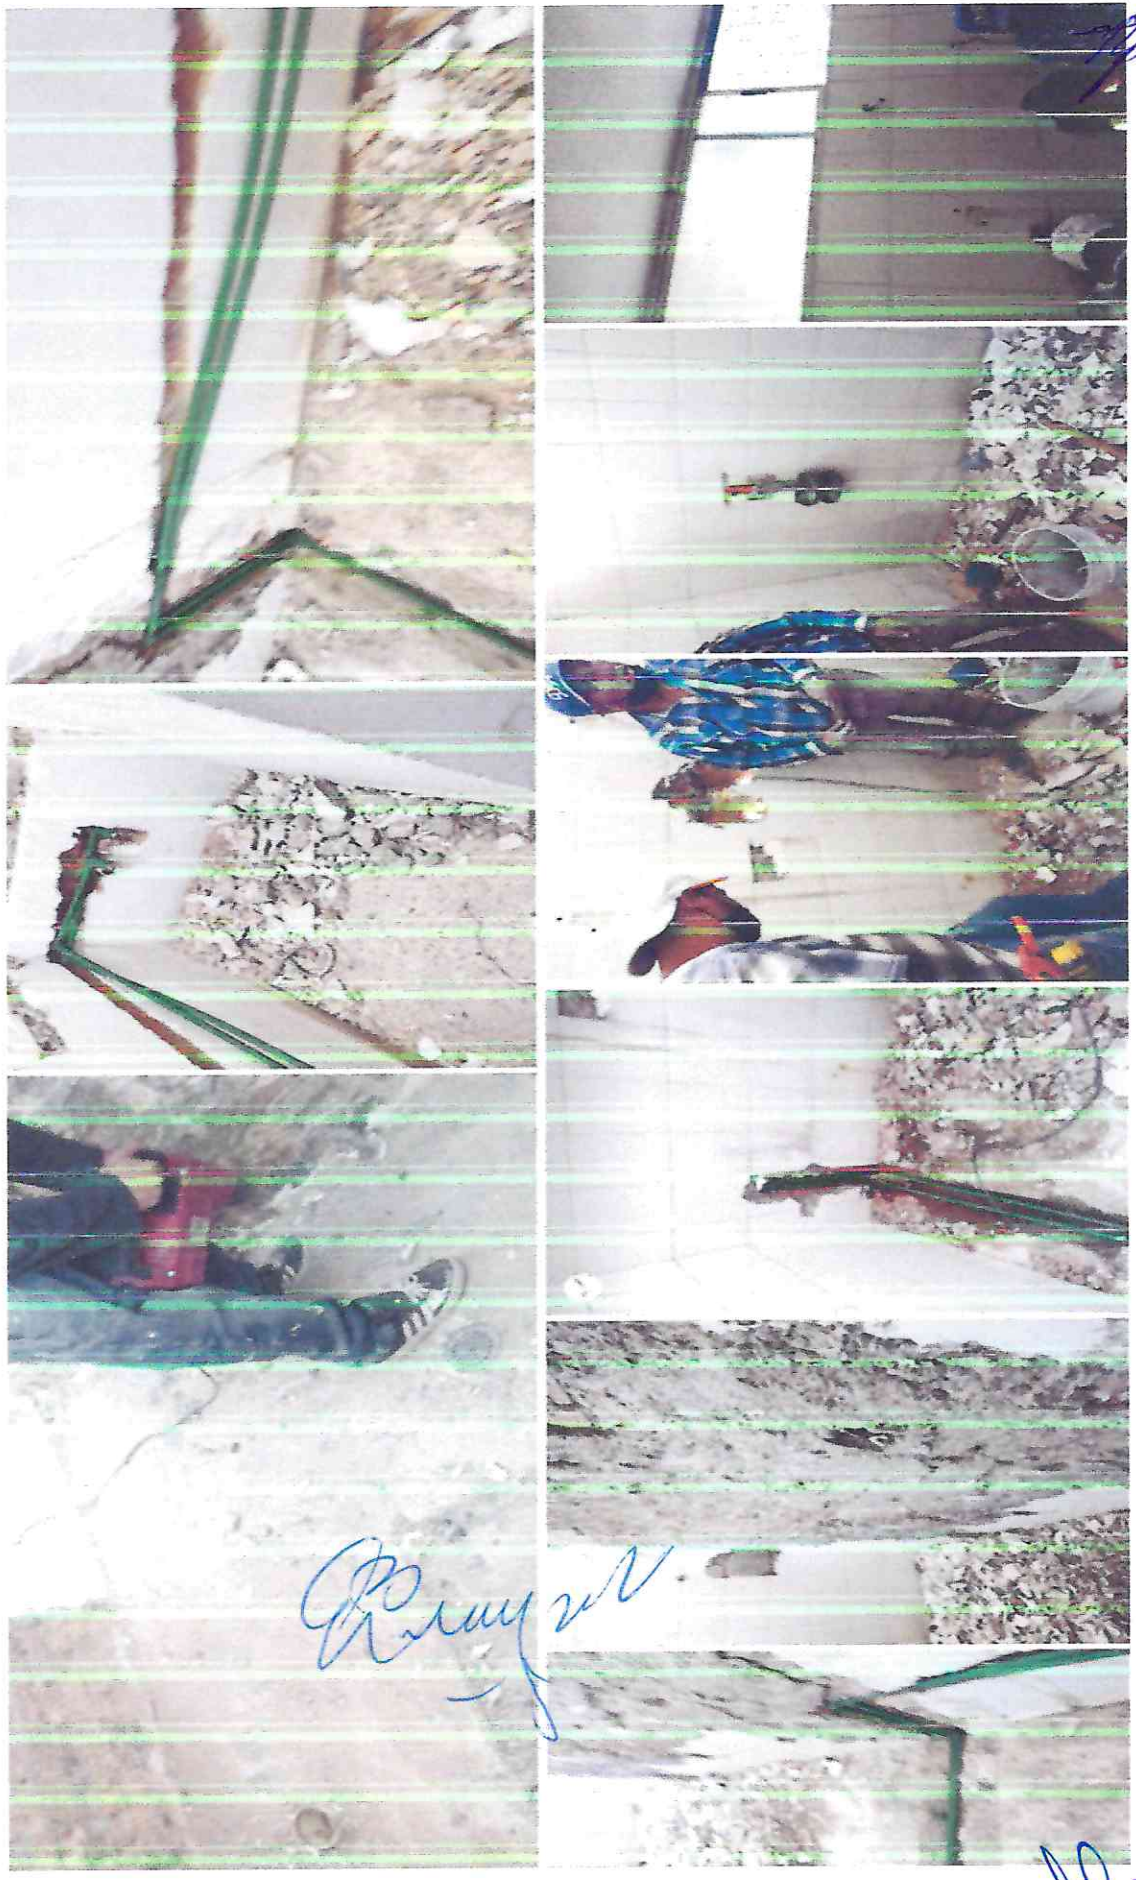



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

ESTE REPORTE FOTOGRAFICO AMPARA EL SERVICIO DE REMODELACION  
Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS DE DORMITORIOS MODULOS

DURANTE EL MTO

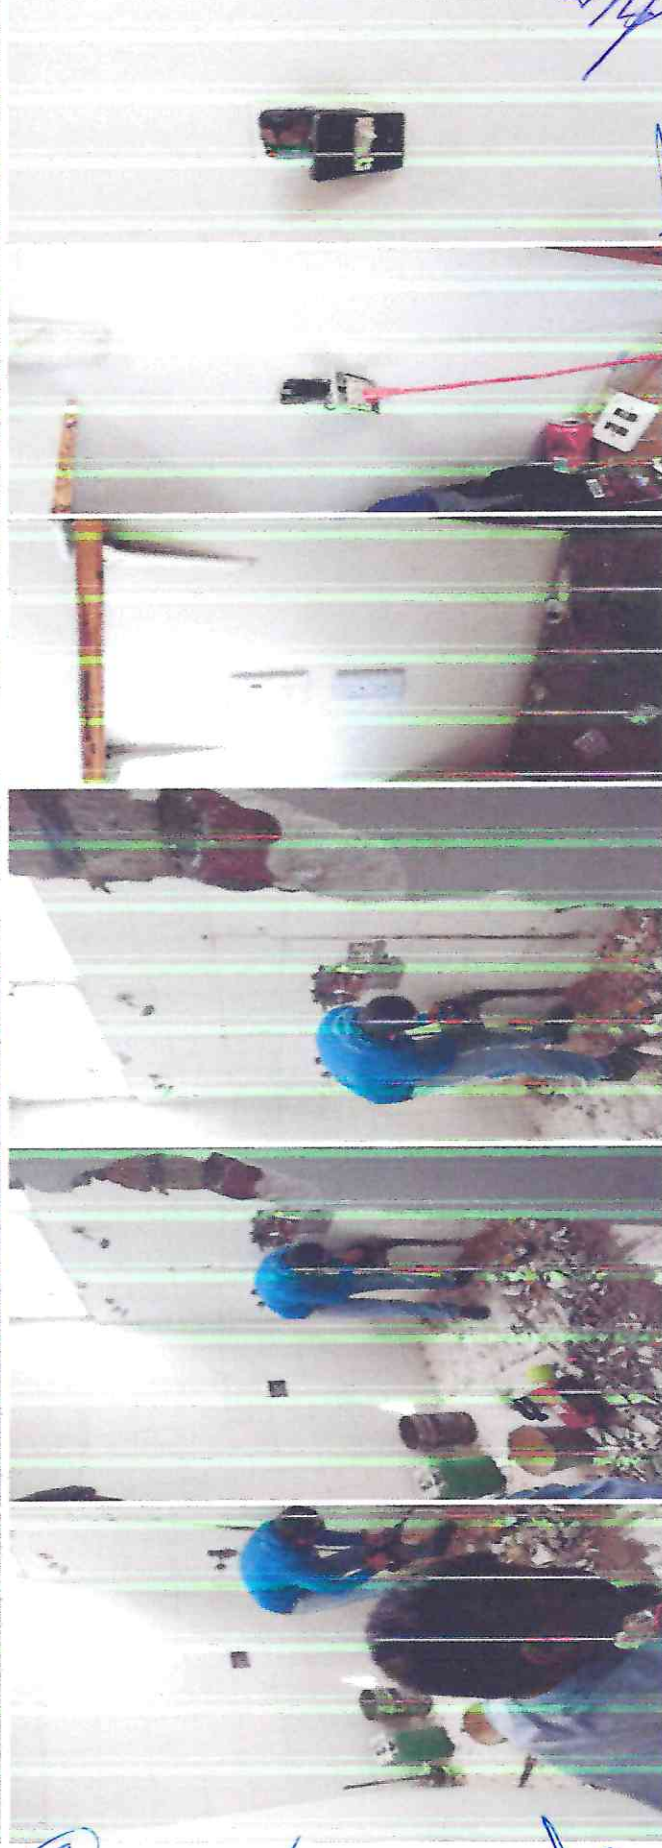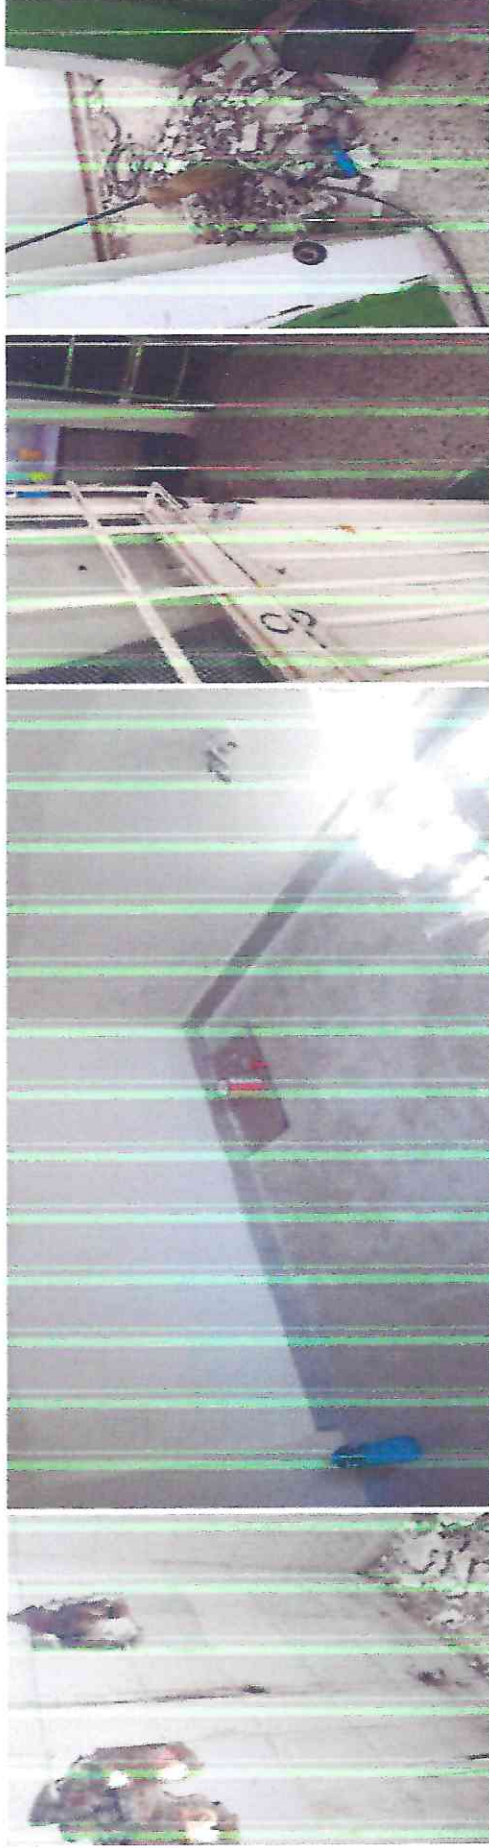

*Quincy at*

ESTE REPORTE FOTOGRAFICO AMPARA EL SERVICIO DE REMODELACION  
Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS DE DORMITORIOS MODULOS

DURANTE EL MITTO




*Reyes*

*[Handwritten signature]*



ESTE REPORTE FOTOGRAFICO AMPARA EL SERVICIO DE REMODELACION  
Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS DE DORMITORIOS MODULOS

DURANTE EL MTTO

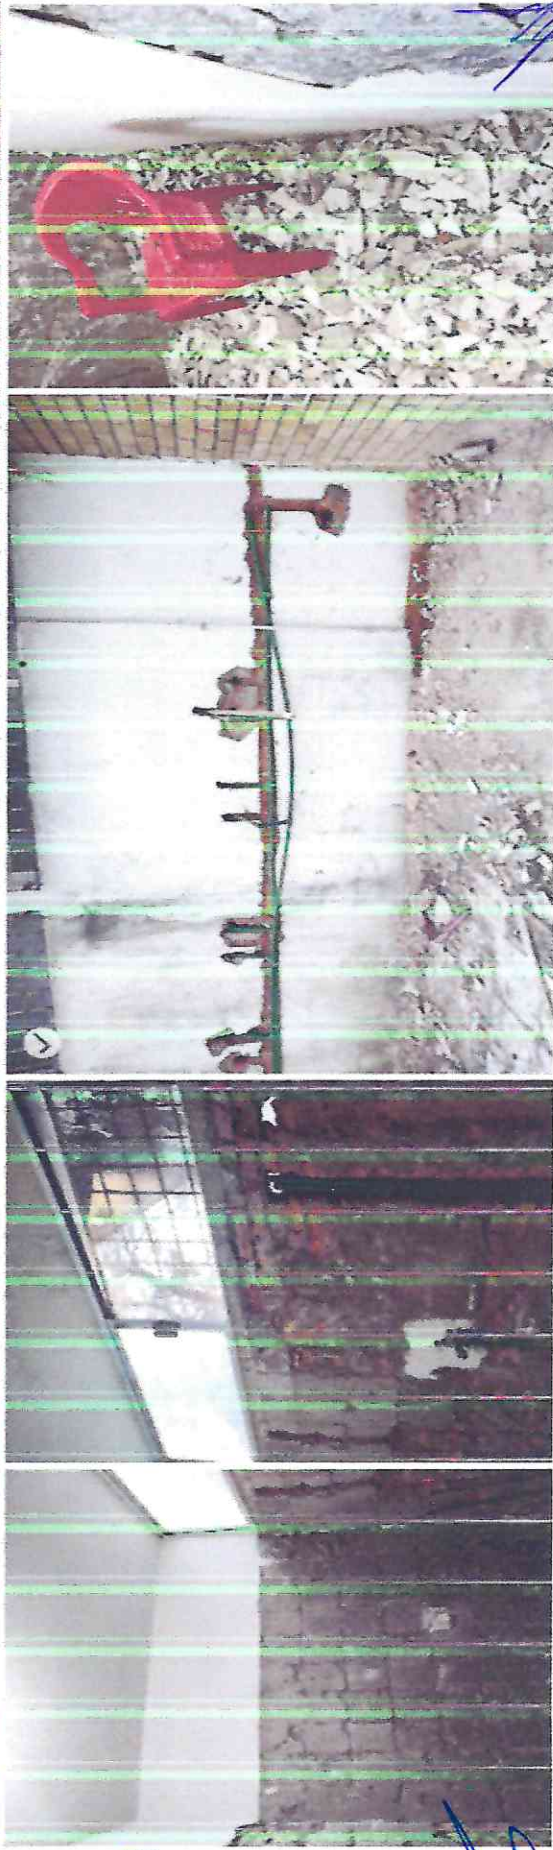


Reyes  
[Signature]

[Signature]

ESTE REPORTE FOTOGRAFICO AMPARA EL SERVICIO DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS DE DORMITORIOS MODULOS

DURANTE EL MTTO

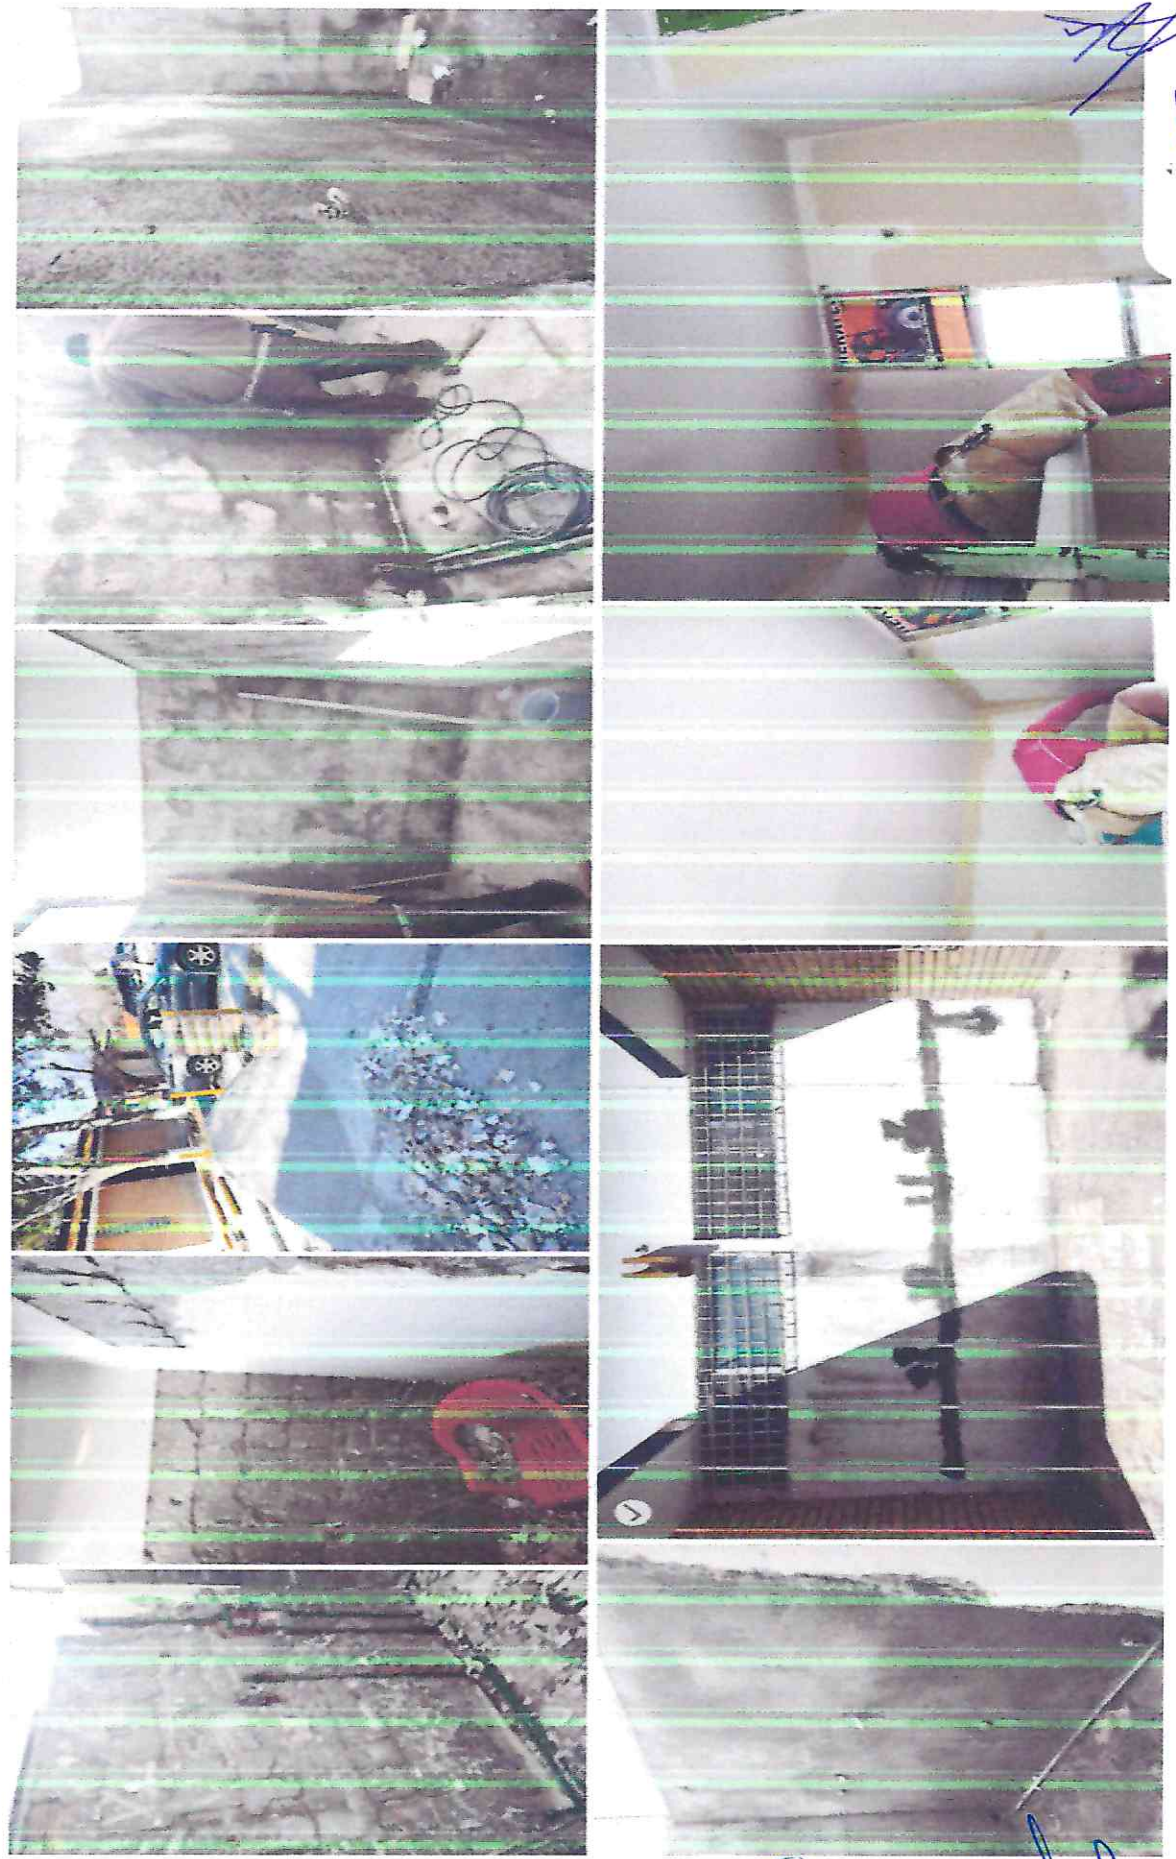

Renovado  
[Signature]

[Signature]

ESTE REPORTE FOTOGRAFICO AMPARA EL SERVICIO DE REMODELACION  
Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS DE DORMITORIOS MODULOS

DURANTE EL MTTO



*Raymundo*

*[Handwritten signature]*

ESTE REPORTE FOTOGRAFICO AMPARA EL SERVICIO DE REMODELACION  
Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS DE DORMITORIOS MODULOS

DURANTE EL MTTO




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ESTE REPORTE FOTOGRAFICO AMPARA EL SERVICIO DE REMODELACION  
Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS DE DORMITORIOS MODULOS

DURANTE EL MTTTO

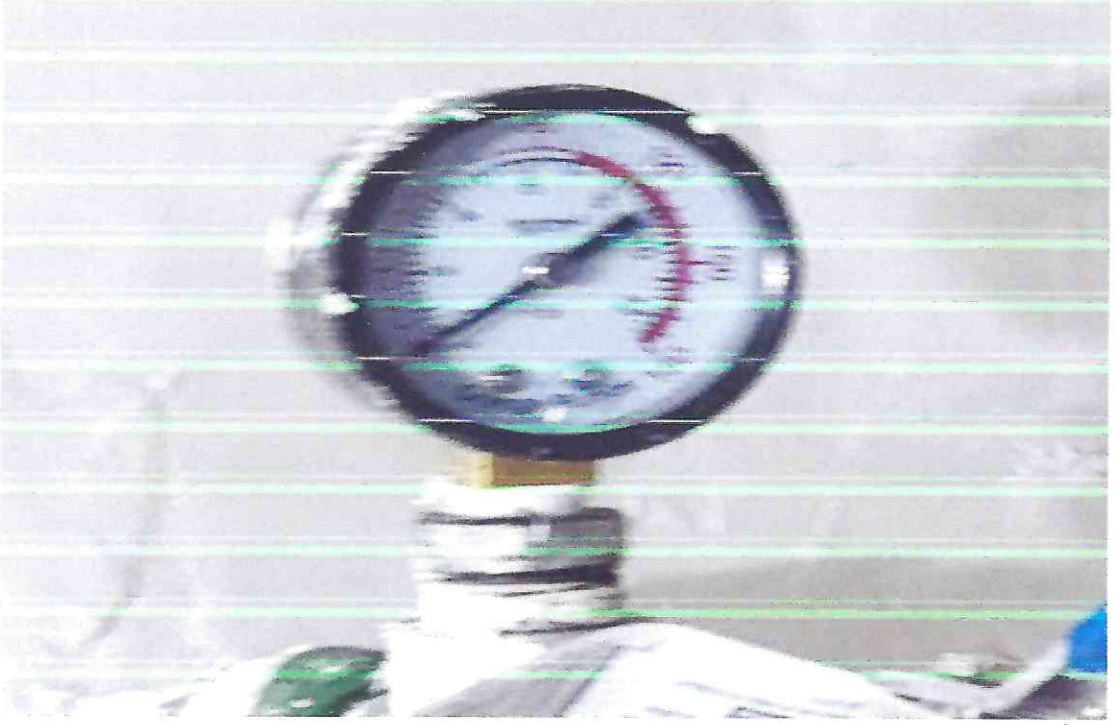

*Ruiz*



*[Signature]*

*[Signature]*

ESTE REPORTE FOTOGRAFICO AMPARA EL SERVICIO DE REMODELACION  
Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS DE DORMITORIOS MODULOS

DURANTE EL MTTO



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

ESTE REPORTE FOTOGRAFICO AMPARA EL SERVICIO DE REMODELACION  
Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS DE DORMITORIOS MODULOS

DURANTE EL MITTO




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ESTE REPORTE FOTOGRAFICO AMPARA EL SERVICIO DE REMODELACION  
Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS DE DORMITORIOS MODULOS

DURANTE EL MTTO

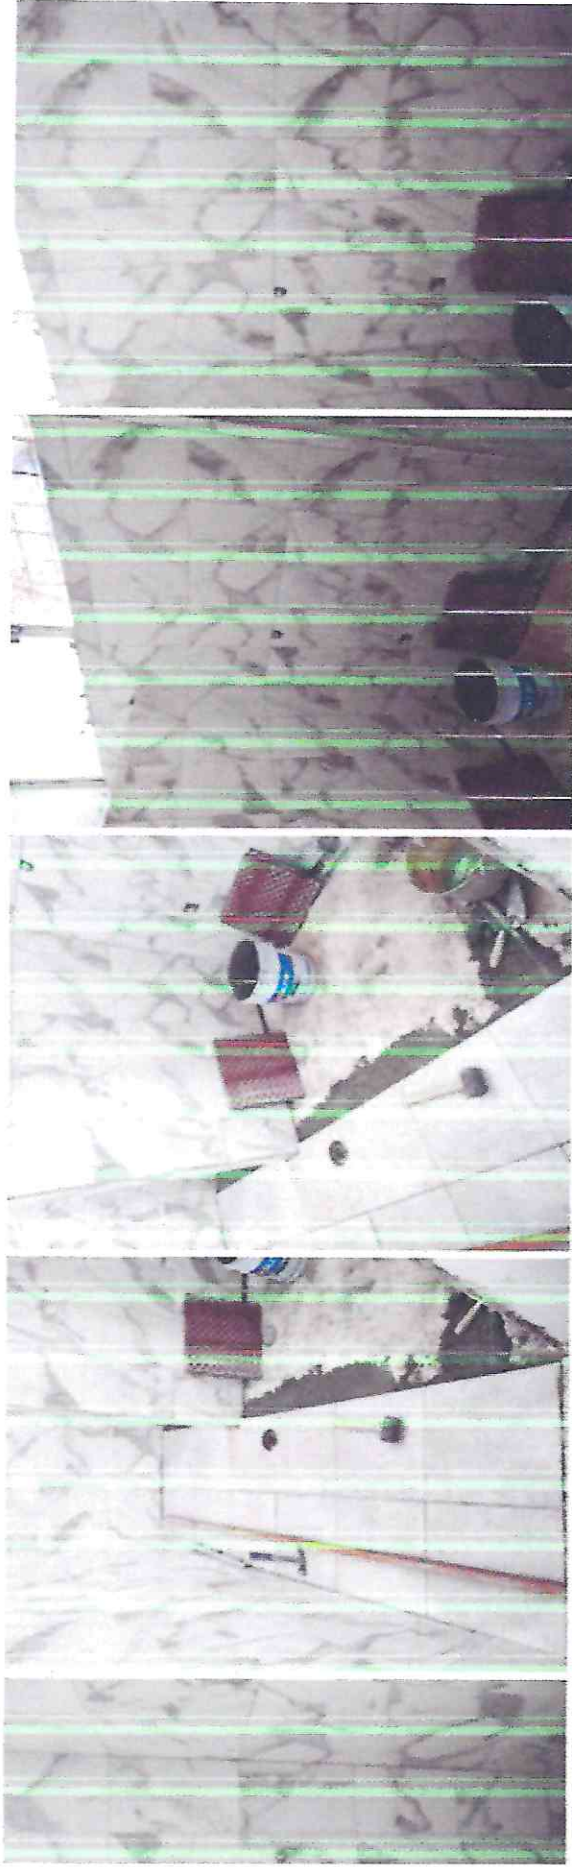

*Handwritten signature*  
10



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



# ESTE REPORTE FOTOGRAFICO AMPARA EL SERVICIO DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS DE DORMITORIOS MODULOS

DURANTE EL MITTO

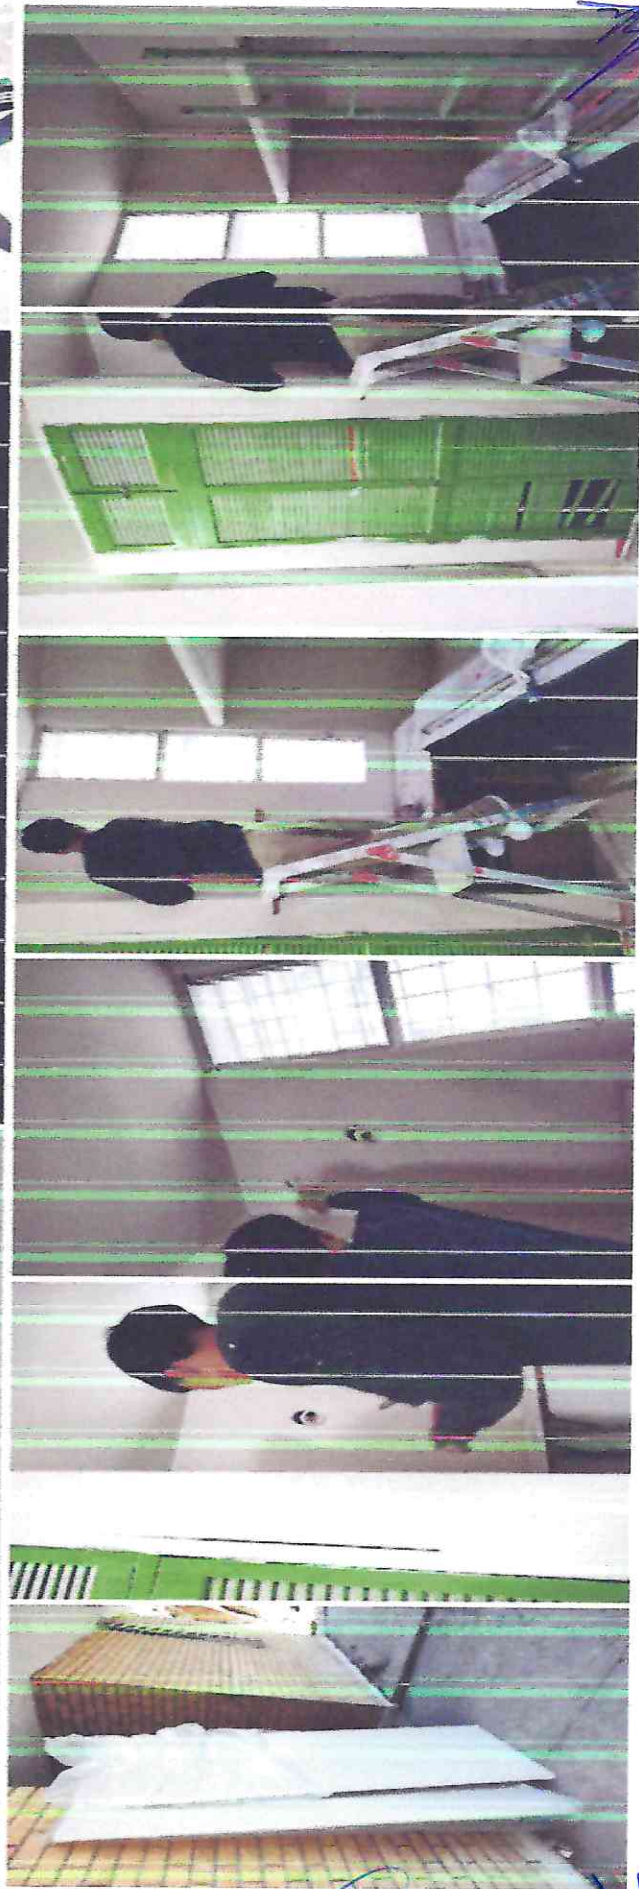
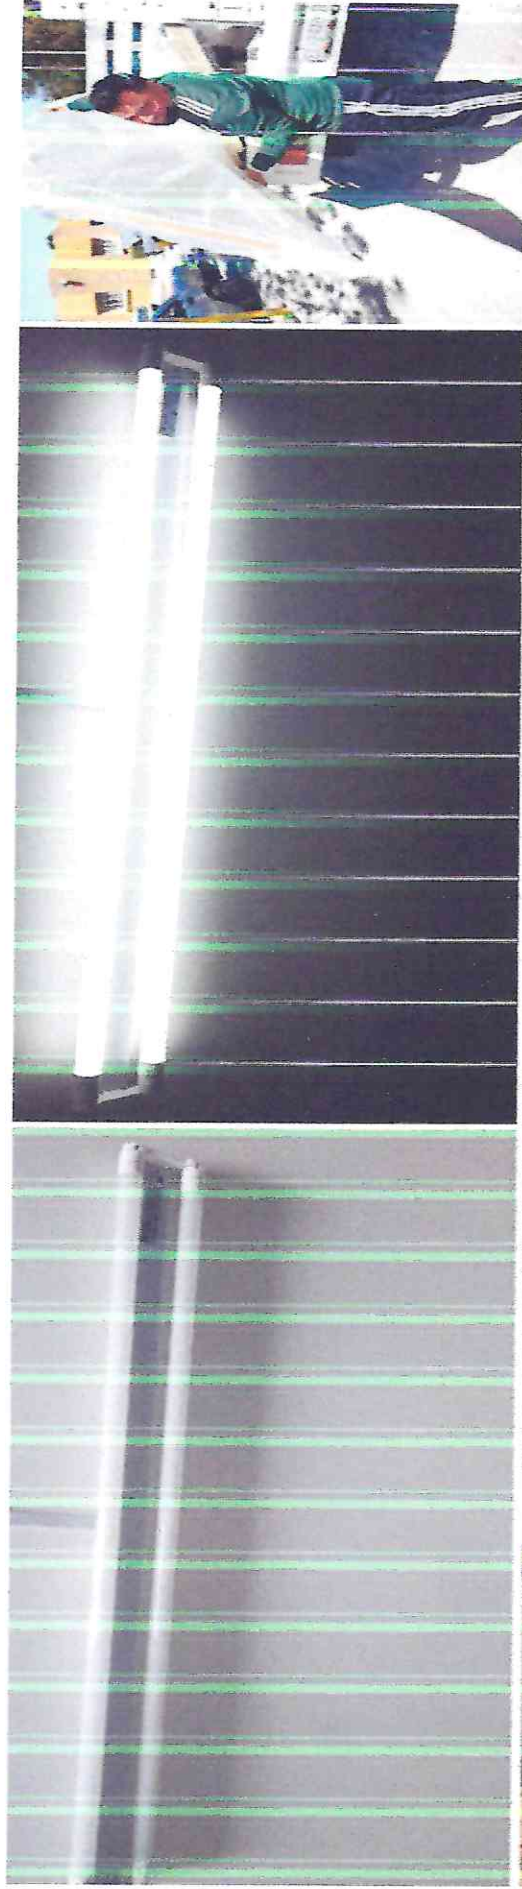


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# ESTE REPORTE FOTOGRAFICO AMPARA EL SERVICIO DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS DE DORMITORIOS MODULOS

DURANTE EL MTTO

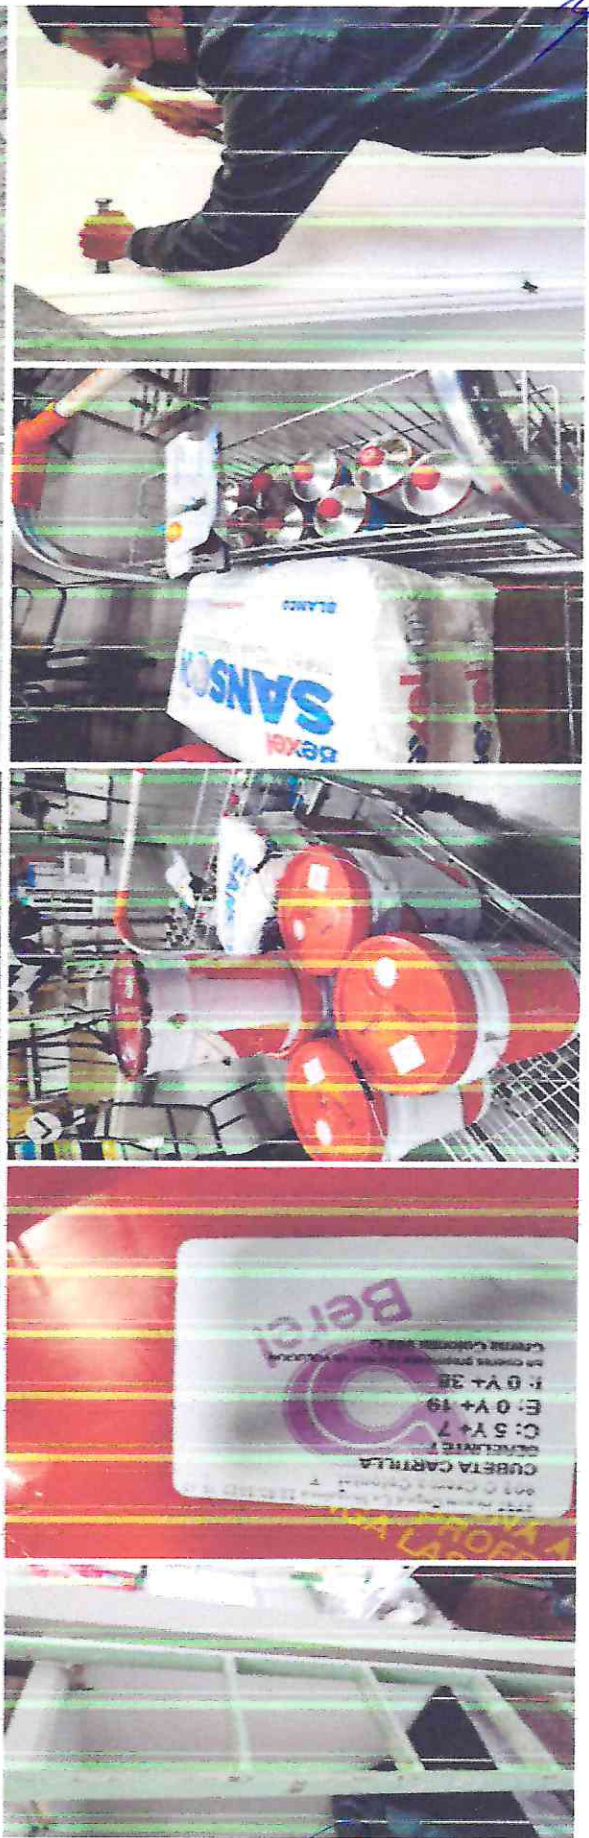
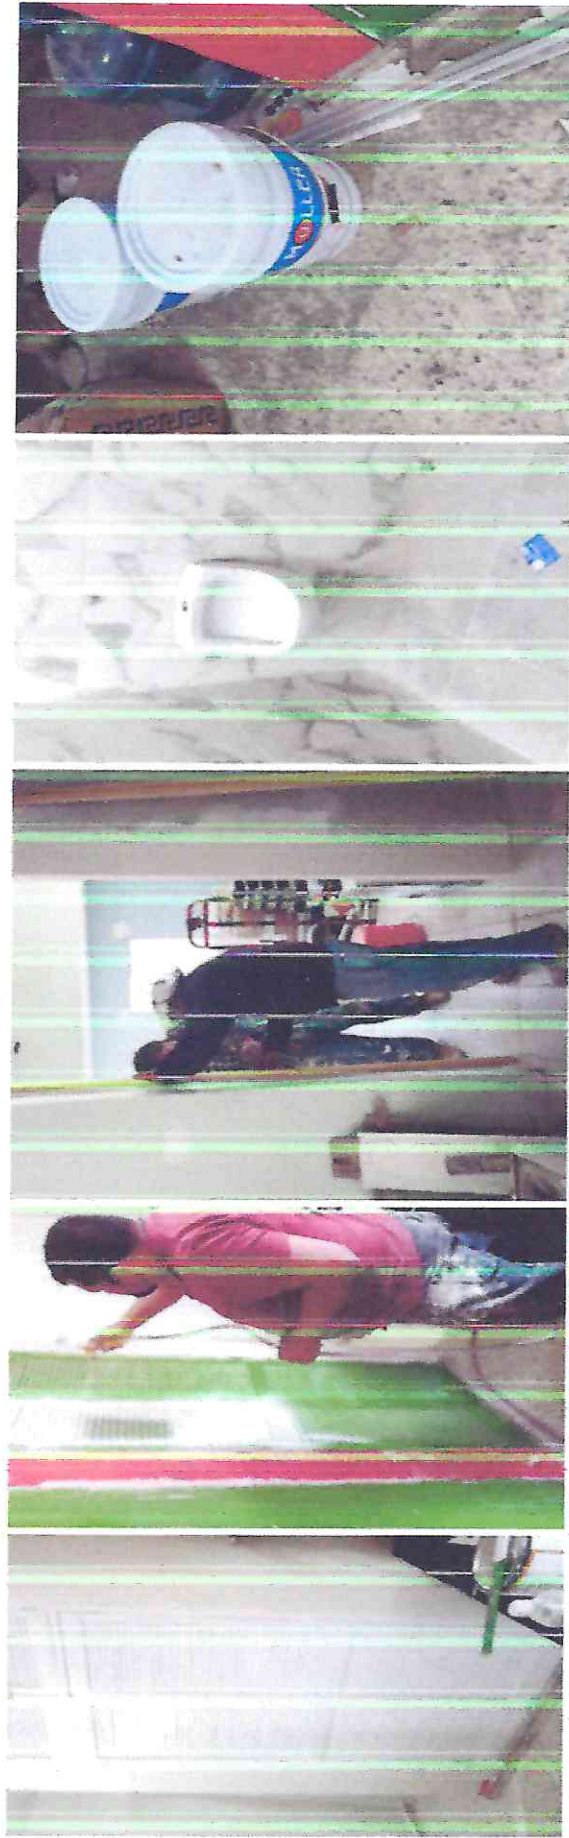


*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

**ESTE REPORTE FOTOGRAFICO AMPARA EL SERVICIO DE REMODELACION  
Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS DE DORMITORIOS MODULOS**


**DURANTE EL MTTO**

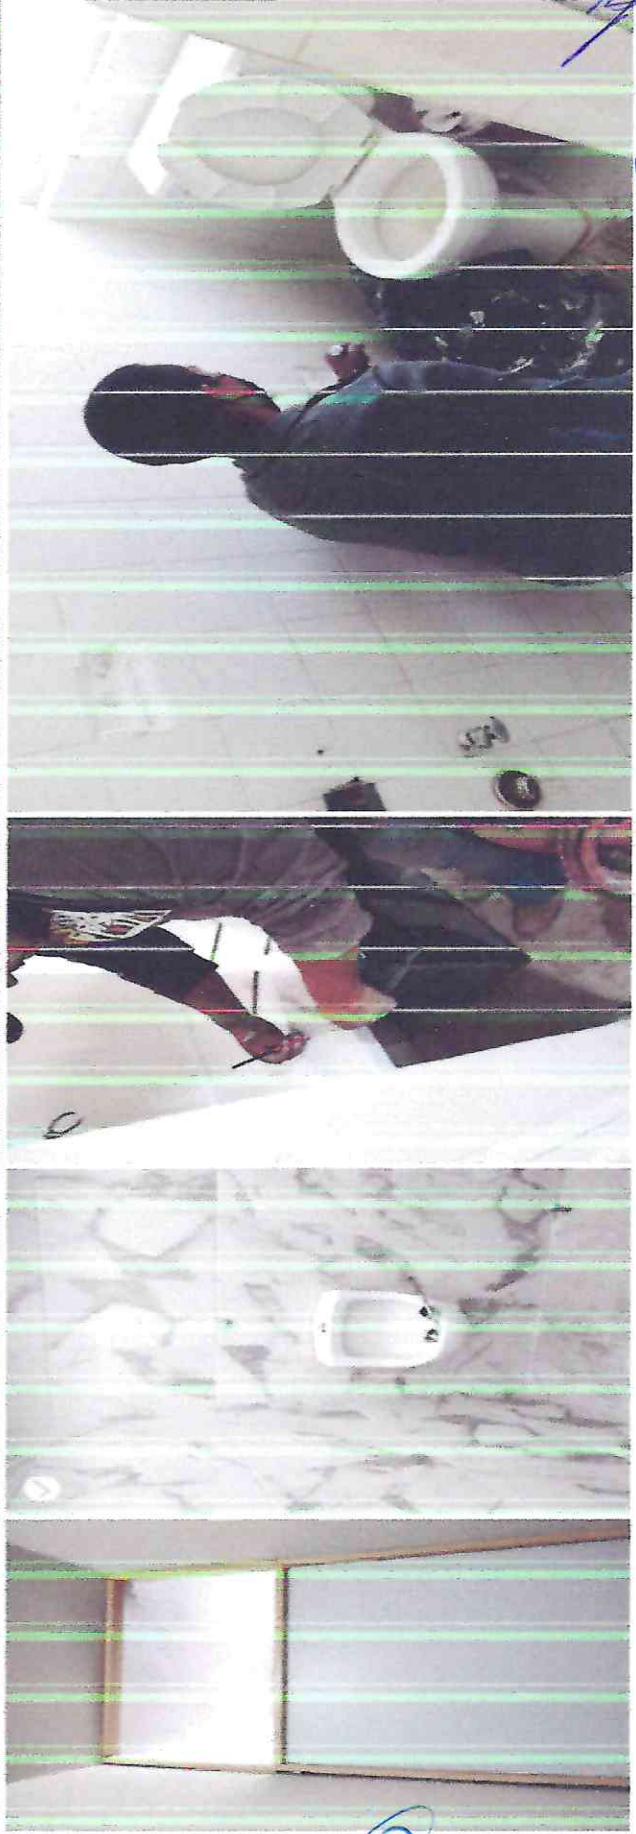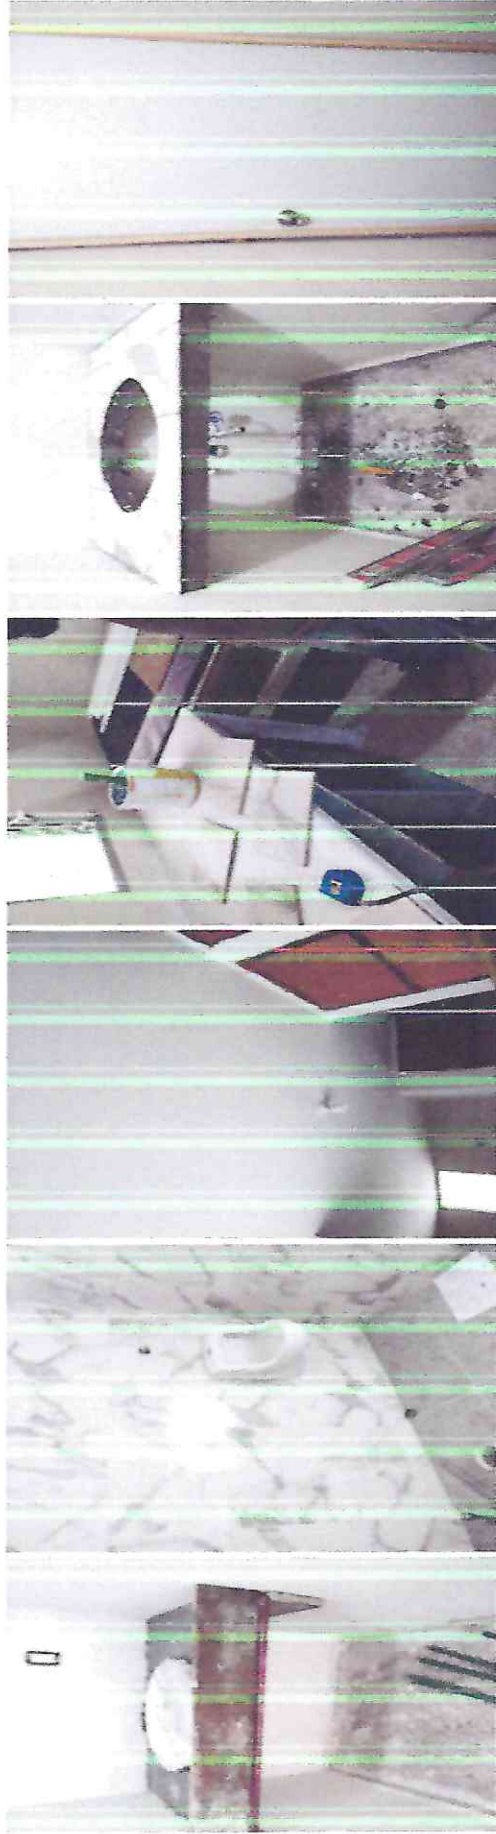

*Renny*

ESTE REPORTE FOTOGRAFICO AMPARA EL SERVICIO DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS DE DORMITORIOS MODULOS

DURANTE EL MTTO

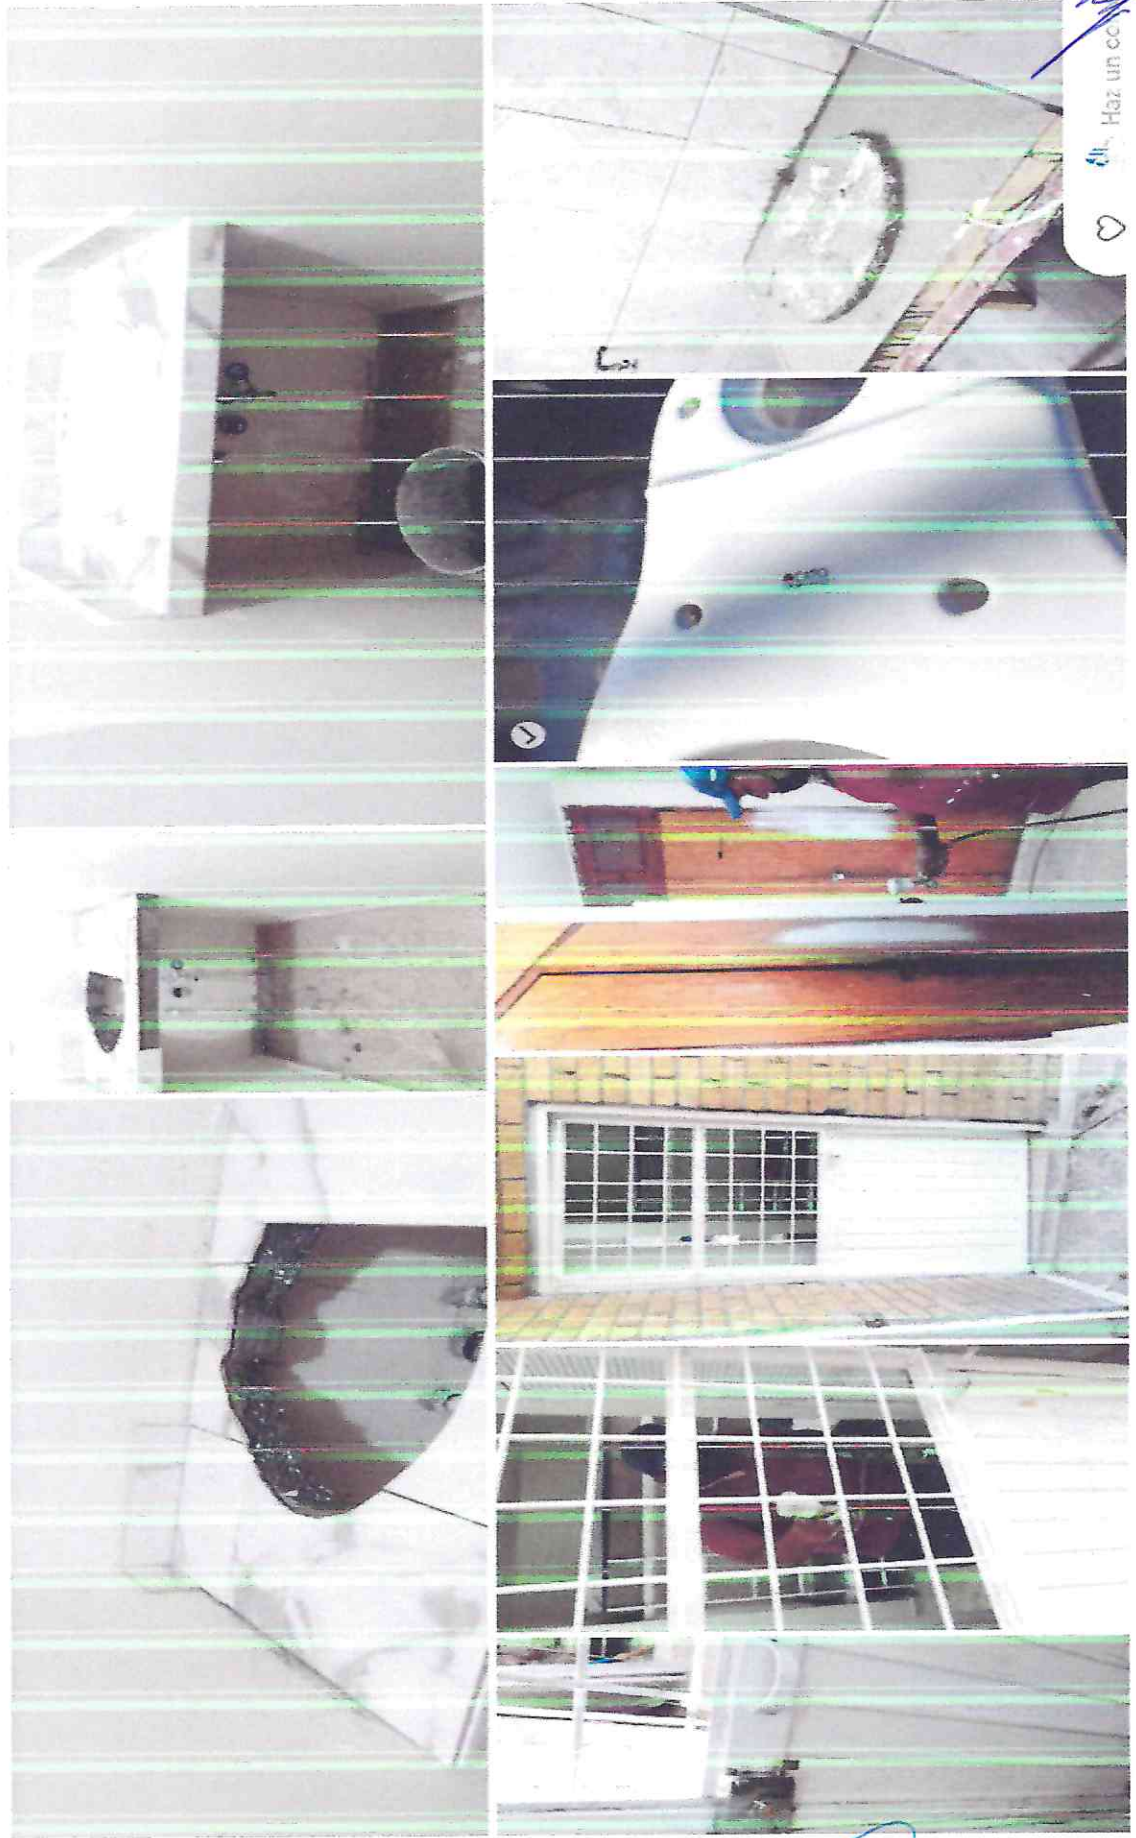


*Ramiro G. S.*

Haz un cc

*[Handwritten signature]*

ESTE REPORTE FOTOGRAFICO AMPARA EL SERVICIO DE REMODELACION  
Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS DE DORMITORIOS MODULOS

DURANTE EL MTTO

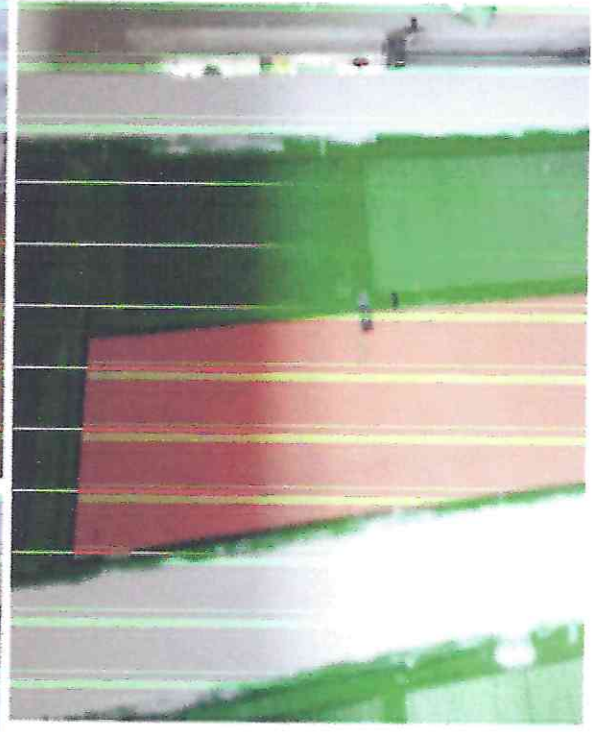


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ESTE REPORTE FOTOGRAFICO AMPARA EL SERVICIO DE REMODELACION  
Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS DE DORMITORIOS MODULOS

FIN DEL MITTO

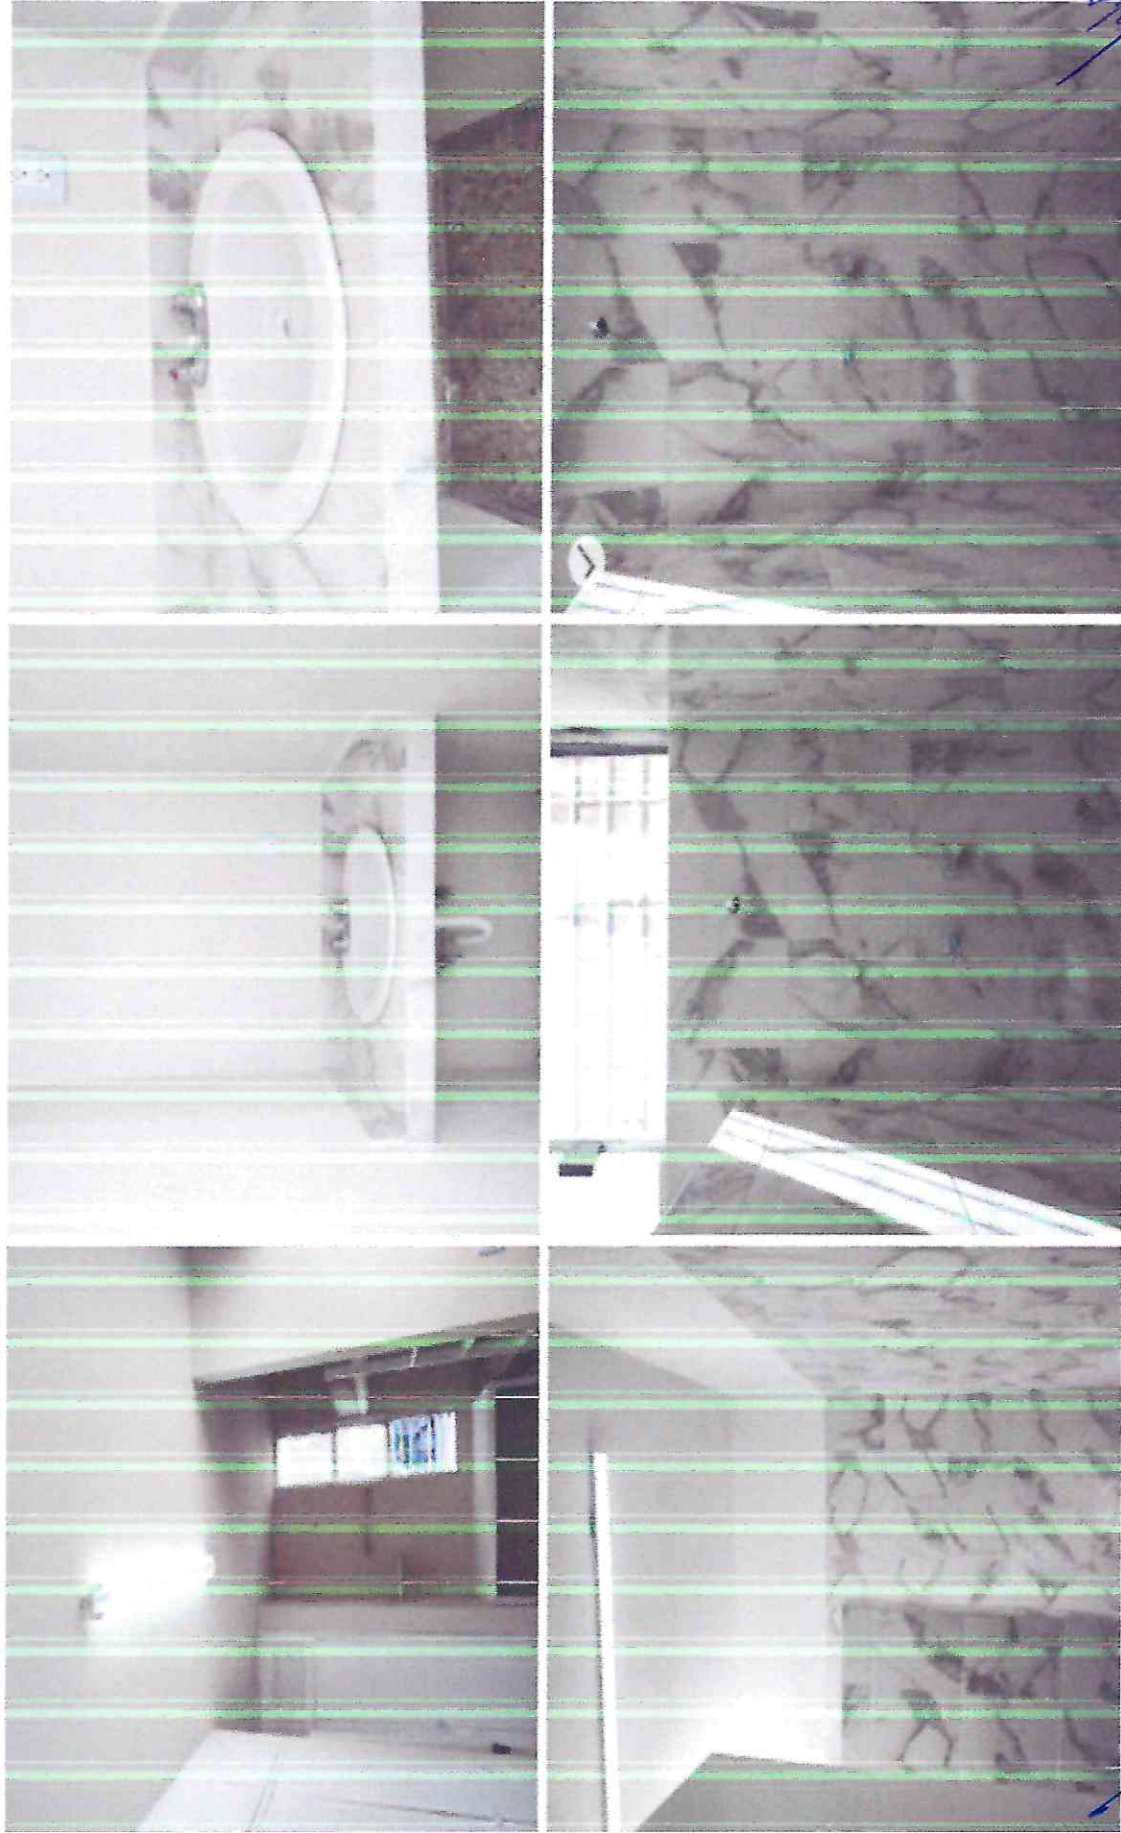

Ramirez


Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ESTE REPORTE FOTOGRAFICO AMPARA EL SERVICIO DE REMODELACION  
Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS DE DORMITORIOS MODULOS

FIN DEL MTTO

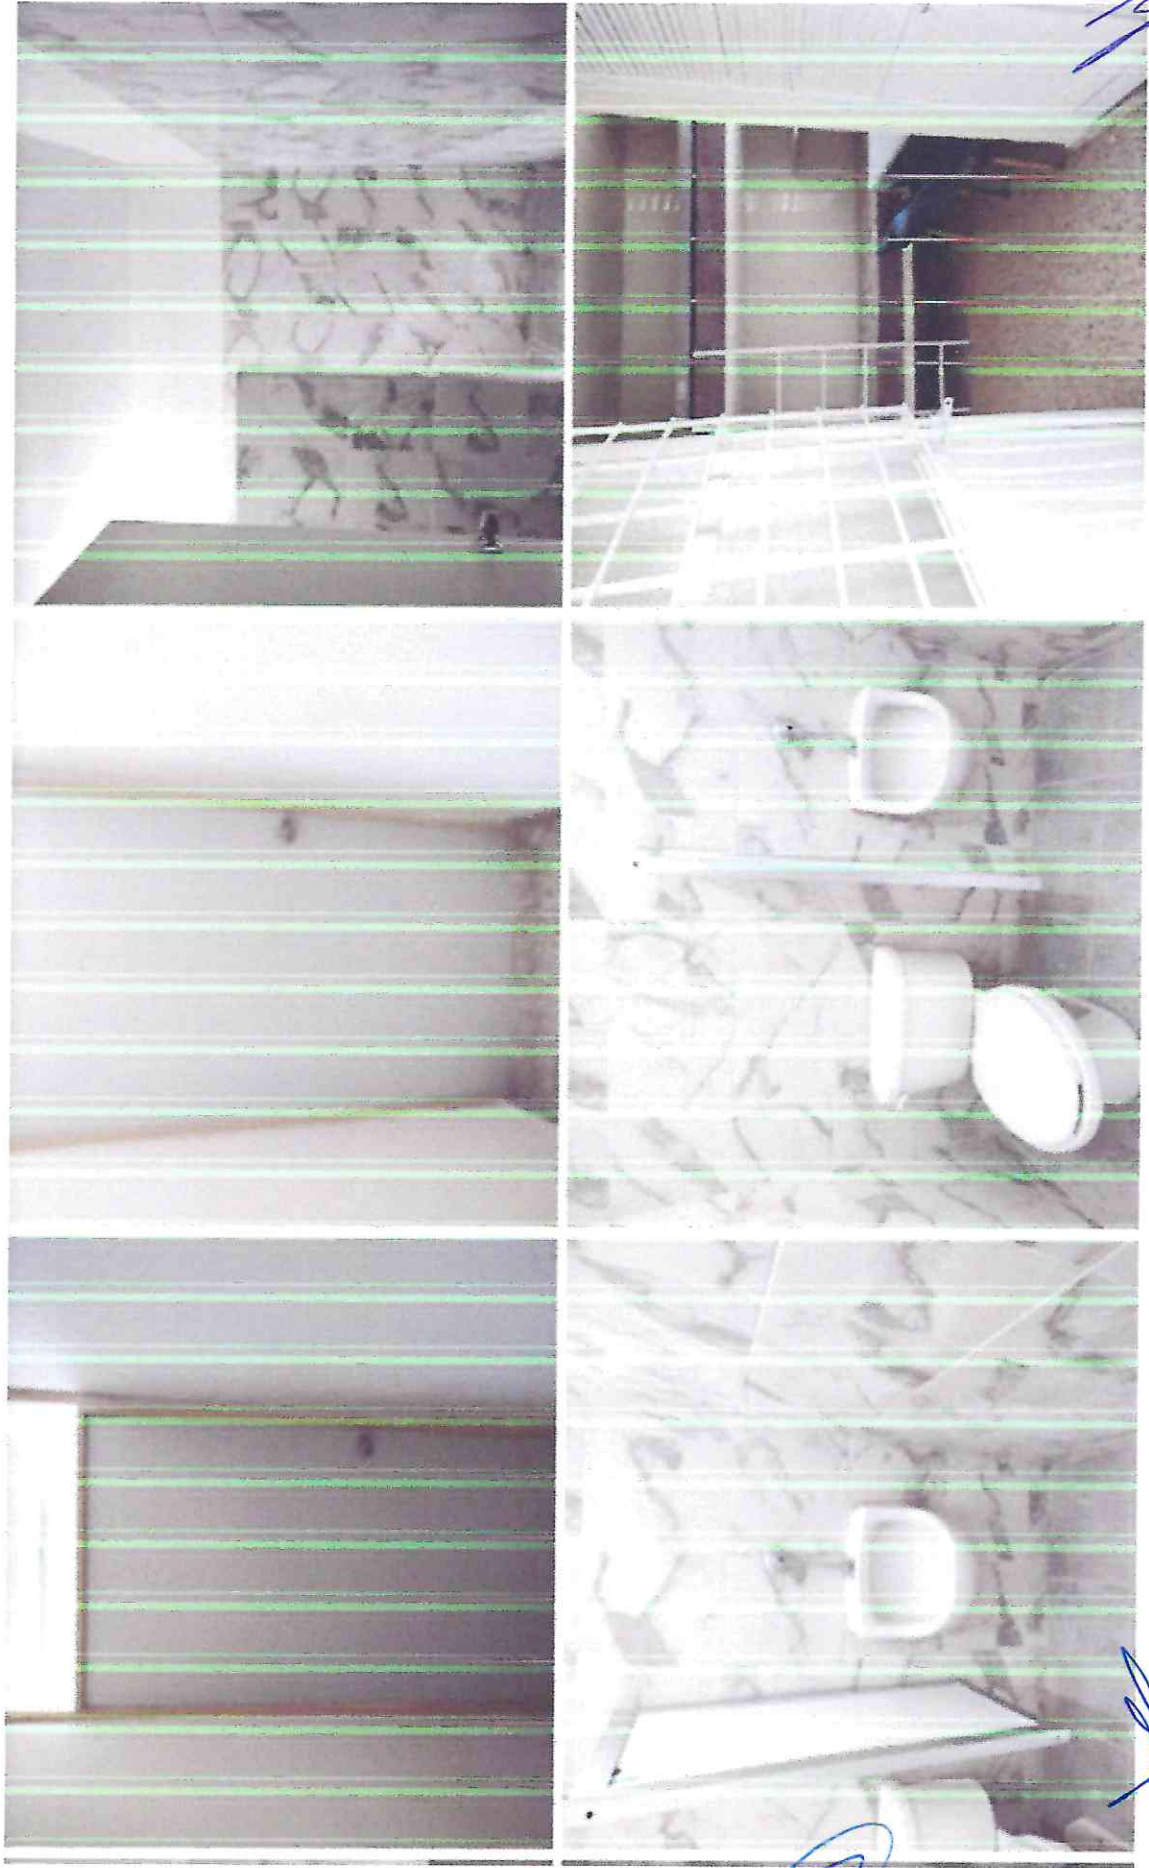

Ramirez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTE REPORTE FOTOGRAFICO AMPARA EL SERVICIO DE REMODELACION  
Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS DE DORMITORIOS MODULOS

FIN DEL MITTO



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*



ESTE REPORTE FOTOGRAFICO AMPARA EL SERVICIO DE REMODELACION  
Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS DE DORMITORIOS MODULOS

FIN DEL MITTO

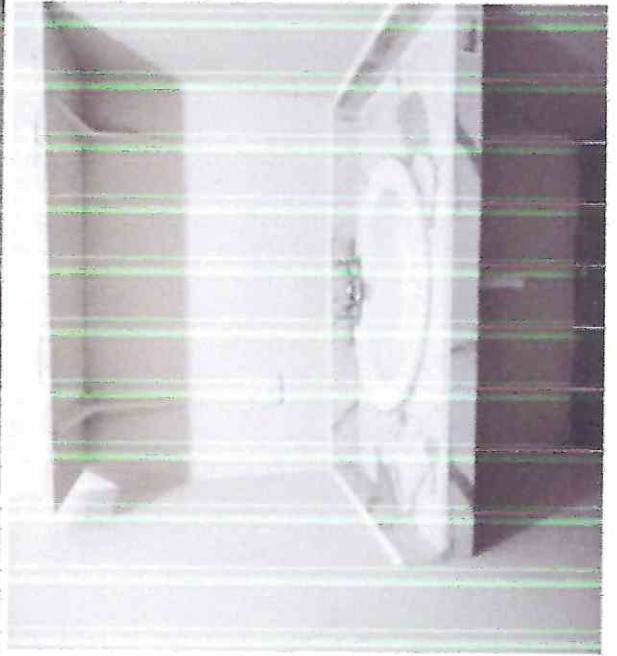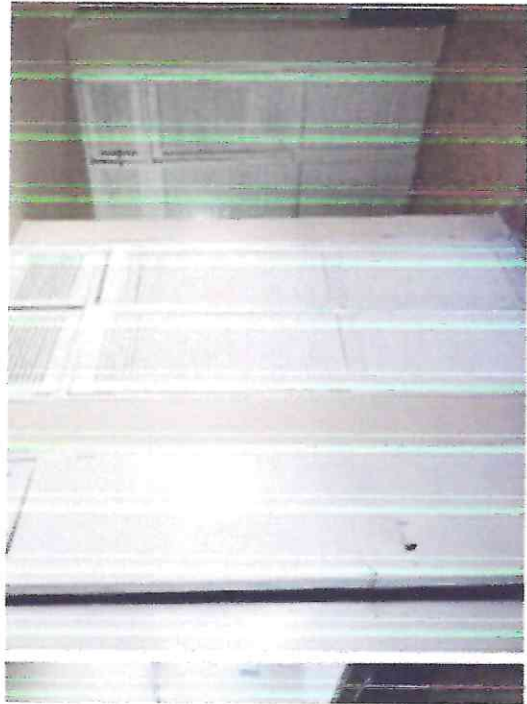

*Ramirez*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ESTE REPORTE FOTOGRAFICO AMPARA EL SERVICIO DE REMODELACION  
Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS DE DORMITORIOS MODULOS

FIN DEL MTTTO

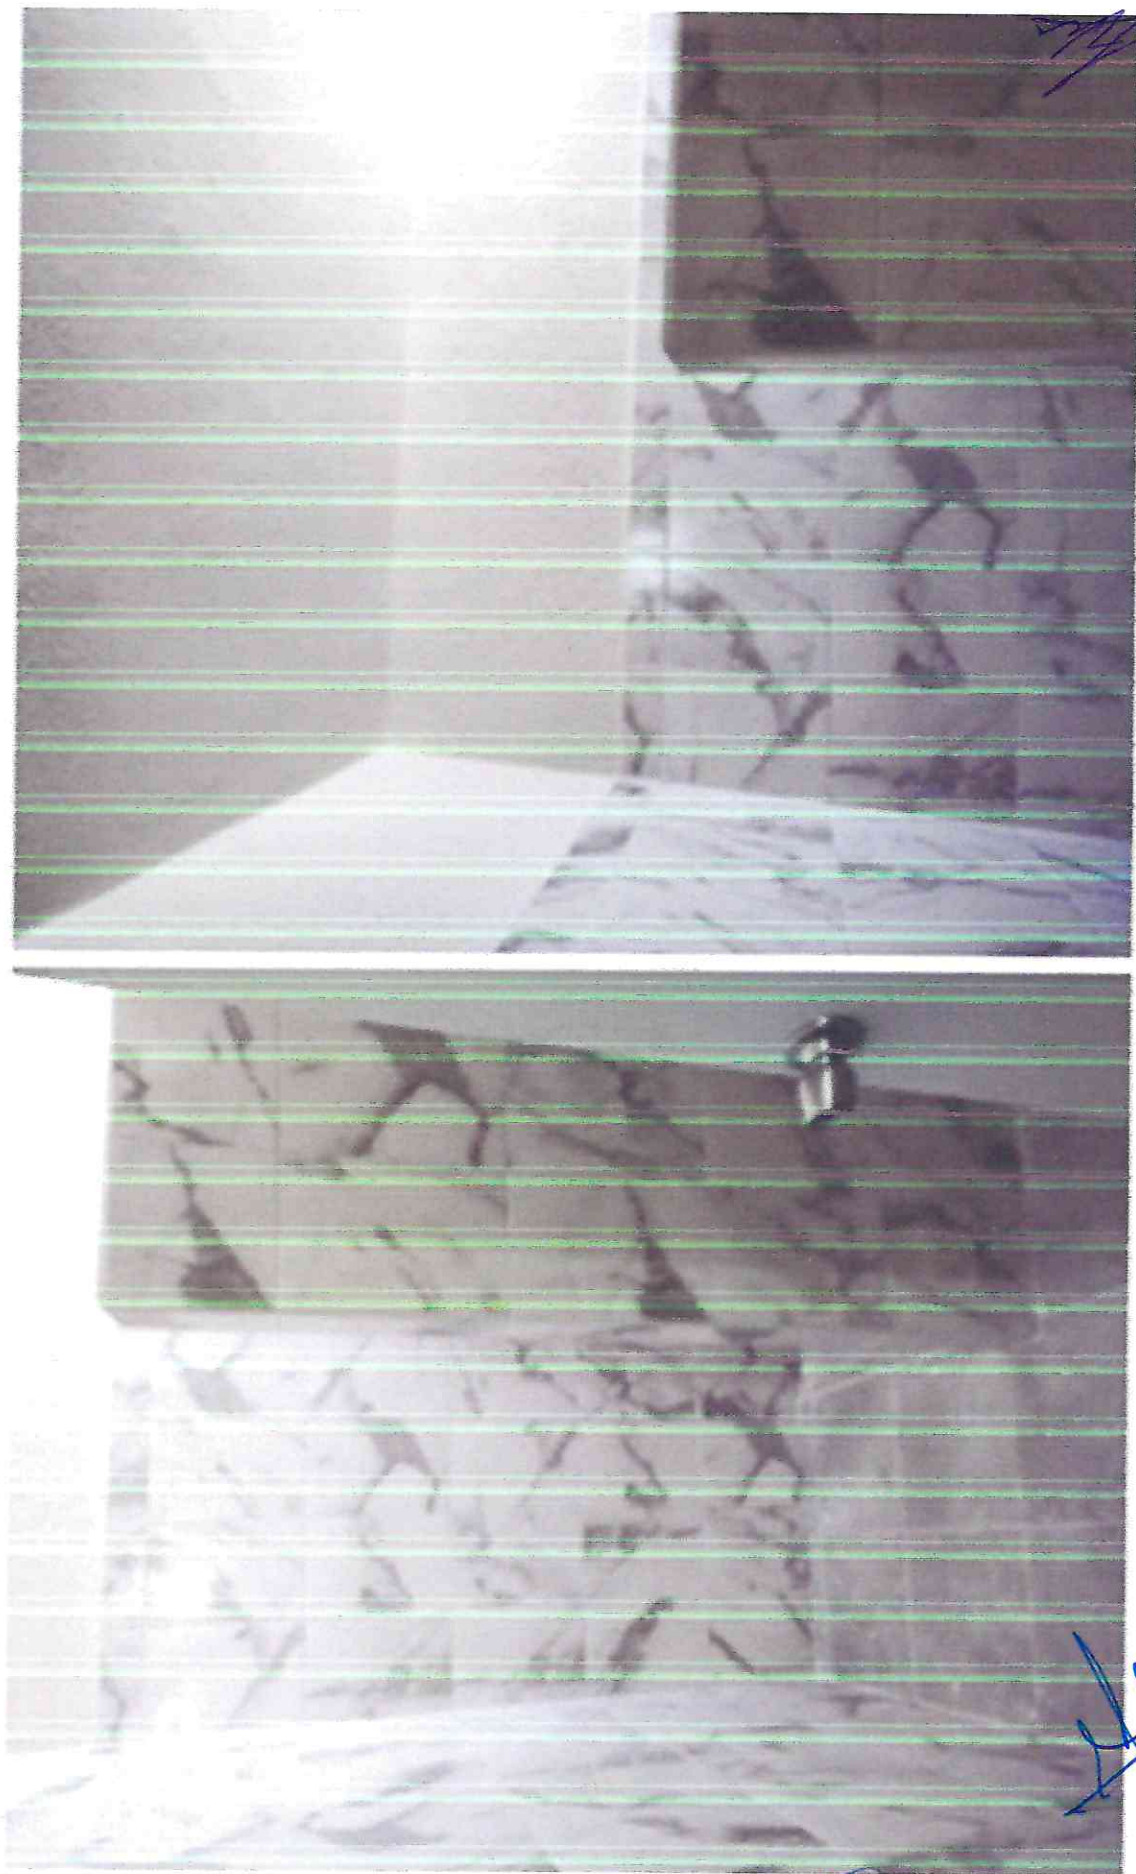


*Handwritten signature*

ESTE REPORTE FOTOGRAFICO AMPARA EL SERVICIO DE REMODELACION  
Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS DE DORMITORIOS MODULOS

FIN DEL MTTTO



*Ruiz*

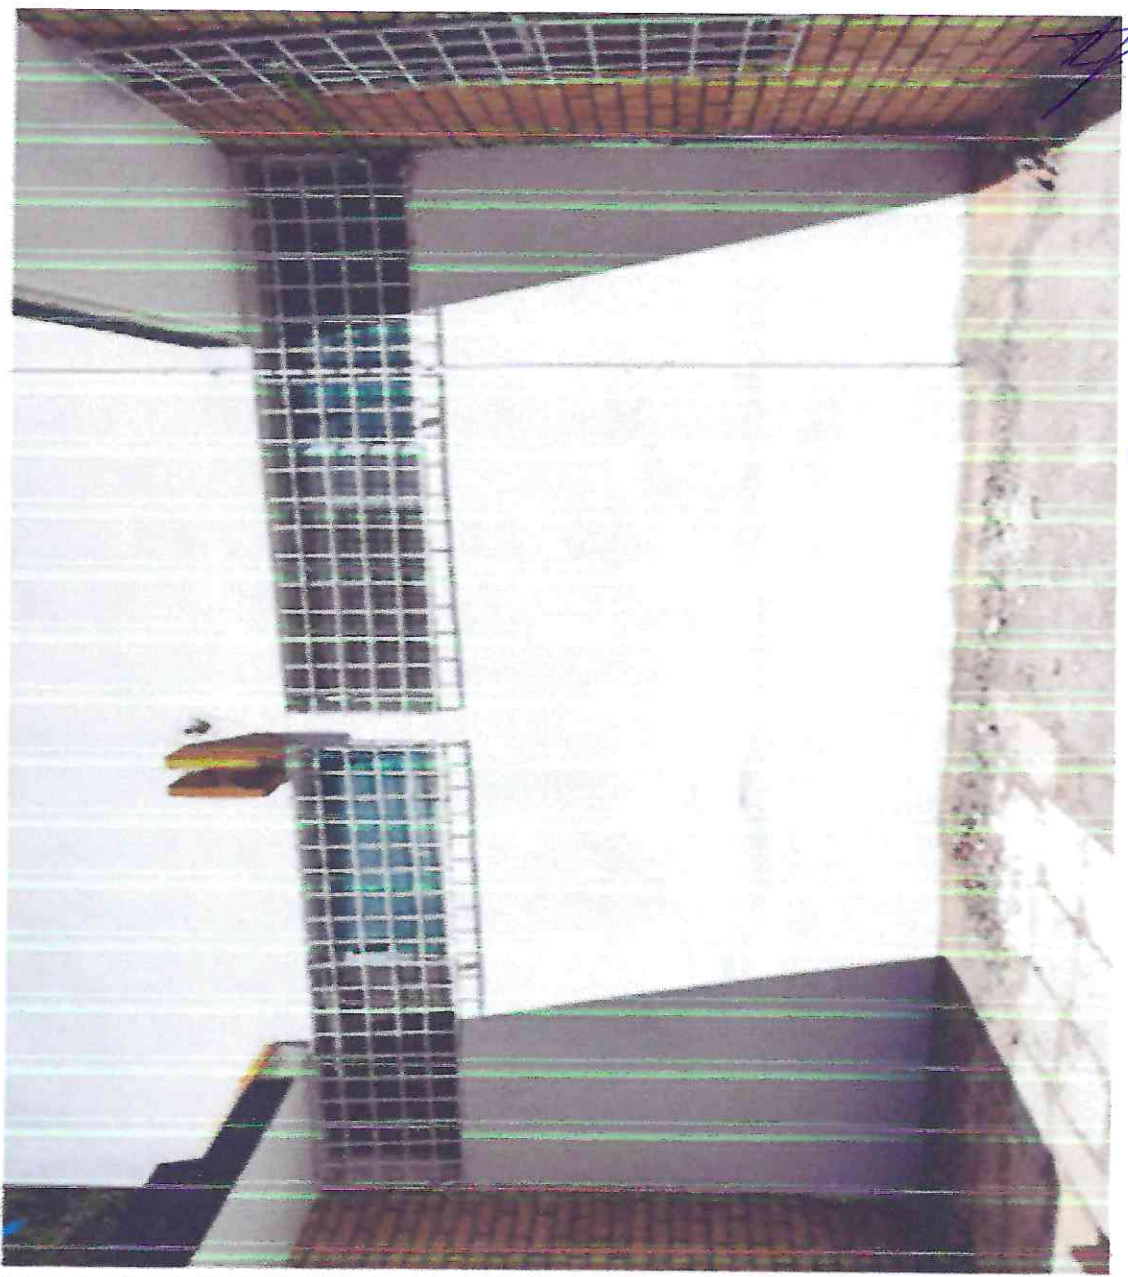

*[Signature]*

*[Signature]*

**Bitácora de REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS  
DORMITORIO MODULO 01  
CONTRATO 007/22 AD MTTO**

**Contratista:** Claudia Verónica Durán Arellano

**Encargado de la supervisión:** Ing. Jessica Anyeli Navarro Perez

**Fecha de inicio** 28 de febrero de 2022

**Fecha de fin** 29 de marzo de 2022

**28 de febrero de 2022**

Hora de llegada 8:00 A.M.

El día de hoy dimos inicio a la obra que se nos asignó, comenzamos con la demolición del vitromuro existente que se encontraba en el baño número 1 de 4 del departamento de módulos.

El Ing. Jessica Anyeli Navarro Perez llegó para supervisar el trabajo.

Nos retiramos dejando todo en orden y bien cerrado el departamento

Hora de salida: 6:00 P.M.

**1 de Marzo del 2022**

Hora de llegada 8:00 A.M.

En este día se continuó con la demolición del vitromuro del baño 1, al mismo tiempo se retiró todo el vitromuro demolido para evitar acumulaciones dejándolo fuera del área de trabajo.

El Ing. Jessica Anyeli Navarro Perez llegó para supervisar el trabajo.

Nos retiramos dejando todo en orden y bien cerrado el departamento

Hora de salida: 6:00 P.M.

**2 de Marzo del 2022**

Hora de llegada 8:00 A.M.

El día de hoy se continuó demoliendo el vitromuro del baño 1, se retiraron los sanitarios, regaderas y su respectivo esqueleto (cobre), lavabo y pedestal.

Ing.  Jessica Anyeli Navarro Perez

Contratista: Claudia Verónica Duran Arellano 

El Ing. Jessica Anyeli Navarro Perez llegó para supervisar el trabajo.

Nos retiramos dejando todo en orden y bien cerrado el departamento

Hora de salida: 6:00 P.M.

### **3 de Marzo del 2022**

Hora de llegada 8:00 A.M.

Ya finalizado el trabajo de demoler vitromuro se comenzó a picar la pared para así recibir de manera correcta el nuevo vitromuro, al igual se comenzó con el armado y conectado del nuevo esqueleto de alimentación de agua fría y caliente en regaderas.

El Ing. Jessica Anyeli Navarro Perez llegó para supervisar el trabajo.

Nos retiramos dejando todo en orden y bien cerrado el departamento

Hora de salida: 6:00 P.M.

### **4 de Marzo del 2022**

Hora de llegada 8:00 A.M.

El día de hoy se continuó con el picado de pared, y se comienza el armado de la estructura para la barra que sostendrá el lavabo, se realiza poco más tarde el vaciado del mismo.

El Ing. Jessica Anyeli Navarro Perez llegó para supervisar el trabajo.

Nos retiramos dejando todo en orden y bien cerrado el departamento

Hora de salida: 6:00 P.M.

### **5 de Marzo del 2022**


Hora de llegada 8:00 A.M.

El día de hoy se finaliza el trabajo de picado de pared, nos llegó el nuevo lote de vitromuro el cual se comienza a instalar en el baño y barra de lavabo número 1 de 4 en el área de módulos.

El Ing. Jessica Anyeli Navarro Perez llegó para supervisar el trabajo.

Ing. Jessica Anyeli Navarro Perez

Contratista: Claudia Verónica Duran Arellano



Nos retiramos dejando todo en orden y bien cerrado el departamento

Hora de salida: 2:00 P.M.

**7 de Marzo del 2022**

Hora de llegada 8:00 A.M.

El día de hoy se finaliza con la instalación del nuevo vitromuro. Se continua con la instalación de sanitarios, lavabos, coladeras de desagüe y rosetas de regaderas. Se comienza con la aplicación de texturizado grano medio dentro del módulo 1 de 4.

El Ing. Jessica Anyeli Navarro Perez llegó para supervisar el trabajo.

Nos retiramos dejando todo en orden y bien cerrado el departamento.

Hora de salida: 6:00 P.M.

**8 de Marzo del 2022**

Hora de llegada 8:00 A.M.

El día de hoy se realiza trabajo de pintura a estructuras metálicas (bases, escaleras, puertas y mesa) al igual que se restauran las puertas de los closets que se encontraban dentro de los dormitorios. También se realizó el cambio de vidrios que se encontraban en mal estado en la puerta principal del módulo 1 de 4 y la limpieza del departamento.

El Ing. Jessica Anyeli Navarro Perez llegó para supervisar el trabajo.

Nos retiramos dejando todo en orden y bien cerrado el departamento.

Hora de salida: 6:00 P.M.

**9 de Marzo del 2022**

Hora de llegada 8:00 A.M.

El día de hoy se comenzó con la demolición del vitromuro existente que se encontraba en el baño número 2 de 4 del departamento de módulos.

El Ing. Jessica Anyeli Navarro Perez llegó para supervisar el trabajo.

Ing. Jessica Anyeli Navarro Perez

Contratista: Claudia Verónica Duran Arellano

Nos retiramos dejando todo en orden y bien cerrado el departamento.

Hora de salida: 6:00 P.M.

**10 de Marzo del 2022**

Hora de llegada 8:00 A.M.

El día de hoy se finalizó con la demolición del vitromuro del baño 2, al mismo tiempo se retiró todo el vitromuro demolido para evitar acumulaciones dejándolo afuera del área de trabajo.

El Ing. Jessica Anyeli Navarro Perez llegó para supervisar el trabajo.

Nos retiramos dejando todo en orden y bien cerrado el departamento.

Hora de salida: 6:00 P.M.

**11 de Marzo del 2022**

Hora de llegada 8:00 A.M.

Hoy se retiraron los sanitarios, regaderas y su respectivo esqueleto (cobre), lavabo y pedestal, dejando todo preparado para recibir su nueva instalación.

El Ing. Jessica Anyeli Navarro Perez llegó para supervisar el trabajo.

Nos retiramos dejando todo en orden y bien cerrado el departamento

Hora de salida: 6:00 P.M.

**12 de Marzo del 2022**

Hora de llegada 8:00 A.M.

Se comenzó picar la pared para poder recibir de manera correcta el nuevo vitromuro, al igual se comenzó con el armado y conectado del nuevo esqueleto de alimentación de agua fría y caliente en regaderas.

El Ing. Jessica Anyeli Navarro Perez llegó para supervisar el trabajo.

Nos retiramos dejando todo en orden y bien cerrado el departamento.

Hora de salida: 2:00 P.M.

Ing. Jessica Anyeli Navarro Perez

Contratista: Claudia Verónica Duran Arellano

**14 de Marzo del 2022**

Hora de llegada 8:00 A.M.

El día de hoy se finaliza con el picado de pared, y se comienza el armado de la estructura para la barra que sostendrá el lavabo, se realiza poco más tarde el vaciado del mismo.

El Ing. Jessica Anyeli Navarro Perez llegó para supervisar el trabajo.

Nos retiramos dejando todo en orden y bien cerrado el departamento.

Hora de salida: 6:00 P.M.

**15 de Marzo del 2022**

Hora de llegada 8:00 A.M.

El día de hoy nos llegó otro lote de vitromuro el cual se comienza a instalar en el baño y barra de lavabo número 2 de 4 en el área de módulos.

El Ing. Jessica Anyeli Navarro Perez llegó para supervisar el trabajo.

Nos retiramos dejando todo en orden y bien cerrado el departamento.

Hora de salida: 6:00 P.M.



**16 de Marzo del 2022**

Hora de llegada 8:00 A.M.

El día de hoy se finaliza con la instalación del nuevo vitromuro. Se continua con la instalación sanitarios, lavabos, coladeras de desagüe y rosetas de regaderas. Se comienza con la aplicación de texturizado grano medio dentro del módulo 1 de 4.

El Ing. Jessica Anyeli Navarro Perez llegó para supervisar el trabajo.

Nos retiramos dejando todo en orden y bien cerrado el departamento.


Hora de salida: 6:00 P.M.

**17 de Marzo del 2022**

Hora de llegada 8:00 A.M.

Ing. Jessica Anyeli Navarro Perez

Contratista: Claudia Verónica Duran Arellano





El día de hoy se realiza trabajo de pintura a estructuras metálicas (bases, escaleras, puertas y mesa) al igual que se restauran las puertas de los closets que se encontraban dentro de los dormitorios. También se realizó el cambio de vidrios que se encontraban en mal estado en la puerta principal del módulo 1 de 4 y la limpieza del departamento.

El Ing. Jessica Anyeli Navarro Perez llegó para supervisar el trabajo.

Nos retiramos dejando todo en orden y bien cerrado el departamento.

Hora de salida: 6:00 P.M.

**18 de Marzo del 2022**

Hora de llegada 8:00 A.M.

El día de hoy se dio inicio a la demolición del vitromuro existente de baño 3 y 4 del departamento de módulos.

El Ing. Jessica Anyeli Navarro Perez llegó para supervisar el trabajo.

Nos retiramos dejando todo en orden y bien cerrado el departamento

Hora de salida: 6:00 P.M.

**19 de Marzo del 2022**

Hora de llegada 8:00 A.M.

El día de hoy se continuó con la demolición del vitromuro existente de baño 3 y 4.

El Ing. Jessica Anyeli Navarro Perez llegó para supervisar el trabajo.

Nos retiramos dejando todo en orden y bien cerrado el departamento.

Hora de salida: 2:00 P.M.

**19 de Marzo del 2022**

Hora de llegada 8:00 A.M.

El día de hoy se dio por terminada con la demolición del vitromuro existente de baño 3 y 4. se retiraron los sanitarios, regaderas y su respectivo esqueleto (cobre), lavabo y pedestal.

Ing. Jessica Anyeli Navarro Perez

Contratista: Claudia Verónica Duran Arellano

En este día se realizó el cambio de vidrios que se encontraban en mal estado en la puerta principal del módulo 3 y 4. Se reviso minuciosamente que todo esté totalmente listo , siendo así se realiza la limpieza del departamento.

El Ing. Jessica Anyeli Navarro Perez llegó para supervisar el trabajo.

Nos retiramos dejando todo en orden y bien cerrado el departamento.

Hora de salida: 6:00 P.M.



Ing. Jessica Anyeli Navarro Perez



Contratista: Claudia Verónica Duran Arellano



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**  
**ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO**

Datos Generales de la Obra





NUMERO CONTRATO	07/22/AD/MTTO.	FECHA INICIO PROGRAMADA	28/02/2022
NUMERO CONVENIO		FECHA TERMINO PROGRAMADA	29/03/2022
DESCRIPCION	REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DORMITORIOS-MODULO 01	FECHA INICIO REAL	
CONTRATISTA	C. CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO	FECHA TERMINO REAL	
MONTO DEL CONTRATO	\$383,820.80	FECHA DEL CONVENIO	
MONTO DEL CONVENIO			
ESTIMACIONES:			
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.
	\$383,820.80		\$383,820.80
			DEL 28 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DEL 2022
SUMATORIA	\$383,820.80		\$383,820.80
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES			
FIRMA DEL USUARIO: ING. CARLOS ROJAS PEÑA.-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES.			
SUPERVISOR	JEFE DEL DEPTO. DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	CONTRATISTA
ING. JESSICA ANYELI NAVARRO PEREZ.	ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA	ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ	C. CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

## ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra

NUMERO CONTRATO	07/22/AD/MTTO.	FECHA INICIO PROGRAMADA	28/02/2022
NUMERO CONVENIO		FECHA TERMINO PROGRAMADA	29/03/2022
DESCRIPCION	REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DORMITORIOS-MODULO 01		
CONTRATISTA	C. CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO		
MONTO DEL CONTRATO	\$383,820.80	FECHA INICIO REAL	
MONTO DEL CONVENIO		FECHA TERMINO REAL	
ESTIMACIONES:			
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA. PERIODO DE EJECUCION
	\$383,820.80		\$383,820.80 DEL 28 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DEL 2022
SUMATORIA	\$383,820.80		\$383,820.80
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES			
FIRMA DEL USUARIO: ING. CARLOS ROJAS PEÑA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES.			
SUPERVISOR	JEFE DEL DEPTO. DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	CONTRATISTA
 ING. JESSICA ANYELI NAVARRO PEREZ.	 ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA	 ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ	 C. CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

## ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra

NUMERO CONTRATO	07/22/AD/MTTO.			FECHA INICIO PROGRAMADA	28/02/2022
NUMERO CONVENIO				FECHA TERMINO PROGRAMADA	29/03/2022
DESCRIPCION	REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DORMITORIOS-MODULO 01			FECHA INICIO REAL	
CONTRATISTA	C. CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO			FECHA TERMINO REAL	
MONTO DEL CONTRATO		\$383,820.80		FECHA DEL CONVENIO	
ESTIMACIONES:					
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.	PERIODO DE EJECUCION	
	\$383,820.80		\$383,820.80	DEL 28 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DEL 2022	
SUMATORIA	\$383,820.80		\$383,820.80		

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

**OBSERVACIONES**

FIRMA DEL USUARIO: ING. CARLOS ROJAS PEÑA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES.

SUPERVISOR	JEFE DEL DEPTO. DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	CONTRATISTA
ING. JESSICA ANYELI NAVARRO PEREZ.	ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA	ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ	C. CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

## ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra

NUMERO CONTRATO	07/22/AD/MTTO.			FECHA INICIO PROGRAMADA	28/02/2022
NUMERO CONVENIO				FECHA TERMINO PROGRAMADA	29/03/2022
DESCRIPCION	REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DORMITORIOS-MODULO 01			FECHA INICIO REAL	
CONTRATISTA	C. CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO			FECHA TERMINO REAL	
MONTO DEL CONTRATO	\$383,820.80			FECHA DEL CONVENIO	
MONTO DEL CONVENIO					
ESTIMACIONES:					
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.	PERIODO DE EJECUCION	
	\$383,820.80		\$383,820.80	DEL 28 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DEL 2022	
SUMATORIA	\$383,820.80		\$383,820.80		
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES					
FIRMA DEL USUARIO: ING. CARLOS ROJAS PEÑA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES.					
SUPERVISOR	JEFE DEL DEPTO. DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	CONTRATISTA		
ING. JESSICA ANYELI NAVARRO PEREZ.	ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA	ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ	C. CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO		



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

## NOTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales de la Obra

NUMERO CONTRATO	07/22/AD/MTTO.			FECHA INICIO PROGRAMADA	28/02/2022
NUMERO CONVENIO				FECHA TERMINO PROGRAMADA	29/03/2022
DESCRIPCION	REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DORMITORIOS-MODULO 01				
CONTRATISTA	C. CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO				
MONTO DEL CONTRATO	\$383,820.80			FECHA INICIO REAL	
MONTO DEL CONVENIO				FECHA TERMINO REAL	
ESTIMACIONES:					
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.	PERIODO DE EJECUCION	
	\$383,820.80		\$383,820.80	DEL 28 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DEL 2022	
SUMATORIA	\$383,820.80		\$383,820.80		
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES					
FIRMA DEL USUARIO: ING. CARLOS ROJAS PEÑA - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES.					
SUPERVISOR	JEFE DEL DEPTO. DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES		CONTRATISTA	
ING. JESSICA ANYELI NAVARRO PEREZ.	ING. GUSTAVO ALFONSO BURCIAGA VERA	ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ		C. CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO	



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas  
Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



**CONTRATO DE OBRA Y MANTENIMIENTO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, A LA QUE EN LO SUCESIVO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "LA UNIVERSIDAD", REPRESENTADA POR EL MC. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y APODERADO LEGAL DE LA UNIVERSIDAD PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y POR LA OTRA LA C. CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO, POR SUS PROPIOS DERECHOS, A QUIEN SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:**


## DECLARACIONES

**PRIMERA. -" LA UNIVERSIDAD " DECLARA:**

### I. DECLARA "LA UNIVERSIDAD"

1. Que de conformidad con el artículo 1º. de la Ley Orgánica publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 26 de Abril de 2006, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que basada en el principio de su autonomía tiene como objetivos fundamentales: I. Impartir educación superior en el campo de las ciencias agrarias y sus afines para formar profesionistas con juicio crítico, humanista, democrático y nacionalista, capaces de contribuir a la solución de los problemas en el medio rural. II. Realizar investigación en las áreas científicas de su competencia que favorezcan al desarrollo social y económico, integral, armónico e independiente tanto de la república y sus regiones como del estado, y III. Preservar, promover y acrecentar la cultura, la ciencia y la tecnología, en un proceso de intercambio sistemático con la sociedad, para contribuir al desarrollo rural de manera integral.
2. Que en su representación comparece el M.C. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ, en su carácter de DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO y apoderado general para actos de administración, quien acredita su personalidad mediante el poder general para actos de administración y para la suscripción de títulos de crédito que le fue otorgado por el DR. MARIO ERNESTO VAZQUEZ BADILLO, en su carácter de Rector de "LA UNIVERSIDAD", mediante instrumento público número (64) sesenta y cuatro, siendo las (09:00) nueve horas de fecha martes (25) veinticinco de Agosto de (2020) dos mil veinte, otorgado ante la fe del notario público número (127) ciento veintisiete, Lic. Demián Enrique Maldonado Pámanes.
3. Que la Universidad requiere la realización de la obra **REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS-DORMITORIO-MODULO 01.**
4. Que la Universidad cuenta con la suficiencia presupuestal, para cubrir la realización de la obra **REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS-DORMITORIO-MODULO 01**, en los términos que se precisan en el anexo I del presente contrato.
5. Que la celebración del presente contrato se realizó por el Procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamento en lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, adjudicándose a "EL CONTRATISTA", el contrato relativo a la realización de





# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas  
Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



la obra REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS-DORMITORIO-MODULO 01. Que se precisan en el anexo I del presente contrato.

6. Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el número UAA-750303-NHA.
7. Que tiene establecido su domicilio en el edificio de "La Dirección General Administrativa" ubicado en la Calzada Antonio Narro número 1923, colonia Buenavista, en Saltillo, Coahuila, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

## SEGUNDA. - "EL CONTRATISTA" DECLARA:

1. Que es una Persona Física con actividad empresarial, según su alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
2. Que tiene la capacidad jurídica para celebrar el presente contrato con "LA UNIVERSIDAD", y para ello cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para cumplir con su objeto.
3. Que es una persona física que se encuentra en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con el número DUAC790607IK3.
4. Que declara bajo protesta de decir verdad que formaliza este contrato con la seguridad que ninguno de los dueños o directivos de "EL PROVEEDOR", se encuentra desempeñando un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, o están inhabilitados para desempeñarlos y por consecuencia declara con la misma formalidad, que no tiene parentesco con los Servidores Públicos que decidieron directamente sobre la adjudicación de este contrato, no existiendo ningún impedimento de tipo legal para formalizarlo.
5. Que conoce debidamente el sitio en donde se realizará el **SUMINISTRO DE LOS BIENES** objeto de este contrato, por lo que considera todos los factores que intervienen para su ejecución.
6. Que, para los fines y efectos legales del presente contrato, señala como su domicilio: Corona #1229, del Estado en Saltillo, Coah., C.P. 25000, correo electrónico mse.saltillo@gmail.com, tel. (844) 1747018.
7. Que de acuerdo con el Decreto de reformas por el que se modifican diversas Leyes Fiscales y otros ordenamientos federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1998, manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de conformidad con las disposiciones tributarias vigentes.

## III.- DE AMBAS PARTES

1. Que se reconocen la personalidad con la que acuden a la firma del presente instrumento.
2. Que cuenta con la capacidad técnica, económica y moral para dar cumplimiento al objeto de este contrato.
3. Que este contrato se celebra en función del Procedimiento de Adjudicación Directa del contrato número 007/22 AD. MTTO.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas  
Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



## CLAUSULAS

### PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. -

1. "LA UNIVERSIDAD" Encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de una obra consistente en REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS-DORMITORIO-MODULO 01, y este se obliga a realizarla hasta su total terminación acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos de este contrato, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas cláusulas. En caso de que "EL CONTRATISTA" construya por su propia decisión una obra que no esté especificada en el contrato lo hará bajo su propia cuenta y riesgo, siendo además responsable, en tal supuesto, de los daños y perjuicios que cause "LA UNIVERSIDAD" o a terceros.
2. Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante del presente contrato.
3. Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante del presente contrato.
4. Queda entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos, materia de este contrato, formarán parte del mismo y su uso será obligatorio.
5. Lo anterior en base a la propuesta presentada en el procedimiento citado.

**SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. -** El monto total del presente contrato es de: \$330,880.00 (Trescientos treinta mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) antes de I.V.A. más la cantidad de \$52,940.80 (Cincuenta y dos mil novecientos cuarenta pesos 80/100 M.N.) sumando un monto total \$383,820.80 (Trescientos ochenta y tres mil ochocientos veinte pesos 80/100 M.N.) IVA incluido.

**TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. -** "EL CONTRATISTA" Se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el día 28 de febrero de 2022 y a terminar a más tardar el día 29 de marzo de 2022, de conformidad con el programa por concepto y con erogaciones mensuales de la obra que se anexa al presente contrato.

1. El plazo pactado para la ejecución de la obra solo podrá ser prorrogado por decisión de "LA UNIVERSIDAD". Si en el desarrollo de los trabajos se presentaran circunstancias por las cuales " LA UNIVERSIDAD" estimará necesario modificar el programa a que se refiere esta cláusula, o bien en el caso de que "EL CONTRATISTA" se viere obligado a solicitar variación a dicho programa por causas no imputables a él, debidamente justificadas y dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, después de que hubiere(n) ocurrido la(s) causa(s) que apoyen su solicitud, "LA UNIVERSIDAD" establecerá la reforma que juzgue pertinente y hará del conocimiento de "EL CONTRATISTA" las modificaciones que apruebe, y este último a su vez, quedará obligado a aceptarla. Estas modificaciones, o en su caso el



## Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas  
Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



nuevo programa que se formulare, se consideraran incorporados a este contrato y, por lo tanto, obligatorio para las partes.




**CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - " LA UNIVERSIDAD "** Se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, debiendo "EL CONTRATISTA" prever y obtener los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización.


**QUINTA. - ANTICIPOS. -** Para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato "LA UNIVERSIDAD " 40% DE ANTICIPO.

1. En los casos de rescisión de contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a "LA UNIVERSIDAD" en un plazo no mayor de veinte días naturales contados a partir de la fecha en que sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA".
2. "EL CONTRATISTA" que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, cubrirá los cargos que resulten conforme a una tasa que será igual a la establecida en las leyes fiscales del estado de Coahuila de Zaragoza en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales.
3. Igual procedimiento se utilizará para que "EL CONTRATISTA", en su caso, reintegre a "LA UNIVERSIDAD" las cantidades que, en cualquier forma, hubiere recibido en exceso para la contratación o durante la ejecución de la obra.

**SEXTA. - FORMA DE PAGO. -** "LA UNIVERSIDAD "pagará a "EL CONTRATISTA" hasta el 90% del monto del contrato, quedando el 10% restante para ser pagado mediante la presentación del acta de recepción y entrega y la estimación de finiquito correspondiente. En este contrato será el pago total en una sola exhibición, al termino del trabajo.

**SEPTIMA. - GARANTÍAS. -** Además de la garantía del anticipo mencionado en la cláusula quinta, "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir, las siguientes garantías:

1. **Fianza de Anticipo:** Consistente en el 100% del monto total del anticipo otorgado, deberá garantizarse con **CHEQUE** expedido por "EL CONTRATISTA" a favor de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Se presentará antes de la entrega del anticipo. 
2. **Fianza de Cumplimiento Del Contrato:** Consistente en el 10% del monto total del contrato antes de IVA, deberá garantizarse con **CHEQUE** expedido por "EL CONTRATISTA" a favor de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Se presentará antes del trámite de firma del contrato. No aplica, ya que se realizaron los trabajos y posteriormente se pagará el trabajo realizado. 
3. **Fianza Para Responder de Obra Mal Ejecutada o Vicios Ocultos. -** Se constituirá **CHEQUE** expedido por "EL CONTRATISTA" por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato, a favor de "LA UNIVERSIDAD" Autónoma Agraria Antonio Narro, que se presentará el día de la entrega recepción de la obra, si transcurrido este plazo no hubiere otorgado la fianza respectiva "LA UNIVERSIDAD" podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. La fianza garantizará defectos de calidad o de construcción, vicios ocultos, daños y perjuicios que, por inobservancia o negligencia del contratista, se lleguen a causar a terceros, así como el pago de 



## Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas

Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



adeudos contraídos por “EL CONTRATISTA” con “LA UNIVERSIDAD”, durante la ejecución de la obra durante dieciocho meses posteriores a la terminación de la misma. Esta garantía subsistirá durante la ejecución de los trabajos y hasta por dieciocho meses contados a partir de la fecha de terminación de los trabajos, al término de dicho plazo la institución afianzadora procederá a su cancelación previa manifestación expresa y por escrito de “LA UNIVERSIDAD”.

4. En caso de que sean autorizados trabajos adicionales y se amplió el monto del presente contrato mediante uno o más convenios adicionales, deberá presentarse un cheque de cumplimiento y para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos, en los términos que el convenio o solicita.

### OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS. -

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados.

### NOVENA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. -

1. “EL CONTRATISTA”, Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la terminación de los trabajos, lo comunicará por escrito a “LA UNIVERSIDAD” quien, realizará la recepción de los mismos ya sea total o parcial, conforme a los lineamientos o requisitos que para tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las modalidades que la misma prevé dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la verificación que esta haga de que están debidamente concluidos, reservándose “LA UNIVERSIDAD” el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. “LA UNIVERSIDAD” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. Reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.
2. Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán dentro de los 60 días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir acuerdo o en caso de que “EL CONTRATISTA” no acuda a la elaboración de éste, “LA UNIVERSIDAD” procederá a elaborarlo, comunicando el resultado a “EL CONTRATISTA” en un plazo de 10 días naturales, contados a partir de la fecha de elaboración. “EL CONTRATISTA” tendrá un plazo de quince días para realizar reclamaciones o aclaraciones según corresponda a su derecho, en caso de que no realice ninguna reclamación y/o gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado.

**DÉCIMA. - DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA. -** “EL CONTRATISTA” se obliga a nombrar anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un responsable de obra, que tendrá las funciones y responsabilidades descritas en el artículo 220 del Reglamento de Construcciones para el Estado de Coahuila, nombramiento que deberá hacerlo saber “EL CONTRATISTA” por escrito a “LA UNIVERSIDAD”. Esta última se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

**DÉCIMO PRIMERA. - RELACIONES LABORALES. -** “EL CONTRATISTA”, en los términos de la Ley Federal del Trabajo, es una empresa establecida que contrata trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que “LA UNIVERSIDAD” no será en absoluto responsables con “EL CONTRATISTA” respecto



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas  
Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



a dichas relaciones laborales, las cuales se darán, con exclusividad, entre "EL CONTRATISTA" y sus trabajadores.

**DÉCIMO SEGUNDA. - SUPERVISIÓN DE LA OBRA. - " LA UNIVERSIDAD"**, a través de los representantes que para el efecto designe, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto del contrato, así como de inspeccionar los materiales que vayan a usarse en la ejecución de la misma.

**DECIMO TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. -**

1. "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de "LA UNIVERSIDAD", así como, a responder por su cuenta y riesgo de los desperfectos, falta de calidad en los materiales, defectos o vicios ocultos, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA UNIVERSIDAD" o a terceros durante la ejecución de la obra y dentro del término de doce meses siguientes a la fecha de recepción de la misma, pudiendo "LA UNIVERSIDAD" ordenar su reparación sin que el contratista tenga derecho a retribución alguna, y que en caso de que el contratista se negare a ejecutar la reparación, "LA UNIVERSIDAD" podrá optar por encomendarla a un tercero, con cargo a "EL CONTRATISTA", en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma, quedando a salvo los derechos de "LA UNIVERSIDAD" para exigir el pago de cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas.
2. Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, así como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos efectuados que ampara este contrato sin previa aprobación expresa y por escrito de "LA UNIVERSIDAD".

**DÉCIMO CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES. - "LA UNIVERSIDAD"** tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo al programa de obra aprobado, para lo cual "LA UNIVERSIDAD" comparará periódicamente el avance de las obras.

1. Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior el avance de las obras es menor de lo que debió realizarse, "LA UNIVERSIDAD" procederá a:
2. La retención en total de 30 % (treinta por ciento) de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debió realizarse multiplicando por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciación de las obras hasta la de la revisión, por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que la retención total sea la procedente. Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor de "LA UNIVERSIDAD" como pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA".



## Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas

Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208




3. Aplicar, para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya la obra en la fecha señalada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 20% (veinte por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa, calculada por cada semana de retraso que cubrirá "EL CONTRATISTA" mensualmente hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de "LA UNIVERSIDAD", presentando el finiquito correspondiente; en el caso de que el retraso sea mayor de un mes "EL CONTRATISTA" deberá cubrir mensualmente el importe de la sanción hasta finalizar la obra. Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de "LA UNIVERSIDAD" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".
4. Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, "LA UNIVERSIDAD" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.
5. En caso de rescisión de contrato por causas imputables al contratista, "LA UNIVERSIDAD" procederá a hacer efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente lo que deberá ejecutarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión.
6. En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

**DECIMA QUINTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. -** "LA UNIVERSIDAD" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general sin que ello implique su terminación definitiva. El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

**DECIMO SEXTA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. -** "LA UNIVERSIDAD" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general, así como en los casos:

1. La contravención a las disposiciones, lineamientos y requisitos que establece la ley de obras públicas y demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD", además de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales, conforme a lo establecido por este contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.
2. Las partes convienen que cuando "LA UNIVERSIDAD" determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, la decisión correspondiente se comunicará a "EL CONTRATISTA", exponiéndole las razones que al efecto se tuvieron para que este, dentro del término de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de la rescisión,



## Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas

Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



en el domicilio convencional señalado, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso "LA UNIVERSIDAD" resolverá lo procedente, dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de "EL CONTRATISTA".

3. Cuando por caso fortuito o de fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podrá suspender la obra, previa notificación por escrito a "LA UNIVERSIDAD", en este supuesto, si opta por rescindir el contrato, lo solicitará a "LA UNIVERSIDAD", la cual decidirá dentro de los 10 días naturales siguientes al de la solicitud; en caso de negativa, será necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

**DÉCIMO SÉPTIMA. - SUJECIÓN A LAS DISPOSICIONES LEGALES.** - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la ley de obras públicas y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.


**DÉCIMA OCTAVA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.** - "EL CONTRATISTA" Acepta que de las estimaciones que le cubra "LA UNIVERSIDAD" se hará la siguiente deducción:

1. El 5/1000 (cinco por cada 1000) del importe de cada estimación por concepto de derechos por el servicio de inspección, vigilancia y control.
2. "EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a las disposiciones legales de carácter interno o, en su caso de competencia federal y a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, preservación del medio ambiente y uso de la vía pública, así como de cualquier otra naturaleza que corresponda al tipo de la obra encomendada.

**DÉCIMA NOVENA. - DIFUSIÓN DE LA OBRA.** - "EL CONTRATISTA" Se obliga a construir e instalar en el lugar o lugares que "LA UNIVERSIDAD" le indique, hasta tres letreros relativos a la obra en ejecución, construidos con estricto apego al modelo que proporcione "LA UNIVERSIDAD", en la inteligencia de que será condición indispensable para que se haga el primer pago de obra ejecutada. Será obligación de "EL CONTRATISTA" solicitar los permisos de las autoridades respectivas para la colocación de los mencionados letreros.

**VIGESIMA.- ÁREA DE COORDINACIÓN:** "LA UNIVERSIDAD", designa como responsable para el debido cumplimiento del presente contrato al Ing. José Enrique Mandujano Álvarez, Subdirector de Servicios Generales, con facultades para resolver de común acuerdo con su contraparte, todos los asuntos derivados de su aplicación y que no se encuentren previstos en sus cláusulas.

**VIGESIMA PRIMERA. - JURISDICCIÓN.** - Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes en la ciudad de Saltillo Coahuila, por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.



*Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro*

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas  
Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315  
Commutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



PREVIA LECTURA Y CON PLENO CONOCIMIENTO DE LAS PARTES DE SU CONTENIDO, SE EXTIENDE EN CINCO TANTOS EL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO "I" QUE DE CONFORMIDAD SUSCRIBEN LAS PARTES EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL 28 DE FEBRERO DE 2022, CONSERVANDO CUATRO EJEMPLARES "LA UNIVERSIDAD" Y UN EJEMPLAR "EL CONTRATISTA".

**POR "LA UNIVERSIDAD"**

**MC. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ**  
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO  
Y APODERADO LEGAL

**POR EL "PROVEEDOR"**


**CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO**  
APODERADO LEGAL

**RESPONSABLE DEL TRABAJO**

**ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ**  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

LAS FIRMAS QUE APARECEN EN ESTA HOJA SE REFIEREN AL CONTRATO QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO Y CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO, CON EL OBJETO DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS-DORMITORIO-MODULO 01. -----





# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas  
Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



## ANEXO I

CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad.	P. Unitario	Importe
	<b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA "ANTONIO NARRO"</b> <b>CATÁLOGO DE CONCEPTOS</b> <b>"REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 04 BAÑOS-DORMITORIO-MODULO 01"</b>				
	<b>NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS A LOS QUE CORRESPONDA INCLUYE: SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, APLICACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRAZO, HERRAJES, CORTES, PROTECCIÓN DE LOS MUEBLES Y MATERIALES EXISTENTES, FLETES, ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA, VELADOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.</b>				
1	DEMOLICION DE VITROMURO.	72.00	M-2	80.00	\$5,760.00
2	DEMOLICION DE VITROPISO	20.00	M-2	80.00	\$1,600.00
3	RETIRO DE LINEAS HIDRAULICAS EXISTENTES DE COBRE, RETIRO DE SANITARIO Y DE LAVABO.	88.00	M-L	150.00	\$13,200.00
4	RETIRO DE APARATO SANITARIO Y DE LAVABO.	8.00	PZAS.	200.00	\$1,600.00
5	MAMPARA DE ALUMINIO CON ACRILICO EN DIVISION DE REGADERA.	8.00	PZA.	5,000.00	\$40,000.00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUELETOS CON TUBOPLUS DE 1/2 PULG., MEZCADORA RUGO Y CEBOLLETA ELVEX	4.00	PZA.	3,500.00	\$14,000.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas

Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315

Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOPLUS DE 1/2PULG. PARA AGUA FRIA Y CALIENTE PARA LAVABO.	120.00	M-L	400.00	\$48,000.00
8	COLOCACION DE VITROMURO DE 33X33 CMS. DE PRIMERA COLOR CLARO.	96.00	M-2	480.00	\$46,080.00
9	COLOCACION Y SUMINISTRO DE VITROPISO ANTIDERRAPANTE EN BAÑO.	24.00	M-2	480.00	\$11,520.00
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS COMPLETO, MARCA CATO, VITROMEX	4.00	PZA.	3,500.00	\$14,000.00
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO Y PEDESTAL COMPLETO, MARCA CATO VITROMEX.	4.00	PZA.	3,500.00	\$14,000.00
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGUITORIO COMPLETO.	4.00	PZA.	4,200.00	\$16,800.00
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y PUERTA MULTIPANEL	4.00	PZA.	4,800.00	\$19,200.00
14	RESANES Y RESTIRAMIENTO EN AREA DE RERGADERAS Y APLICACIÓN DE TEXTRURIZADO.	40.00	M-2	350.00	\$14,000.00
15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA BEREL 2 MANO, INCLUYE PREPARACION Y RESTIRAMIENTO.	400.00	M-2	70.00	\$28,000.00
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED AHORRATIVA.	8.00	PZAS.	700.00	\$5,600.00
17	SUMINISTRO Y REPOSICION DE APAGADOR COMPLETO.	8.00	PZAS.	350.00	\$2,800.00

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]*



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas  
Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315  
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS POLARIOZADOS.	8.00	PZAS.	350.00	\$2,800.00
19	LIMPIEZA Y SONDEO DE LINEA GENERAL DE DRENAJE Y PRUEBA AL REGISTRO EXTERIOR	80.00	M-L	200.00	\$16,000.00
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ALIMENTACION DE 3/4" PARA SU CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA.	4.00	PZA	680.00	\$2,720.00
21	HERRAJES Y CONEXIONES EN BOILER, MINGITORIO, TAZA, WC, LAVABO, PILETA, ASEO Y RESUMIDERO DE 4 PLG.	28.00	PZA	357.15	\$10,000.00
22	ESPEJO LAVABO	4.00	PZA	800.00	\$3,200.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	\$330,880.00
Trescientos treinta mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.				<b>I.V.A.</b>	\$52,940.80
Cincuenta y dos mil novecientos cuarenta pesos 80/100 M.N.				<b>TOTAL:</b>	\$383,820.80
Trescientos ochenta y tres mil ochocientos veinte pesos 80/100 M.N.					



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Necesidades de Mantenimiento y Encuesta Satisfacción de Cliente

Código F 6.17

Fecha Revisión 15/11/07

Revisión No. 0

Tiempo de Retención Un Año Después de su Vida Útil

Solicitud No. 485-G

Área / Depto.:

Nom. Del Solicitante: M.C. CARLOS ROJAS PEÑA

Ubicación: SERVICIOS ASISTENCIALES

Acciones a Realizar:

Material requerido:

Fecha Elab. Solicitud: 25/02/2022

Fecha Rec. Mto. 25/02/2022

Fecha Rec. Supervisor: 05/04/2022

Fecha Rec. Material:

Fecha Elabor. Vale Con.:

Fecha Eng. Oper.y:

Causa y/o Raíz:

Marque con una X el recuadro requerido

Herramientas requeridas

- Equipo de Carpintería
Equipo de Fontanería
Equipo de Electricidad
Equipo de Tabla roca
Equipo de Herrería
Equipo de Agua

- Equipo de Pintura
Equipo de Albañilería
Equipo de Teléfonos
Equipo de Jardinería
Equipo de Limpieza
Equipo de Oficina

Días estimados hábiles de inicio del Mto 1 3 6 9 12 15 mas

Días estimados hábiles de termino del Mto 1 3 6 9 12 15 mas

Operadores Requeridos 1 2 3 4 5 6 7

Observaciones:

Nombre y Firma del Supervisor

Nombre y Firma del Oper. / Provee.

Fecha, Nombre y Firma del Usuario

Encuesta Satisfacción del Cliente

Tiempo estimado de inicio de Mto. u Obra.

Tiempo estimado de término de Mto. u Obra .

- Antes del tiempo estimado
Justo a tiempo estimado
Después del tiempo estimado

- Antes del tiempo estimado
Justo a tiempo estimado
Después del tiempo estimado

Los materiales fueron los adecuados para el Mto.

El mantenimiento se realizó como lo solicitó.

SI NO

BIEN REGULAR MAL

Observaciones;



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Solicitud de Mantenimiento	Código F 6.16	Fecha Revisión 15/11/07	Revisión No. 0
	Tiempo de Retención Un Año Después de su Vida Útil		

No. Solicitud: 485-G Fecha: 25 DE FEBRERO DE 2022

Área y/o Departamento: SERVICIOS ASISTENCIALES Fecl: Fecha:

Prog.	SubProg.	Proy.	E.U.J.	Partida	Monlo Sistema

Nombre del Solicitante: MC. CARLOS ROJAS PEÑA

Marque con una X el servicio de Mantenimiento que requiere.

<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Limpieza
<input type="checkbox"/> Pintura	<input type="checkbox"/> Electricidad	<input type="checkbox"/> Abastecimiento de Agua
<input type="checkbox"/> Fontanería	<input type="checkbox"/> Teléfonos	<input type="checkbox"/> Cerrajería
<input type="checkbox"/> Tabla Roca	<input type="checkbox"/> Equipo de Oficina	<input type="checkbox"/> Jardinería
<input type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Equipo de Laboratorio	<input type="checkbox"/> Otros: <u>SERVICIOS</u>

Desperfecto de falla o daño en equipo: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 4 BAÑOS  
DORMITORIO MODULO # 1

 <u>MC. CARLOS ROJAS PEÑA</u> Firma Solicitante JEFE DEPTO. DE SERVICIOS ASISTENCIALES	<p>Sello de Recibido Mtto.</p> 	 Nombre Recibido en Mtto.
<u>ING. JOSE L. GAITAN GARCIA</u>		
