



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2022
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-04-00013**

Elab :2022-04-01

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: JESUS ALEJANDRO ALVISO CEPEDA - FACTURA NO. E448F IMPERMEABILIZACIÓN
CON TERMOFUSIÓN DE 4 MM. EN EL EDIFICIO DE FORESTAL CONTRATO NO.
016/22AD.MTTO. (FINIQUITO) MONTO TOTAL \$ 279,324.45


APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	2124	PAG	733	JESUS ALEJANDRO ALVISO CEPEDA	\$ 167,594.67	
5135-1000	PAR	3510100	PAG	733	FACTURA NO. E448F/SOL.MTTO. 672 IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO FORESTAL	\$ 167,594.67	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 733 DEP) JESUS ALEJANDRO ALVI - FACTURA NO. E448F IMPERMEABILI		\$ 167,594.67
2112-1000	PRV	2124	PAG	733	FACTURA NO. E448F/SOL.MTTO. 672 IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO FORESTAL		\$ 167,594.67
TOTALES POLIZA						\$ 335,189.34	\$ 335,189.34

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

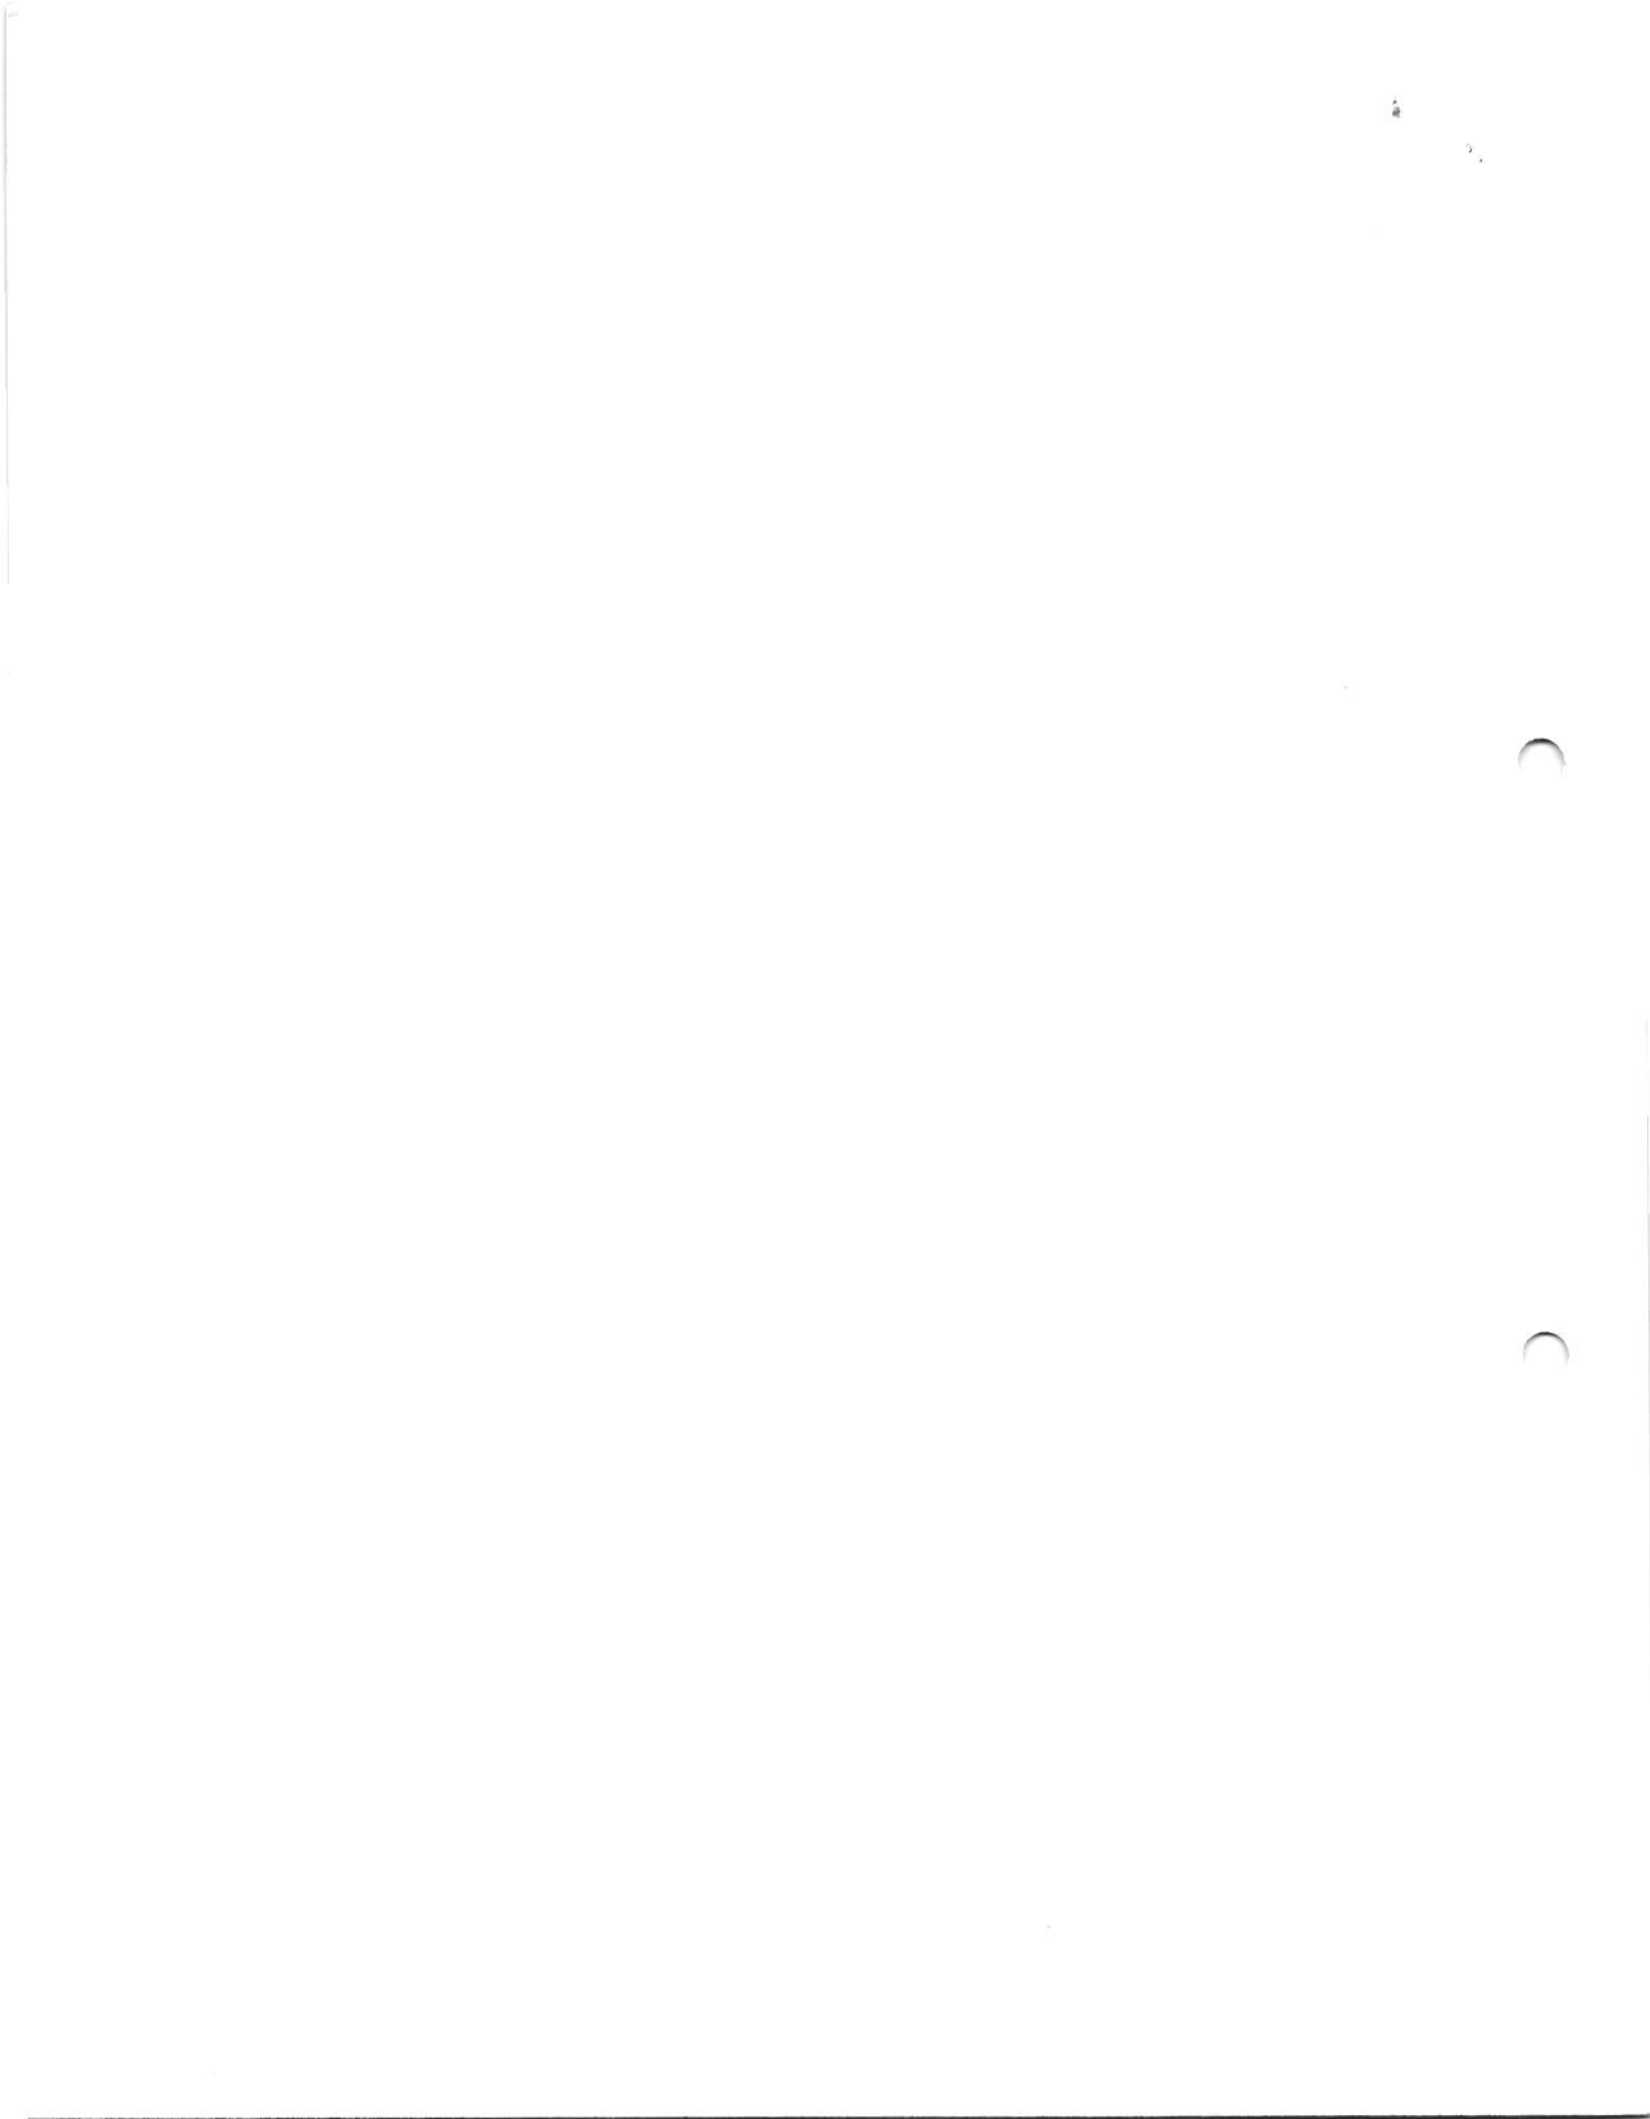

B.04-013
221



Pagos SPEI enviados

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:31:22

Página: 1

Fecha valor 01/04/2022 Clave de Rastreo: HSBC375207
Fecha de liquidación: 01/04/2022 Hora de liquidación: 13:57:44 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4001749597
Nombre del Ordenante: A UAAAN
Referencia del ordenante: F 448 JESUS A AL
Comisión cobrada: 0.00
Moneda: MXN
Monto: 167,594.67

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 058078160664200128 Referencia Numérica: 733
Nombre del Beneficiario: ALVISO CEPEDA JESUS ALEJANDRO
Banco Receptor: BANREGIO
Concepto de Pago: F 448 JESUS A ALV

4
2





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Contra Recibo

CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.

01 (844) 411-0200

UAA750303NHA

No.759

Beneficiario 2124

JESUS ALEJANDRO ALVISO CEPEDA

1 DE ABRIL DE 2022

Factura	uid	SubTotal	I.V.A.	I.E.P.S.	Importe
E448F	PAGO DIRECTO DOCUMENTO 733	167,894.67	0.00	0.00	167,594.67
TOTALES					167,594.67

RECIBIDO
01 ABR 2022
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: _____

COPIA

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2022
PAGO DIRECTO
FORMATO: F-7.14-1



Imprimir

DOCUMENTO No. 733

Entidad Federativa :

Región :

Municipio :

Finalidad :

Unidad Responsable :

Sub Programa :

Solicitante

Concepto

BENEFICIARIO

Cuenta Bancaria

PAGO DIRECTO

5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

5 -

30 - SALTILLO

25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR


410302001 -

4151 - Mantenimiento de Obra de Interes General

1516-MANDUJANO ALVAREZ JOSE ENRIQUE

FACTURA NO. E448F IMPERMEABILIZACIÓN CON TERMOFUSIÓN DE 4 MM. EN EL EDIFICIO DE FORESTAL CONTRATO NO. 016/22AD.MTTO. (FINIQUITO) MONTO TOTAL \$ 279,324.45

2124 - JESUS ALEJANDRO ALVISO CEPEDA





PENDIENTE

Elaborado : 2022-03-20

Liberado :

Autorizado :

Part.	Descripción de la Partida	Importe
3510100	FACTURA NO. E448F/SOL.MTTO. 672 IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO FORESTAL	\$ 167,594.67
	TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO	\$ 167,594.67



Handwritten mark

Handwritten signatures and initials

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text at the bottom right of the page, possibly a signature or footer.

AC Proyectos y Servicios Industriales

RFC emisor: AICJ780509T22 Nombre emisor: JESUS ALEJANDRO ALVISO CEPEDA RFC receptor: UAA750303NHA Nombre receptor: Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro Uso CFDI: Gastos en general	Folio fiscal: 9E2AC4F7-497D-4295-AFA5-4DE9A2BE448F No. de serie del CSD: 00001000000511102378 Código postal, fecha y hora de emisión: 25019 2022-03-28 10:25:58 Efecto de comprobante: Ingreso Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza	
--	---	--

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72153200		1	WEE	1	146052.00	146052.00				
Descripción	Finiquito por Impermeabilización con termofusión 4mm en edificio forestal con O.M.#672				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	146052.00	Tasa	16.0000%	23368.32
					ISR	Retencion	146052.00	Tasa	1.2500%	1825.65

Moneda: Peso Mexicano Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Método de pago: Pago en una sola exhibición	Subtotal \$ 146,052.00 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 23,368.32 Impuestos retenidos ISR \$ 1,825.65 Total \$ 167,594.67
--	--

Sello digital del CFDI:

aVJVbfgwCKu/v72QW+YpyWCDv+jSgE3kk07d1eoB8liH+PKtRqcNKGvclvOa4xC+gurDqKzAme9xUP2pflyxqW4TbkNj573jdmZ/+up1xX8l6nocVrM11b4NS+pmpsJiieFyo++1SCCqMQ/0Qr21nufMNqa8SEd7kASwGF845bk0uZk4HqNexEA09zmzmYs4zInc5QgsF+oH+yZZ0DbuVqiUJWQbTkiikVlve364MGKs6AJOmK5kepNaobw/Ur3MZumypofNcVUpyLtlqL282fTn7KW1qLke1Lcaa73Am3Pnlvf5IOgfQaLg3DIT+1vOq0RJDX+fciauA9LQaCg==

Sello digital del SAT:

MBh9aUm3a4pB6/klxccu6rXyDu4dpQqI5zIFizxmJz32Fc9YP3NOCRabBCmDZWD+y5E10wHy+AVGC9PBp2a0xvzRtkceG3mdd2JcZ/nrmTEeiSOBG9qKGYDfIz4SF6PZ56Hch24MPUafEEzRttdBliikNHos1Li/eH2wPtfbb7VYUkdRK8QNXXHaBZ5+sdOJF1/qkq0Yocpba7X6Wun3f5Q7Uj+R52vAH56zjGqX+uD1ivtz+rRmGomDY4190mSEOVLGFT5a4zdmObAK/wP+OH3URASMuhm4g6j36/TPSjYz0H5foBj9/tsJF0oktqm3yL2yxRRgeLscDHjgxK0g==


Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9E2AC4F7-497D-4295-AFA5-4DE9A2BE448F|2022-03-28T10:34:59|SAT970701NN3|aVJVbfgwCKu/v72QW+YpyWCDv+jSgE3kk07d1eoB8liH+PKtRqcNKGvclvOa4xC+gurDqKzAme9xUP2pflyxqW4TbkNj573jdmZ/+up1xX8l6nocVrM11b4NS+pmpsJiieFyo++1SCCqMQ/0Qr21nufMNqa8SEd7kASwGF845bk0uZk4HqNexEA09zmzmYs4zInc5QgsF+oH+yZZ0DbuVqiUJWQbTkiikVlve364MGKs6AJOmK5kepNaobw/Ur3MZumypofNcVUpyLtlqL282fTn7KW1qLke1Lcaa73Am3Pnlvf5IOgfQaLg3DIT+1vOq0RJDX+fciauA9LQaCg=|=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-03-28 10:34:59
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Ramirez
Herrera

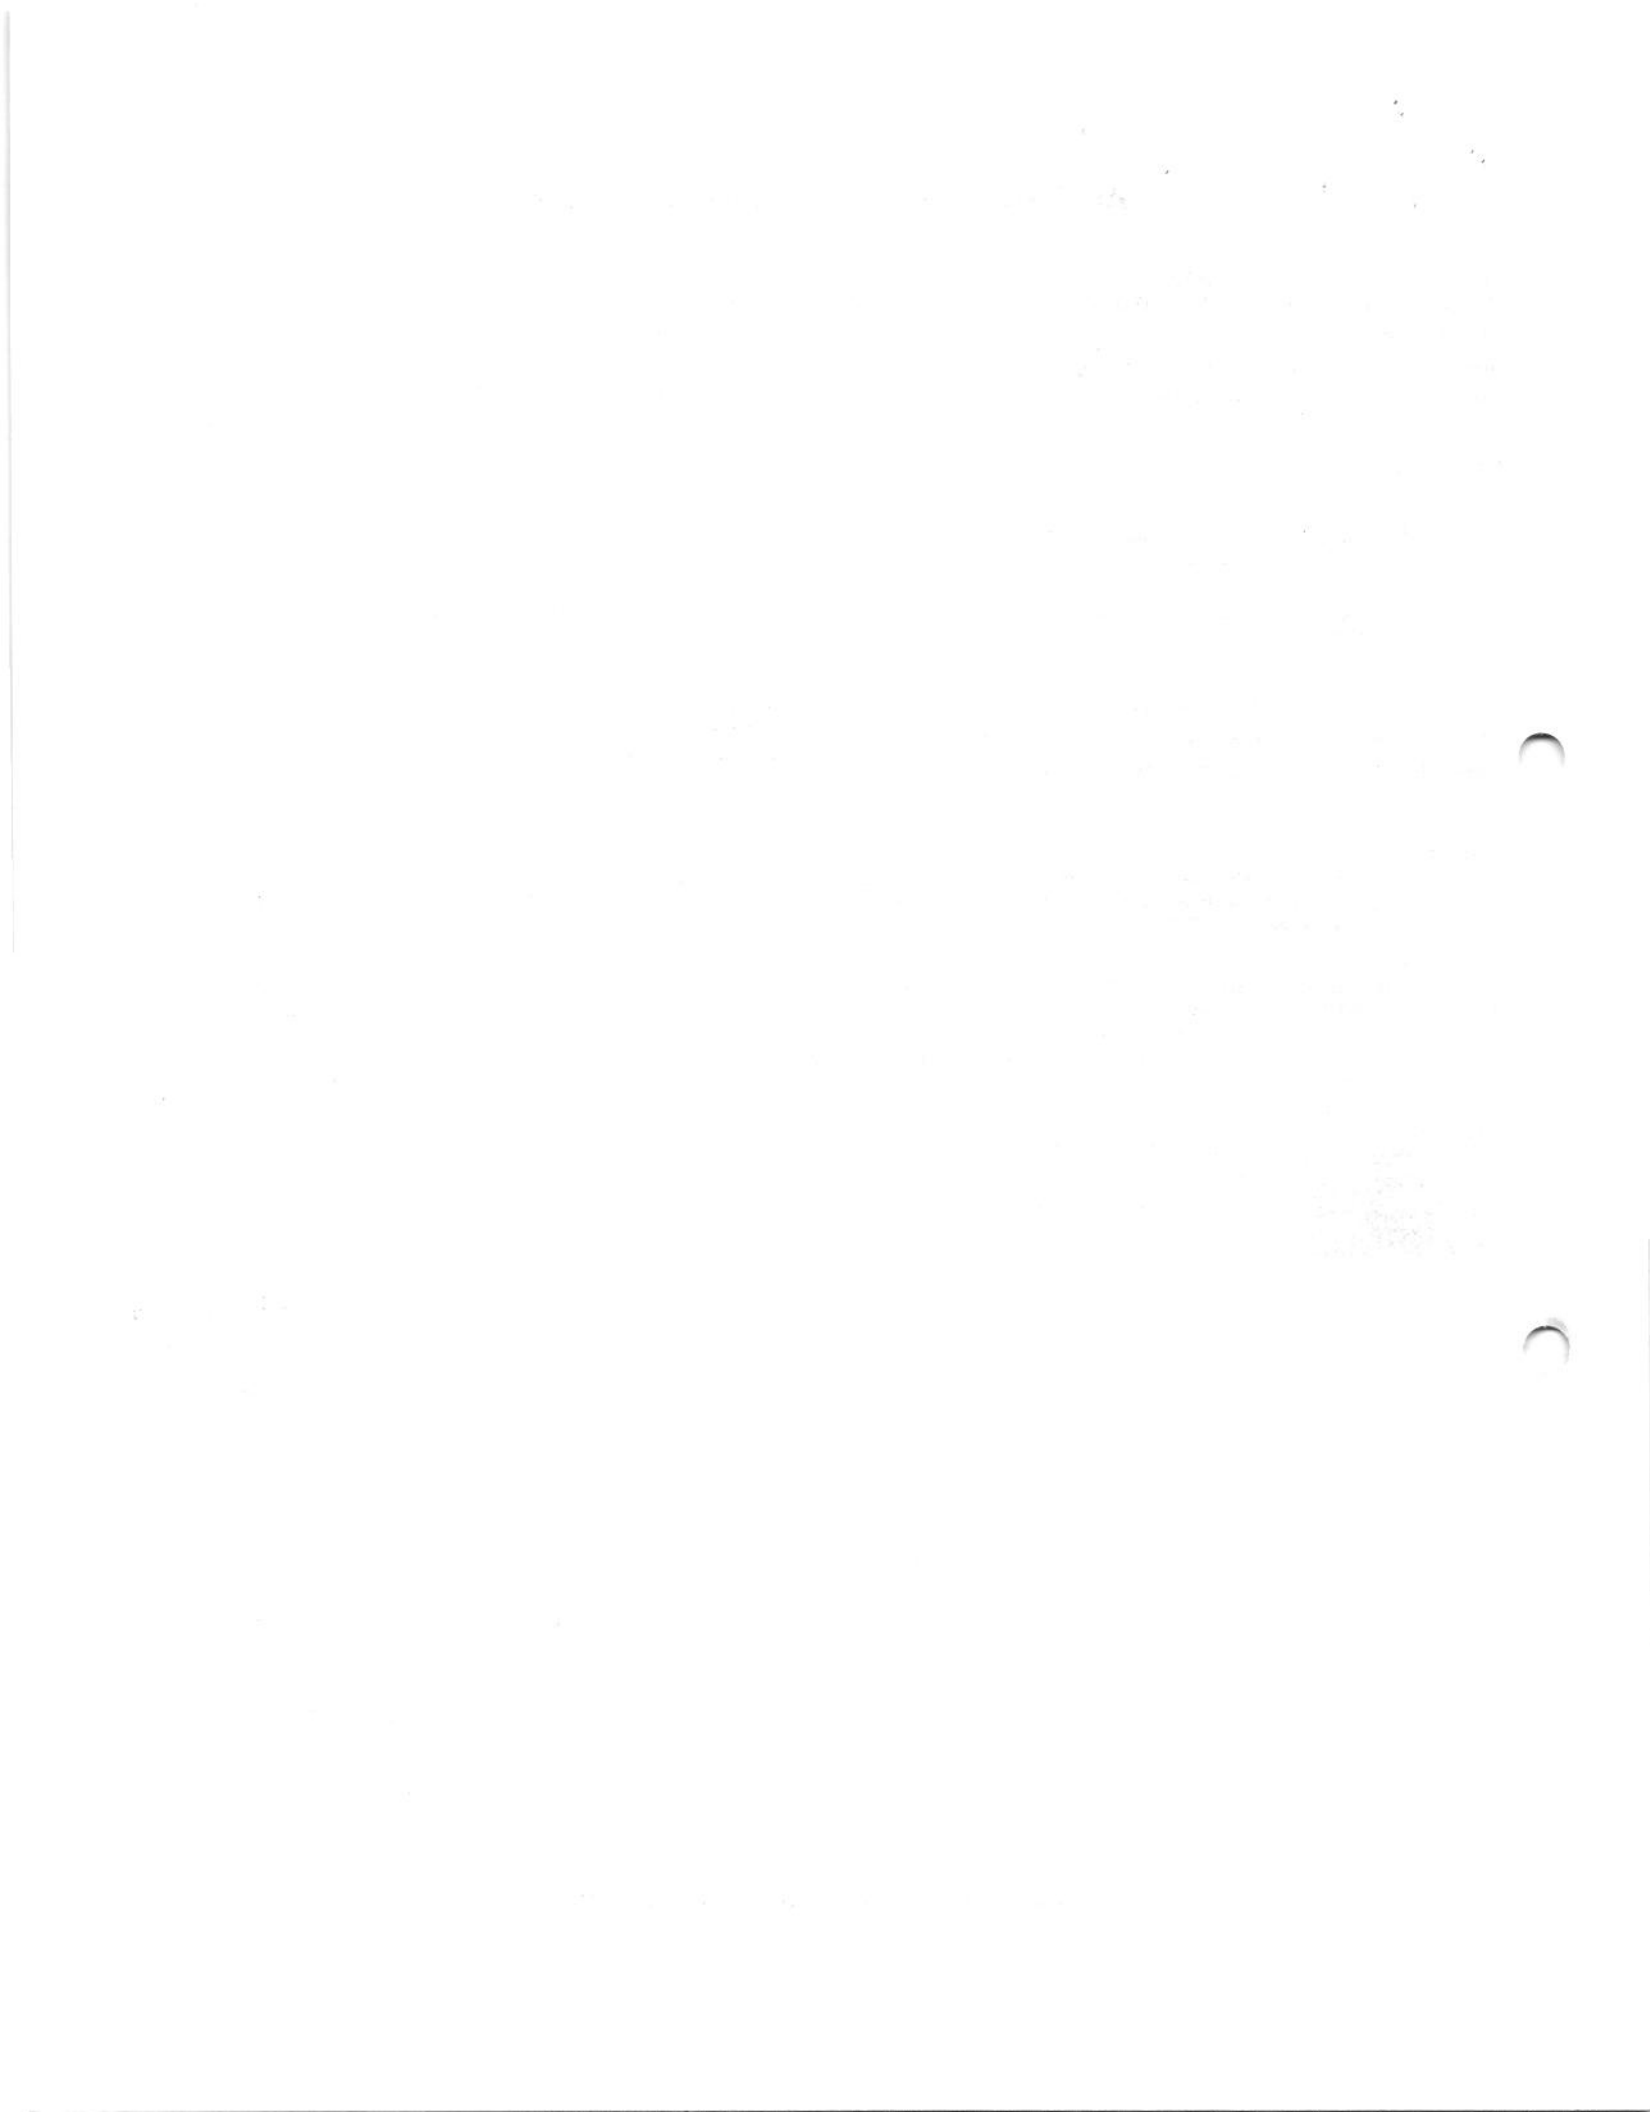



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

**Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios**

Calzada Antonio Narro 1923, Colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 4110200 ext. 2014. Tel.dir (844) 411 02 08
e-mail: administrativa@uaaan.edu.mx - Página Web: www.uaaan.edu.mx



Saltillo, Coah. A 10 de marzo de 2022

CONSTANCIA

La Dirección General Administrativa de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro hace constar que:

El proveedor **JESUS ALEJANDRO ALVISO CEPEDA**, en cumplimiento al contrato **016/22 A.D. MTTO. IMPERMEABILIZACION CON TERMOFUSION DE 4MM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE FORESTAL**, y con fundamento en el Artículo 48 de la Ley de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas, entrega a esta Universidad, a fin de garantizar el cumplimiento, vicios ocultos de las obligaciones contraídas en el referido contrato lo siguiente:

Cheque emitido por la Institución Bancaria BANREGIO S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero.

Derivado de la cuenta: 016066410012

Cheque Número: 0000073

Cantidad: \$111,729.78 (ciento once mil setecientos veintinueve pesos 78/100 M.N.) por el 40% de garantía de anticipo.

Cheque Número: 000074

Cantidad: \$24,342.00 (veinticuatro mil trescientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) por el 10% de garantía de cumplimiento.

Cheque Número: 000075

Cantidad: \$24,342.00 (veinticuatro mil trescientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) por el 10% de garantía de vicios ocultos.

Sucursal: Saltillo, Coah.


Titular de la cuenta: JESUS ALEJANDRO ALVISO CEPEDA

Quedarán bajo resguardo de esta Dirección y a su vez serán liberados cuando haya concluido el servicio del objeto del contrato de forma satisfactoria para la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

**ATENTAMENTE
ALMA TERRA MATER**

**M.C. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
Y PRESIDENTE DEL COYSRM**

Ccp. Archivo

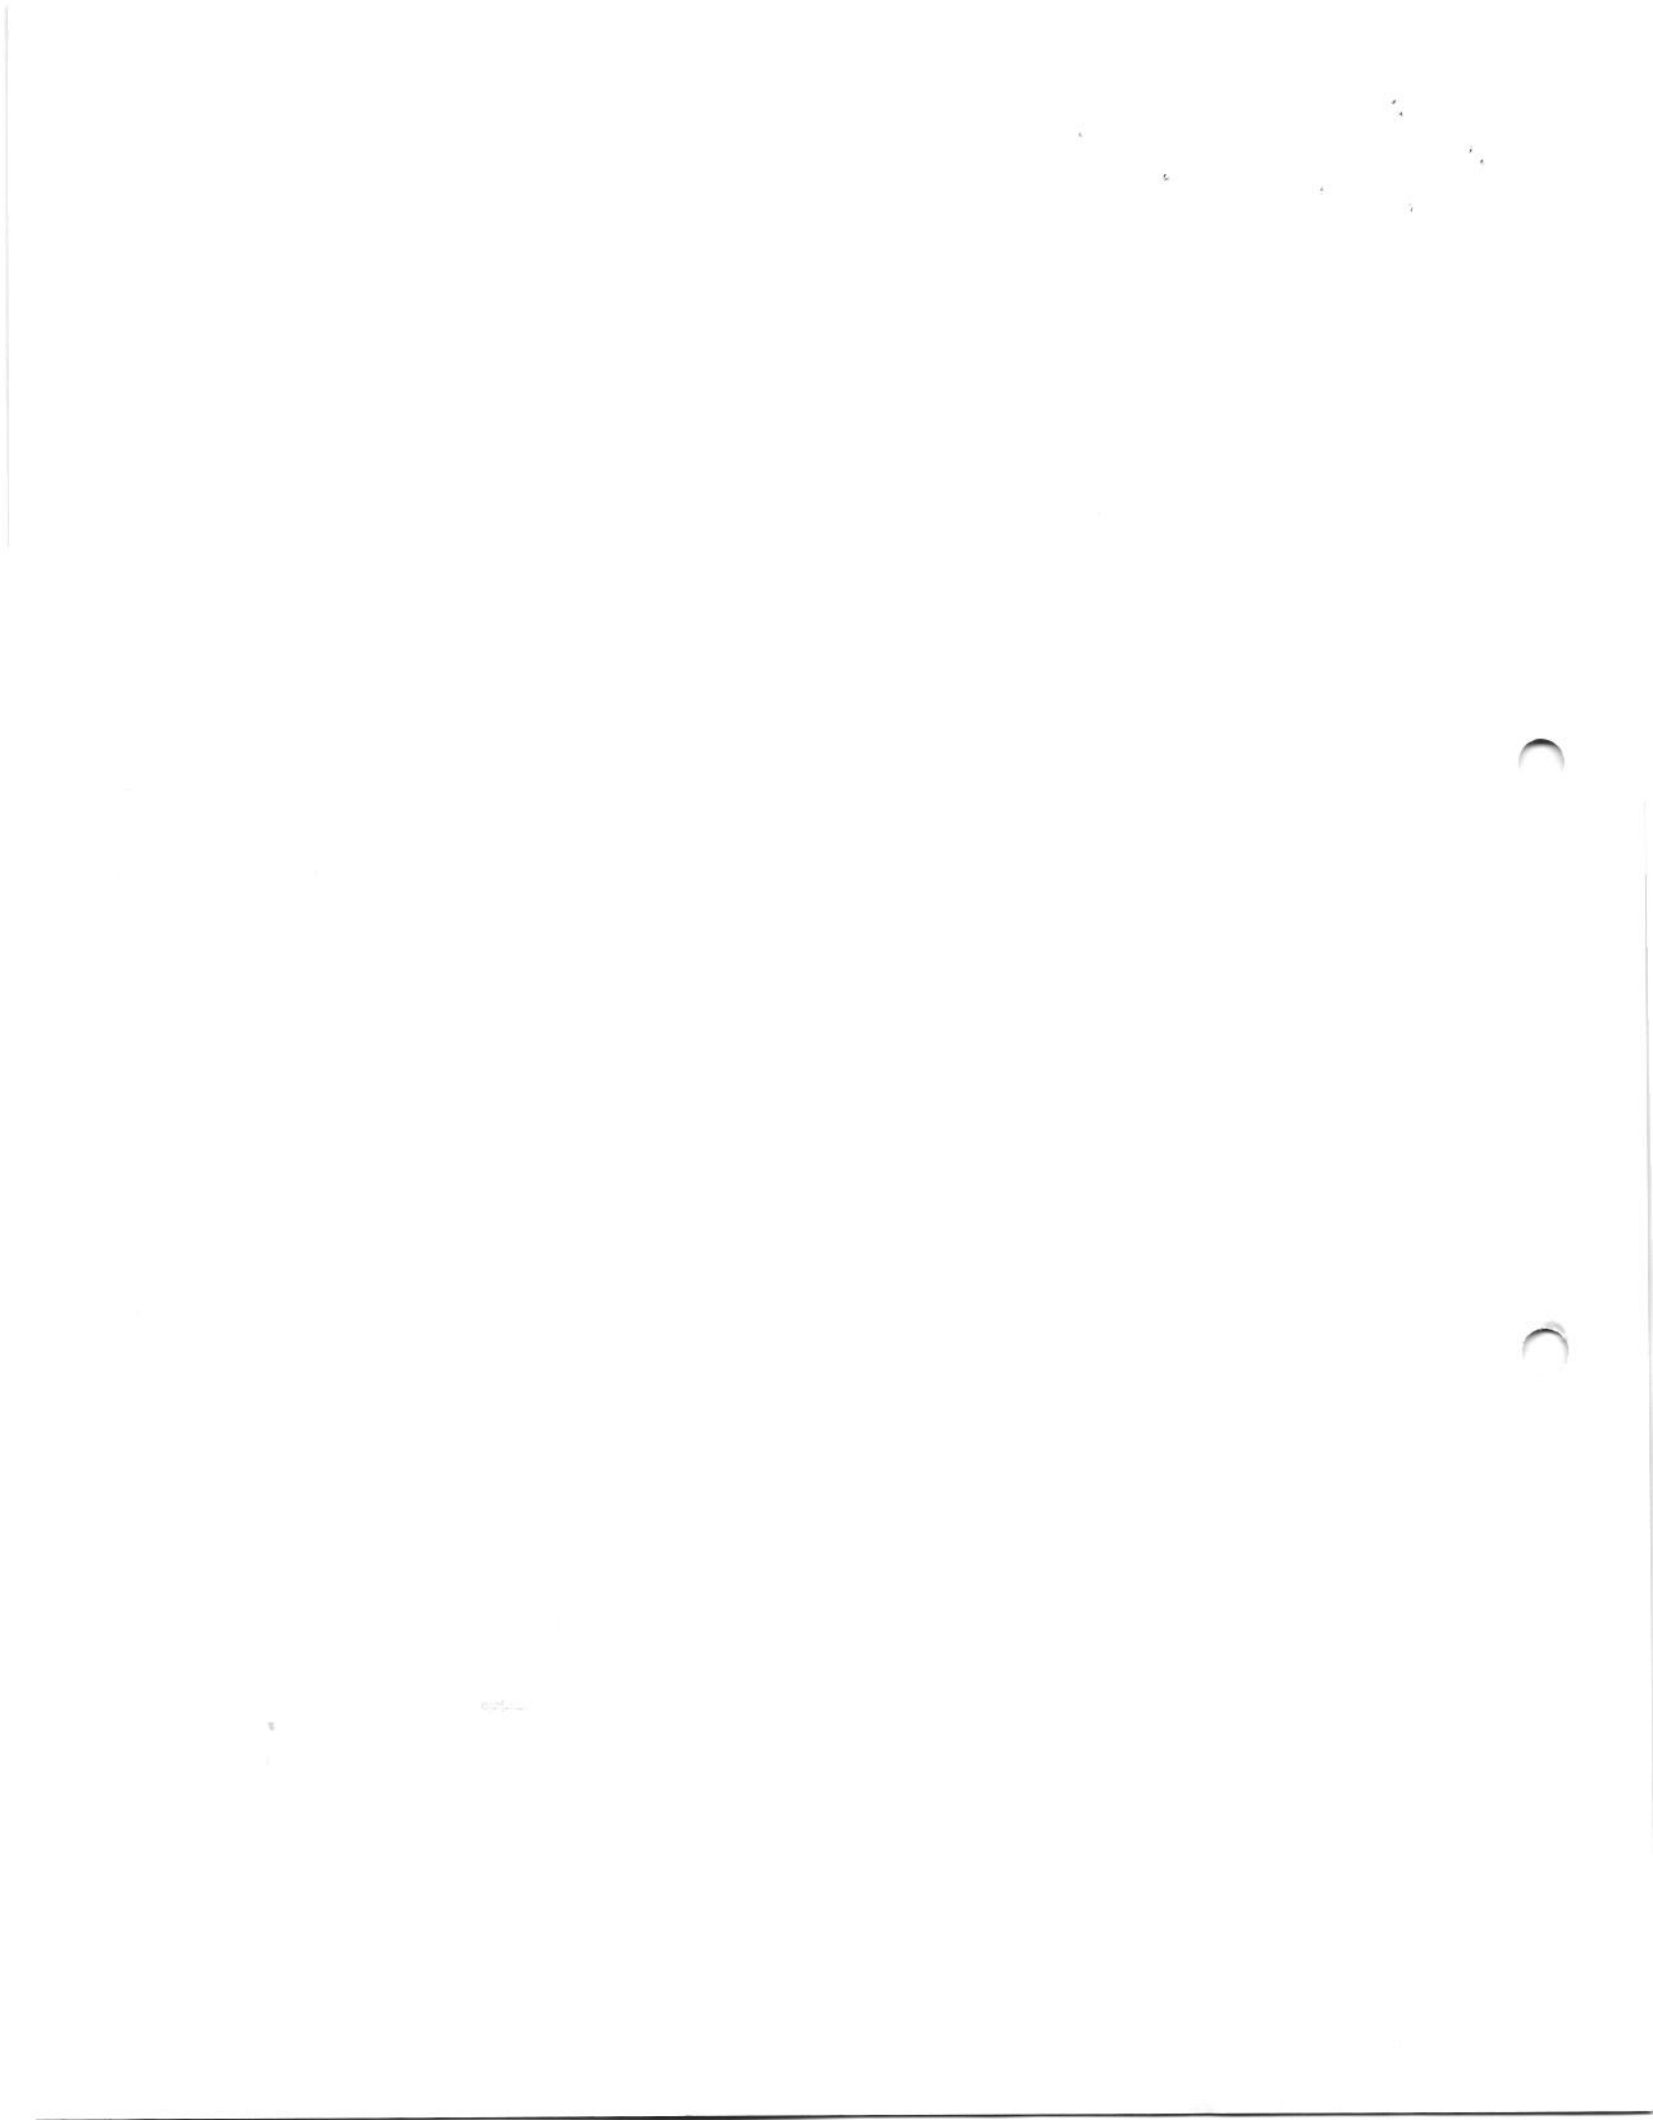

JESUS ALEJANDRO ALVISO CEPEDA
Suc 016 PERIFERICO
CUENTA 016066420012

Cuenta Naranja

10 / 11 / 20 / 2022

Fecha

Páguese este cheque a la orden de:

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGUIRRE ANTONIO NORRIS \$

111 729 -78

CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

78/100

Moneda Nacional

banregio

Banco Regional S.A.
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero

Firma

9468151118058516066420012110000073

235803
1A80021488

JESUS ALEJANDRO ALVISO CEPEDA
Suc 016 PERIFERICO
CUENTA 016066420012

Cuenta Naranja

10 / 11 / 20 / 2022

Fecha

Páguese este cheque a la orden de:

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGUIRRE ANTONIO NORRIS \$

24 342

VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

Moneda Nacional

banregio

Banco Regional S.A.
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero

Firma

7973151118058516066420012110000074

235803
1A80011952

JESUS ALEJANDRO ALVISO CEPEDA
Suc 016 PERIFERICO
CUENTA 016066420012

Cuenta Naranja

10 / 11 / 20 / 2022

Fecha

Páguese este cheque a la orden de:

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGUIRRE ANTONIO NORRIS \$

24 342

VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

Moneda Nacional


banregio

Banco Regional S.A.
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero

Firma

9349151118058516066420012110000075

235803
1A80009242

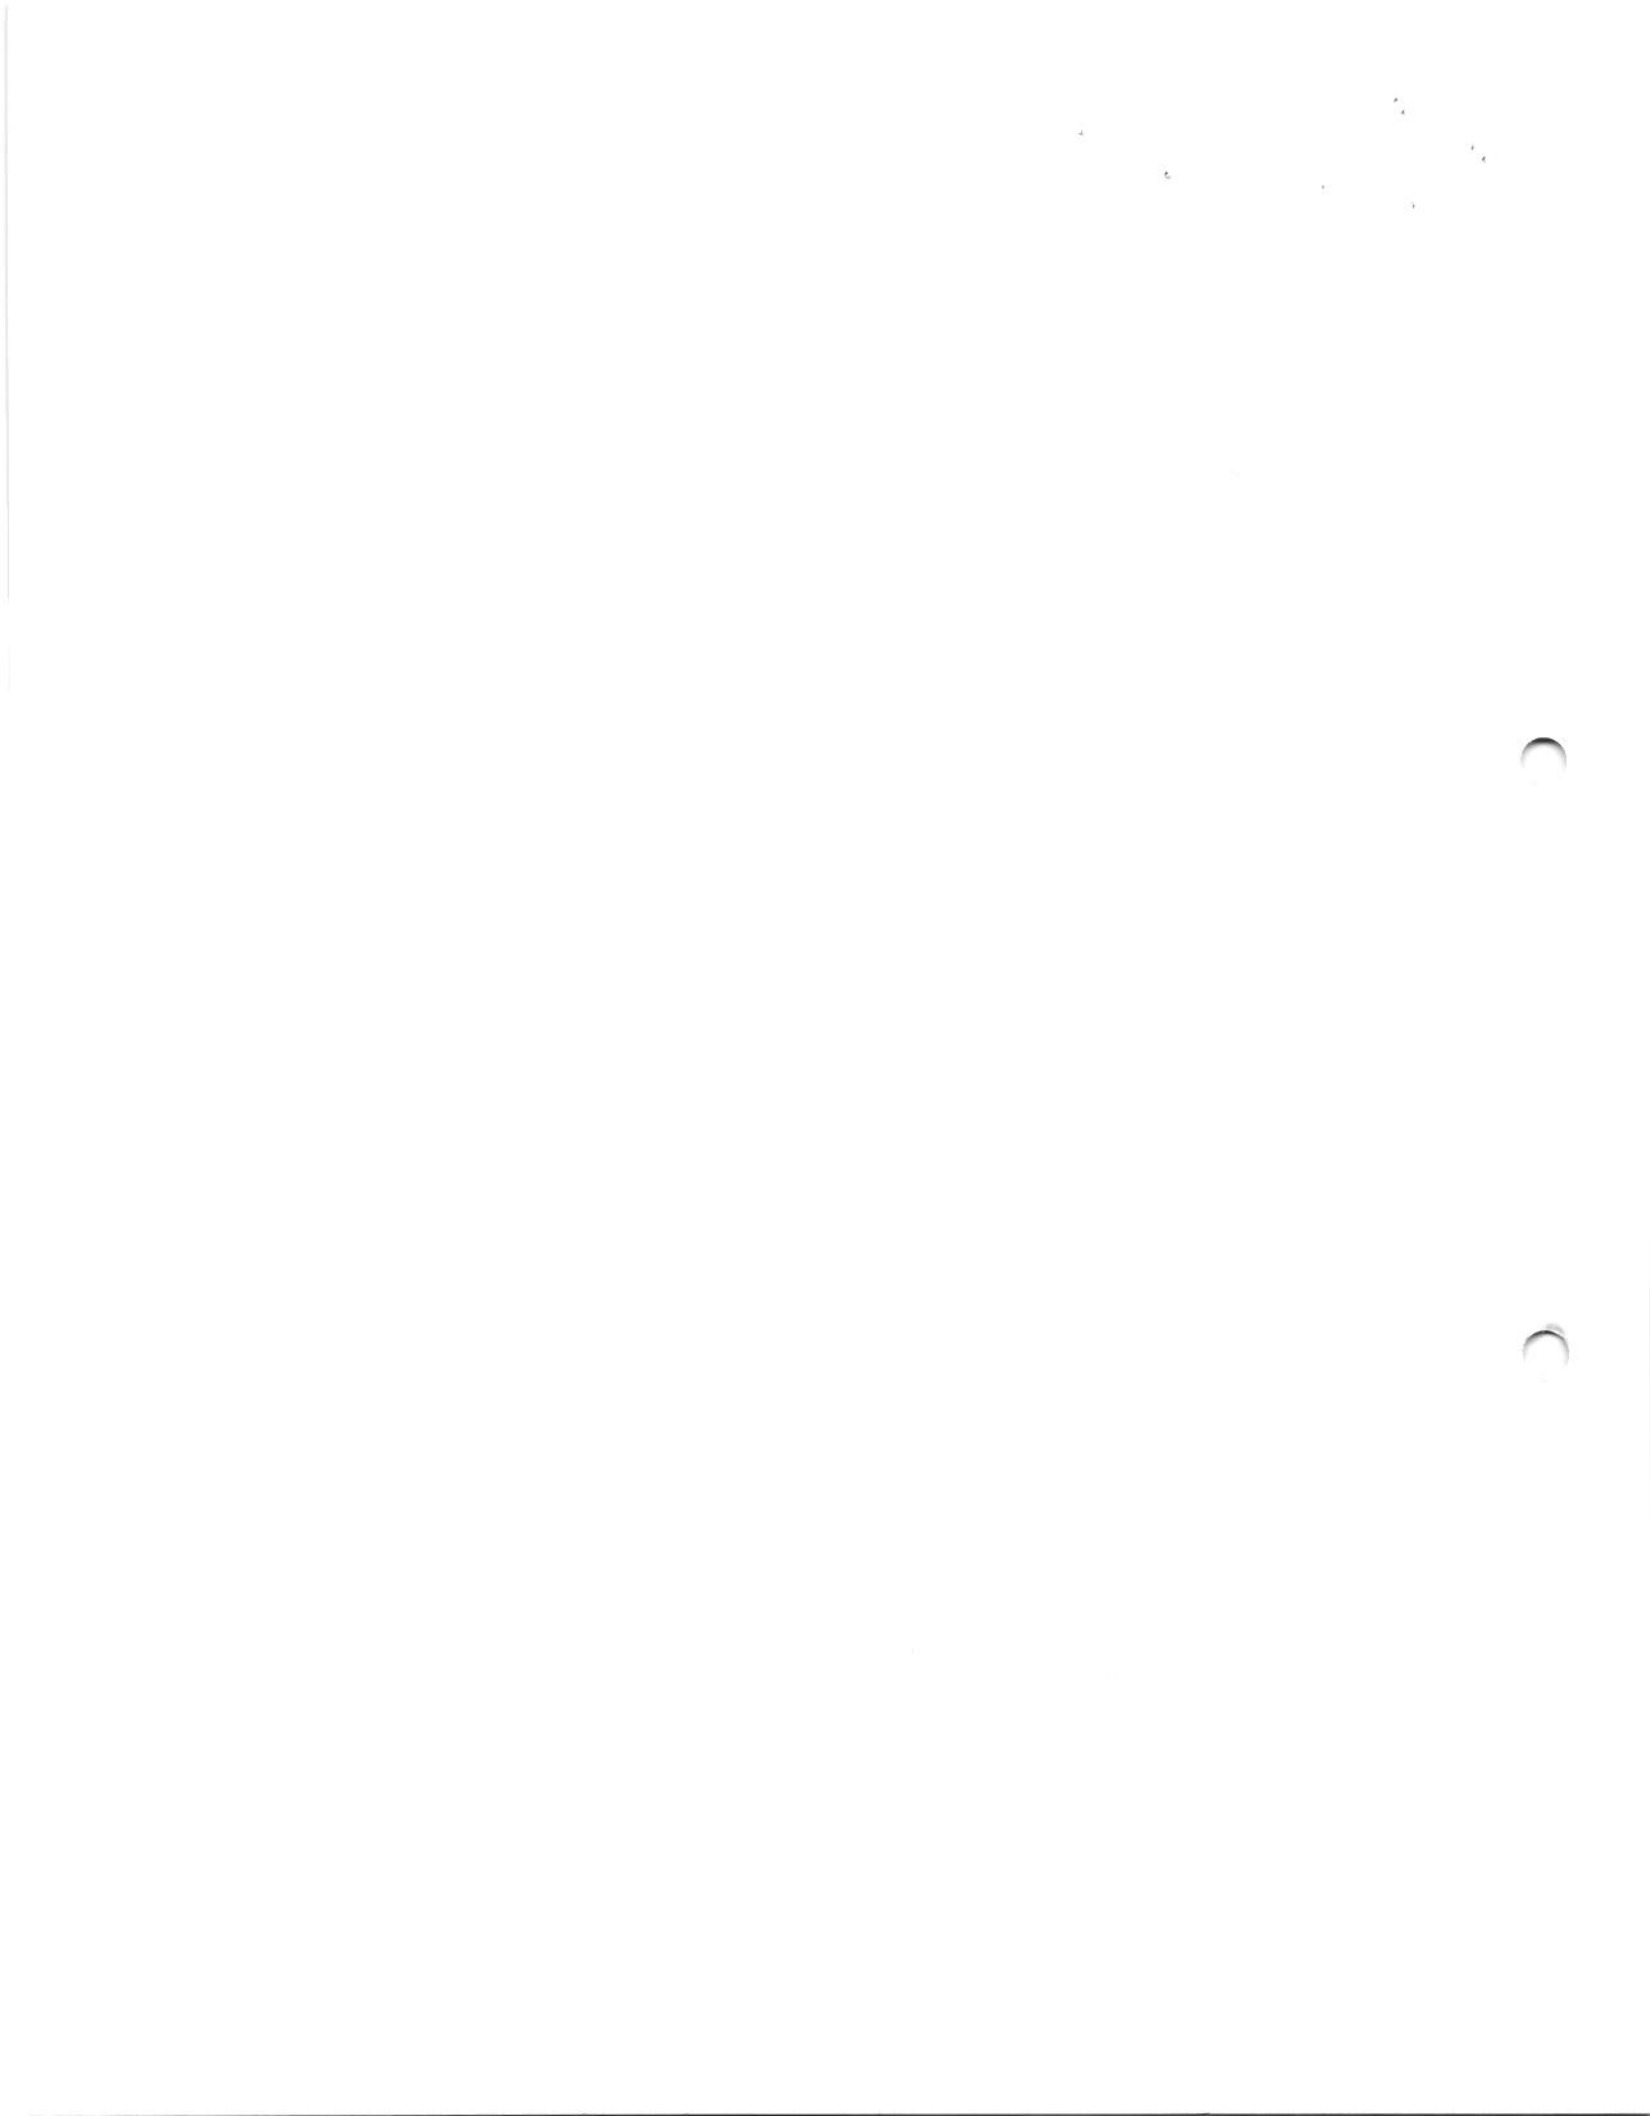



AC Proyectos y Servicios Industriales

Dirección de la compañía
Peña de Plata # 969
Col; Vistas de Peña Saltillo Coah
Contacto; ofna. 844.287.22.42 Cel; 844.880.26.88
jalviso.acproyectos@hotmail.com

Fecha: 08/03/2022
Id. del cliente: UAAAN

Presupuesto para; IMPERMEABILIZACION CON TERMOFUSION 4MM EN EDIFICIO FORESTAL

Nombre del cliente Ing. J. Enrique Mandujano/ Gustavo Burciaga
Compañía: Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro
Direccion: Calz. Antonio Narro #1923 Buenavista
Telefono: 844 506 9750

Presupuesto válido hasta: 07/04/2022

Item	Descripción	Cant.	Unidad	Importe	Total
1	Suministro e instalación de impermeabilizante prefabricado de 4 mm termofusionado con refuerzo de tela poliéster 180 g/m2, recubierto con gravilla esmaltada al fuego color rojo (terracota). Incluye limpieza de superficie eliminando falsas adherencias de sistema de impermeabilización existente, aplicación de primario asfáltico, sellado de zonas críticas (grietas) con cemento plástico asfáltico, gas, recolección de todos los residuos, confinamiento a lugar autorizado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	528	m2	\$315.00	\$166,320.00
2	Limpieza de losa. Incluye: Retiro de impermeabilizante acrílico fibratado existente en losa. Los materiales residuales serán depositados en lugar de tiro autorizado por las autoridades fuera de la universidad (fletes incluidos)	528	m2	\$50.00	\$26,400.00
3	Reparación interior de techo. Incluye limpieza de pintura dañada, resane de grietas y aplicación de pintura anti hongo para un mejor acabado del interior	180	m2	\$135.00	\$24,300.00
4	Entortado para dar pendiente en azotea con concreto ligero 2% pendiente inclinación. Incluye acarreo, nivelado, acabado pulido para recibir impermeabilizante tipo termofusion de 4mm	528	m2	\$50.00	\$26,400.00
				Subtotal	\$243,420.00
				IVA	\$38,947.20
				Retención ISR	\$3,042.75
				TOTAL	\$279,324.45

NOTAS:

Nuestro servicio incluye:
de materiales y mano de obra
Maquinaria y Equipo especial para realizar diferentes procesos fundamentales dentro del servicio uso exclusivo del personal

Suministro


Tiempo de ejecución; Se hará un cargo extra a la presente cotización por el tiempo perdido cuando no se le permita trabajar de acuerdo a los tiempos y horarios establecidos. Este porcentaje dependerá de el número de personas asignadas al proyecto así como a el tiempo perdido.

El personal que realizará esta correctamente calificado para el proceso del servicio solicitado, limitando sus actividades a las que solo estén relacionadas con el servicio comprado

Nuestro personal cuenta con certificación de habilidades ante la secretaria del trabajo (DC-3) para el correcto uso de todas la herramientas y maquinaria requeridas en este proceso.

Para iniciar este servicio es requerido un anticipo del 50% , y 50% al finalizar el proyecto

ATENTAMENTE
Ing. Jesus A. Alviso C.

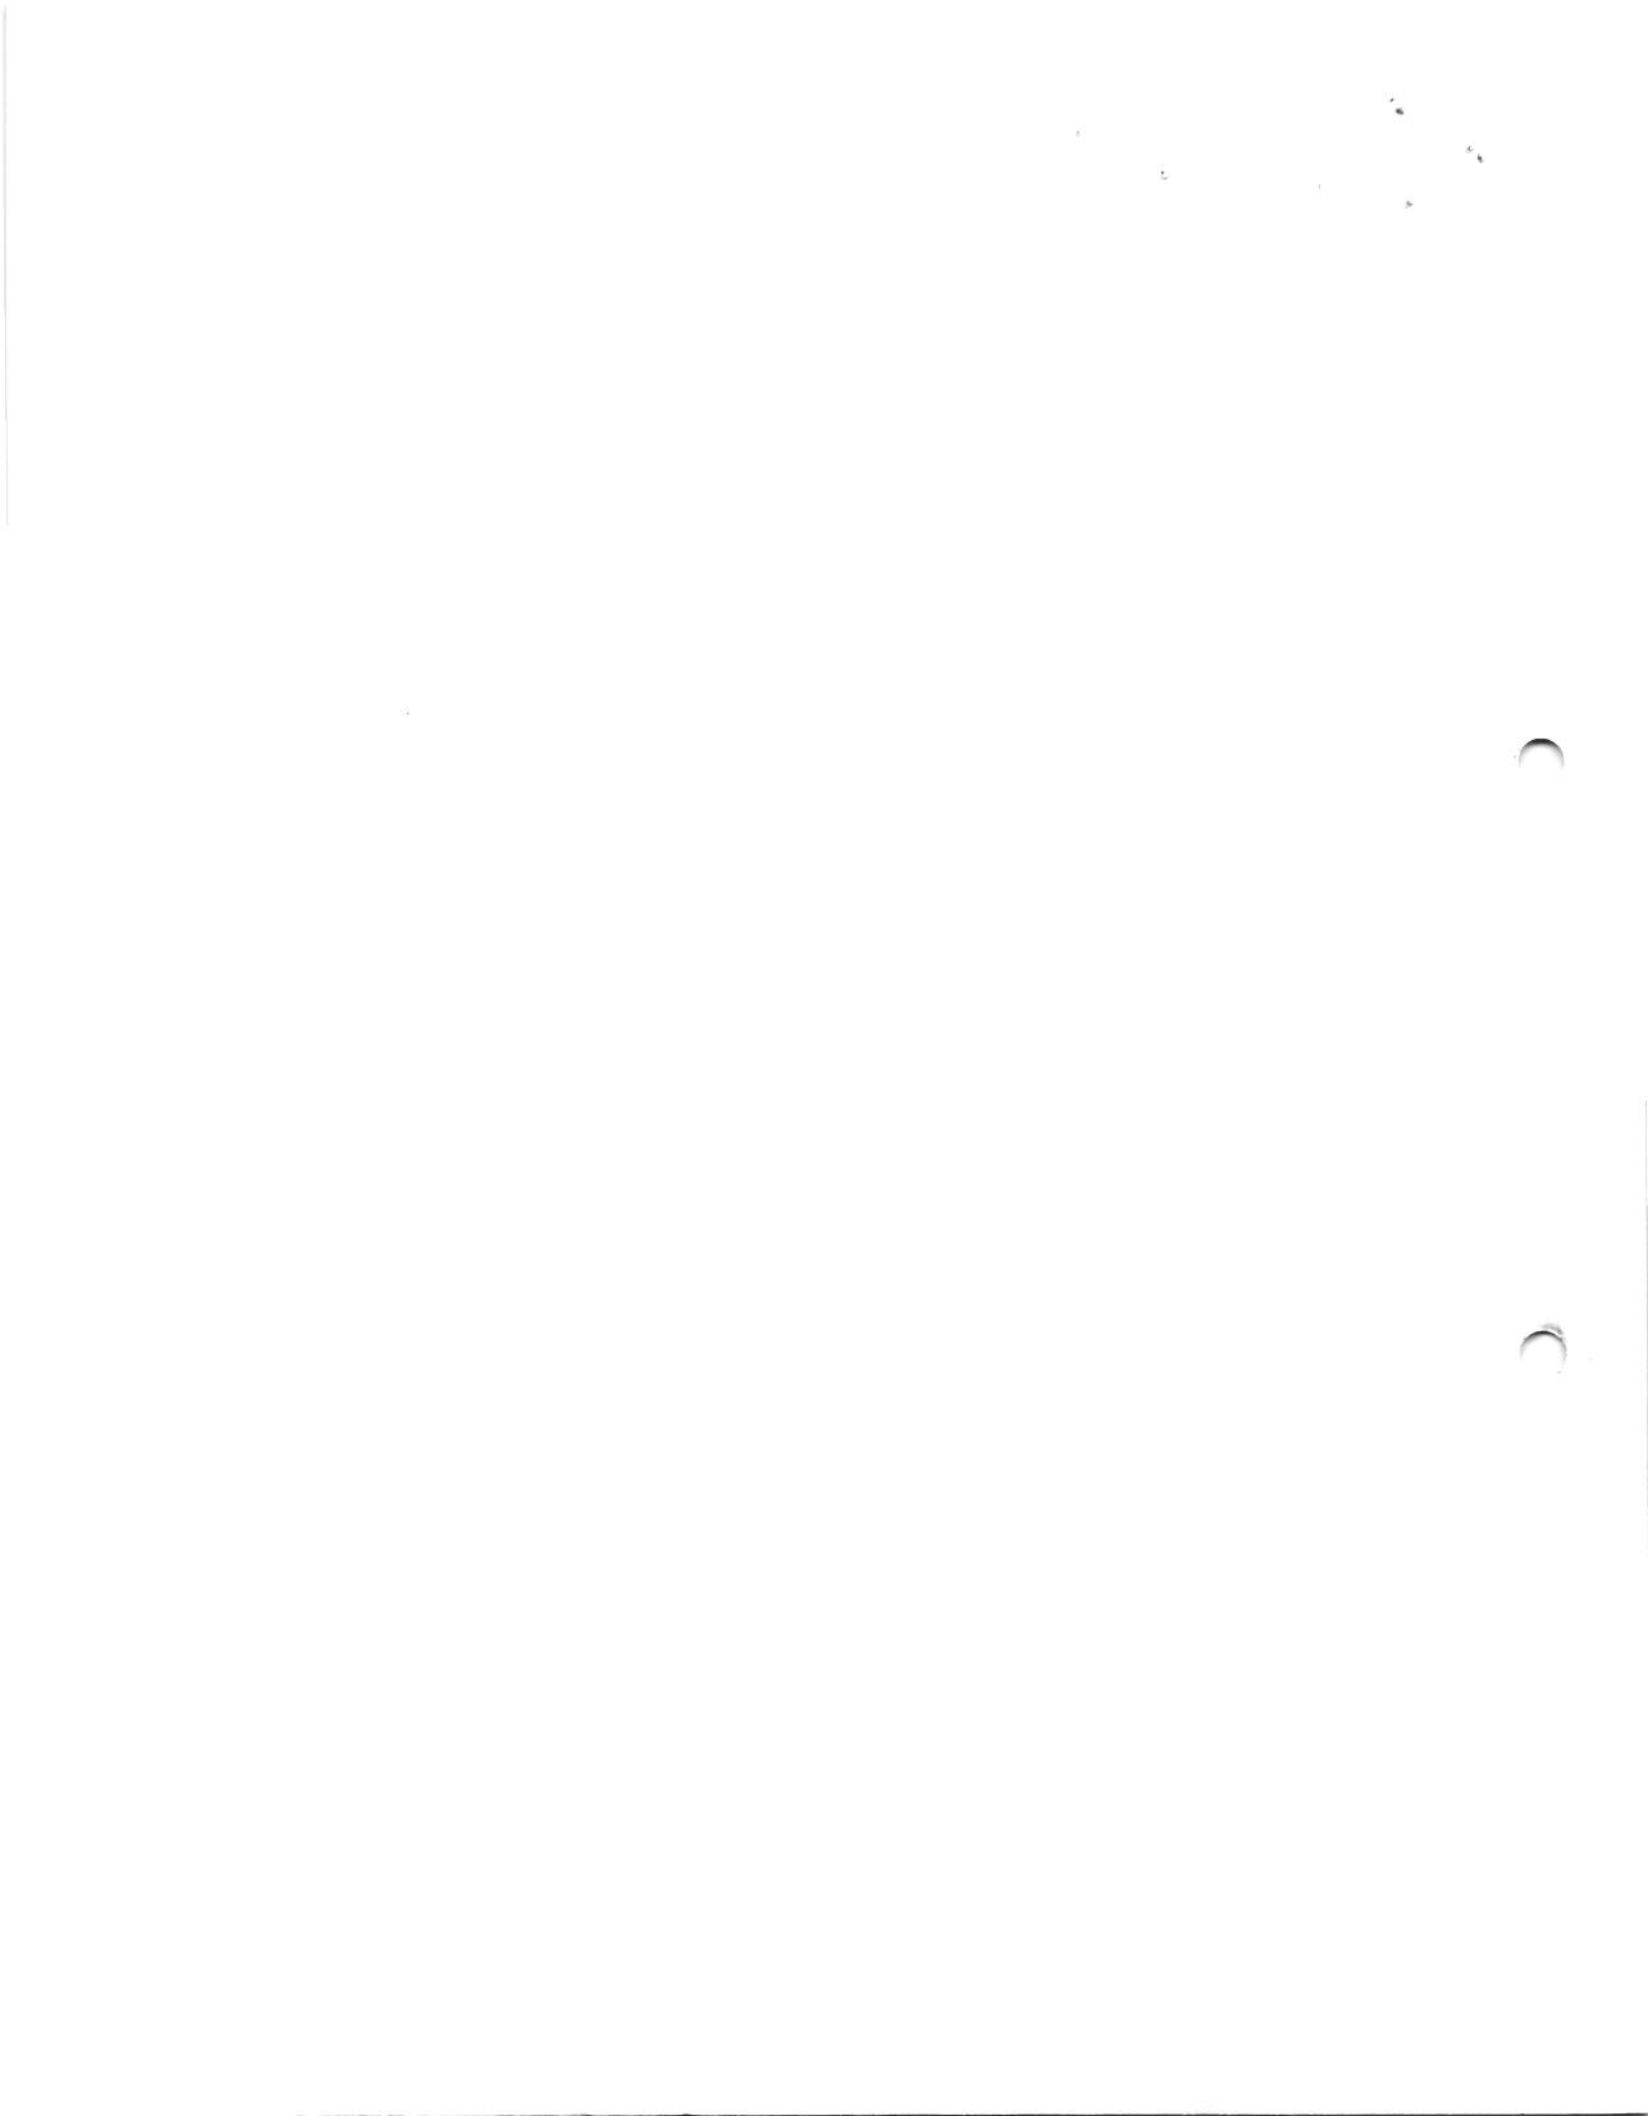

IMPERMEABILIZANTES Y RÓTULOS ROSALES

Pag. 1

VGC870712997
Calle Formosa 175
col. Oceanía
()
844593160

Cotización

No. 032209
Marzo 06 2022
CONTADO
Pago contra entrega
Vence 11/03/2022


CLIENTE
UAAAN

Sin dirección
Teléfonos


Impermeabilizante

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
OLIUR6	Impermeabilización con termofusión en zona "FORESTAL UAAAN"	M2	528	\$380	\$200,640.00
REHALOS	Servicio de mano de obra y materiales para resane en losa	M2	528	\$150.00	\$79,200.00
PINTORA	Pintura por techo interior de edificio	M2	180	\$200.00	\$36,000.00
LIMP01	LIMPIEZA GENERAL DEL AREA	M2	528	\$50.00	\$26,400.00
SEIS MESES DE GARANTIA POR PARTE DE IMPERMEABILIZANTES Y ROTULOS ROSALES		Subtotal			\$342,240.00
		Descuento			\$0.00
		Monto Gravado			16.00%
					\$54,758.40
		TOTAL A PAGAR			

RUSALIS



Representante

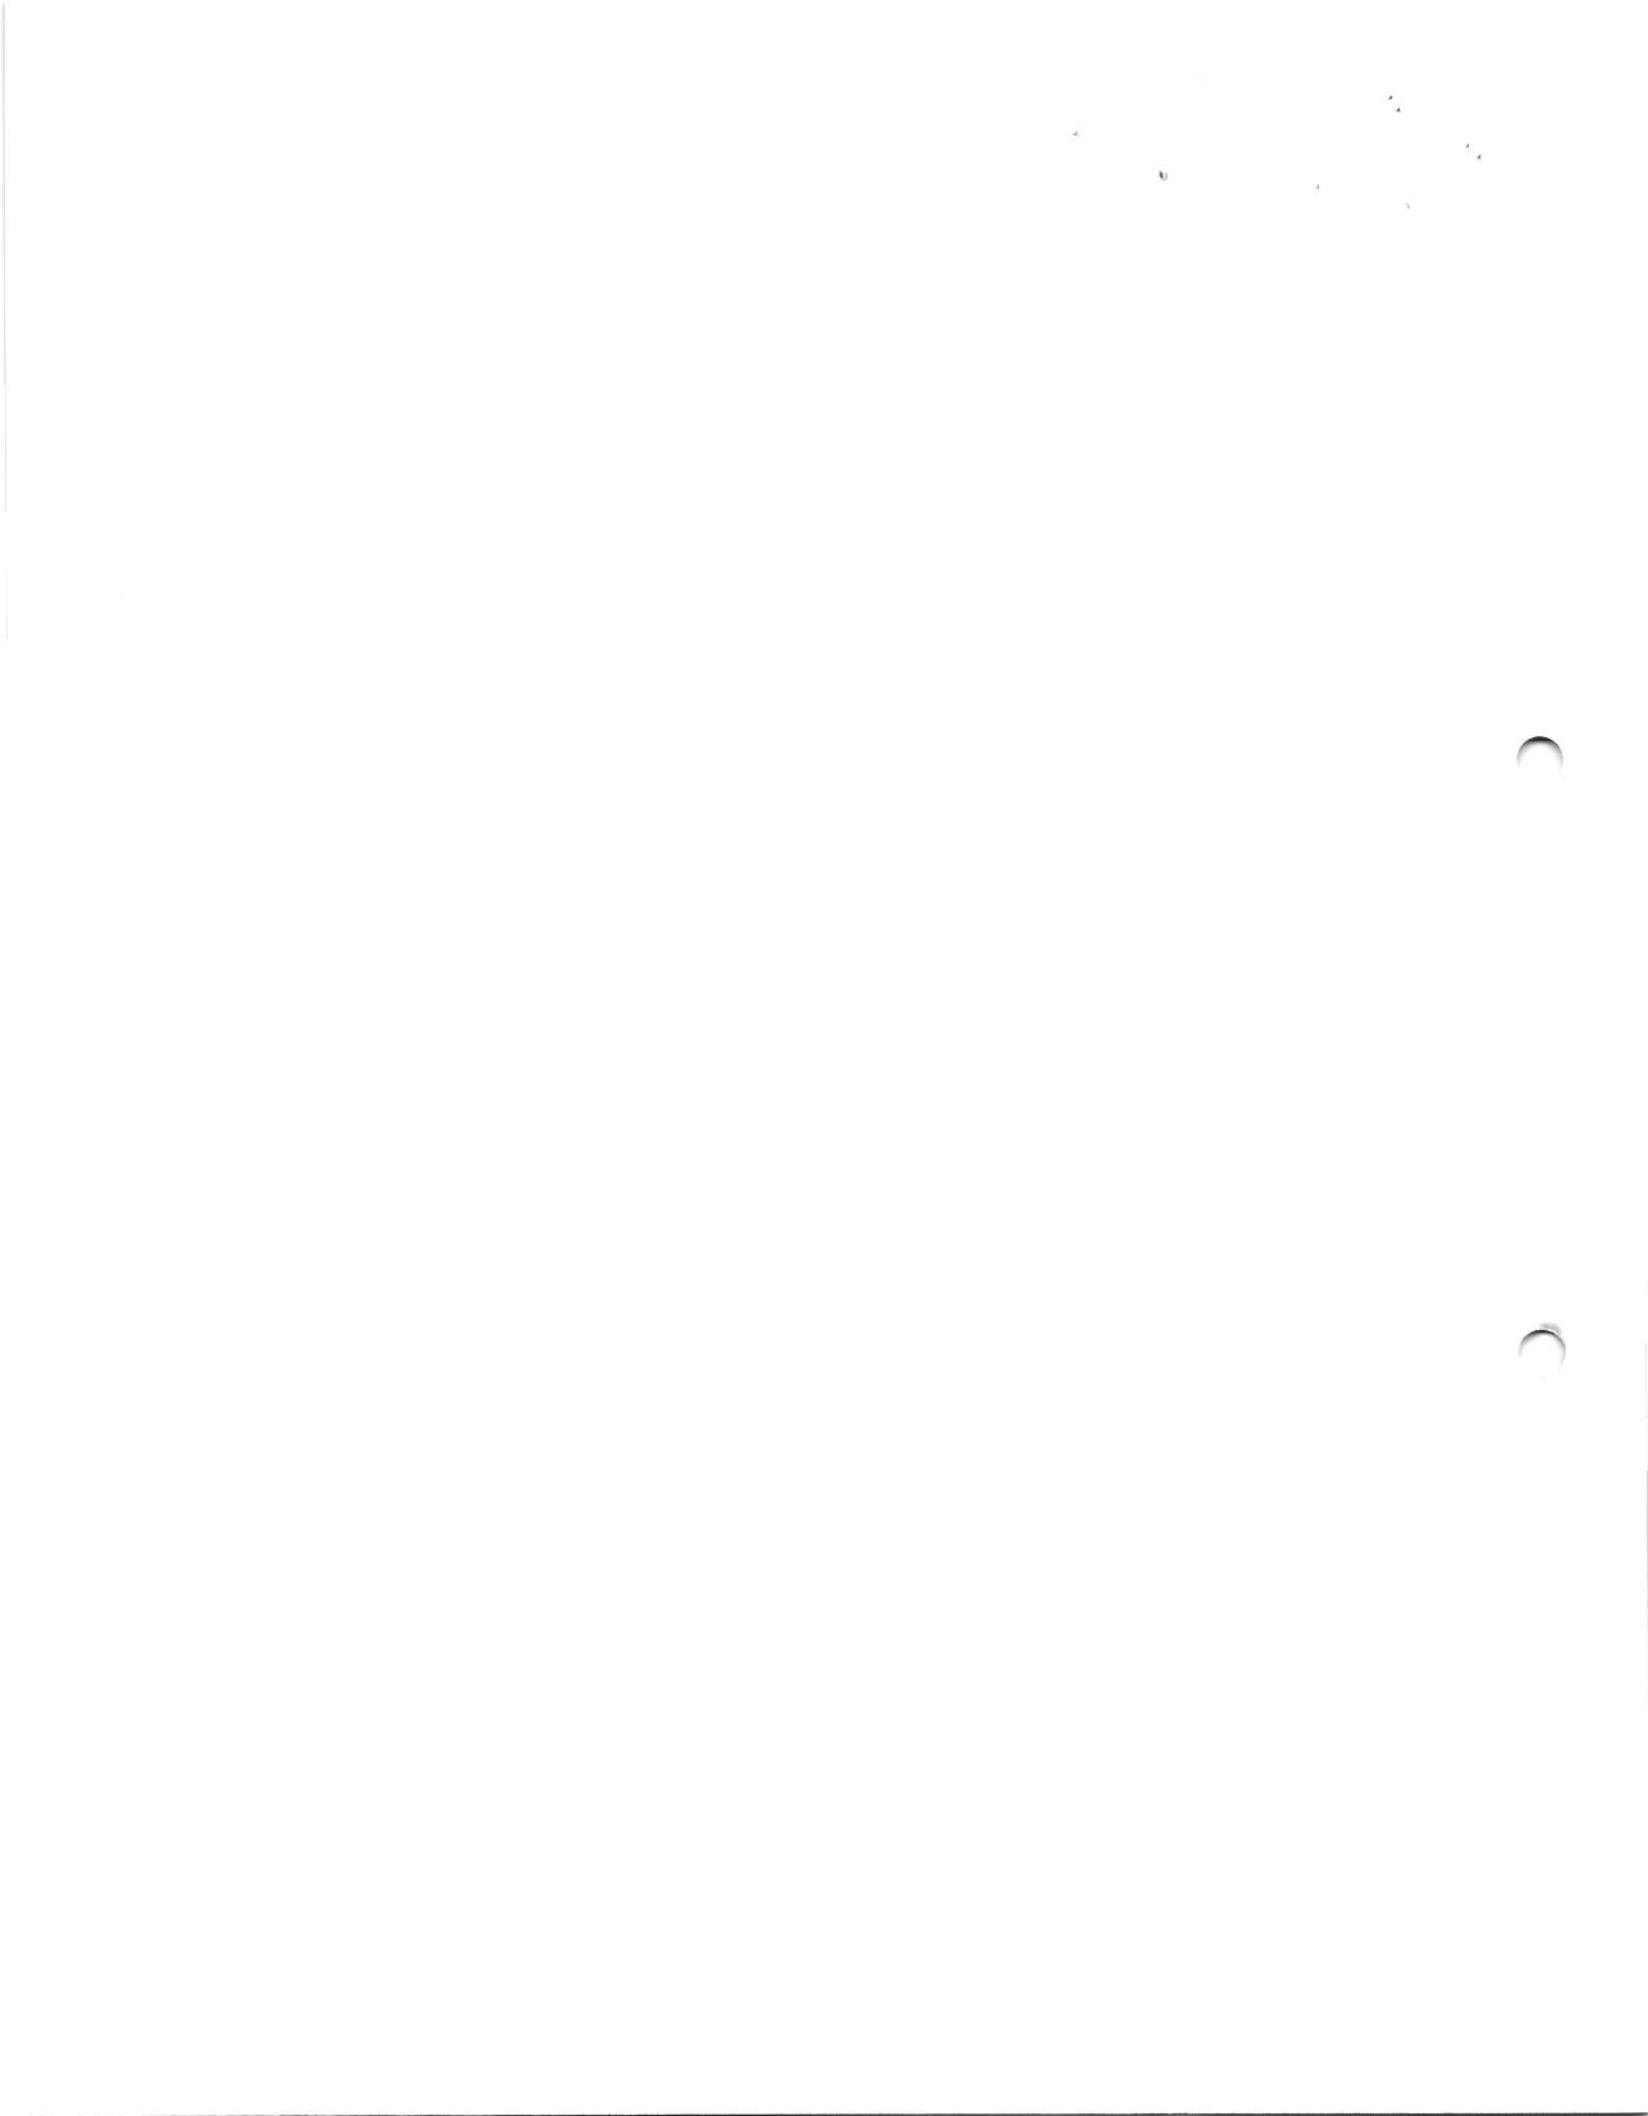

Cotización

BLVAR. ISIDRO LOPEZ ZERTUC 4040
LA SALLE, SALTILLO, COAHUILA
C.P.: 25240 Tel. (81) 430-8088

Cliente: 5
CLIENTE: UAAAN
A
A, 0
1234, ,

Cotización: 060322 Fecha: 06/03/2022
Hora: 17:56 T.C.: _____
Peso: _____ T.E.: NO DEFINIDO

Cve	Producto	Uni. Med	Cant.	Precio	Importe
POLES14	APLICACIÓN DE IMPER POR TERMOFUSION DE PRIMER CALIDAD EN AREA VISITADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD (GARANTIA 6 MESES) AREA FORESTAL	M2	528	\$350.00	\$184,800.00
LIMPBA	LIMPIEZA Y TRASLADO DE BASURA	M2	528	\$80.00	\$42,240.00
PINT1	PINTURA INTERIOR	M2	180	\$170.00	\$30,600.00
ALBAÑILE RIA	RESANE DE LOSA Y ENTORTADO	M2	528	\$80.00	\$42,240.00

Observaciones

Atentamente:
ANDREA VALDÉS
plafones.echeverria1@hotmail.com


Preios sujetos a cambio sin previo aviso

L.A.B. en Nuestras Bodegas



Pesos
SubTotal: \$ 299,880.00
Iva: \$ 47,980.80
Total: \$ 347,860.80

Facturas pagadas via transferencia o depósito realizadas en fin de semana, se surtirán al siguiente día hábil

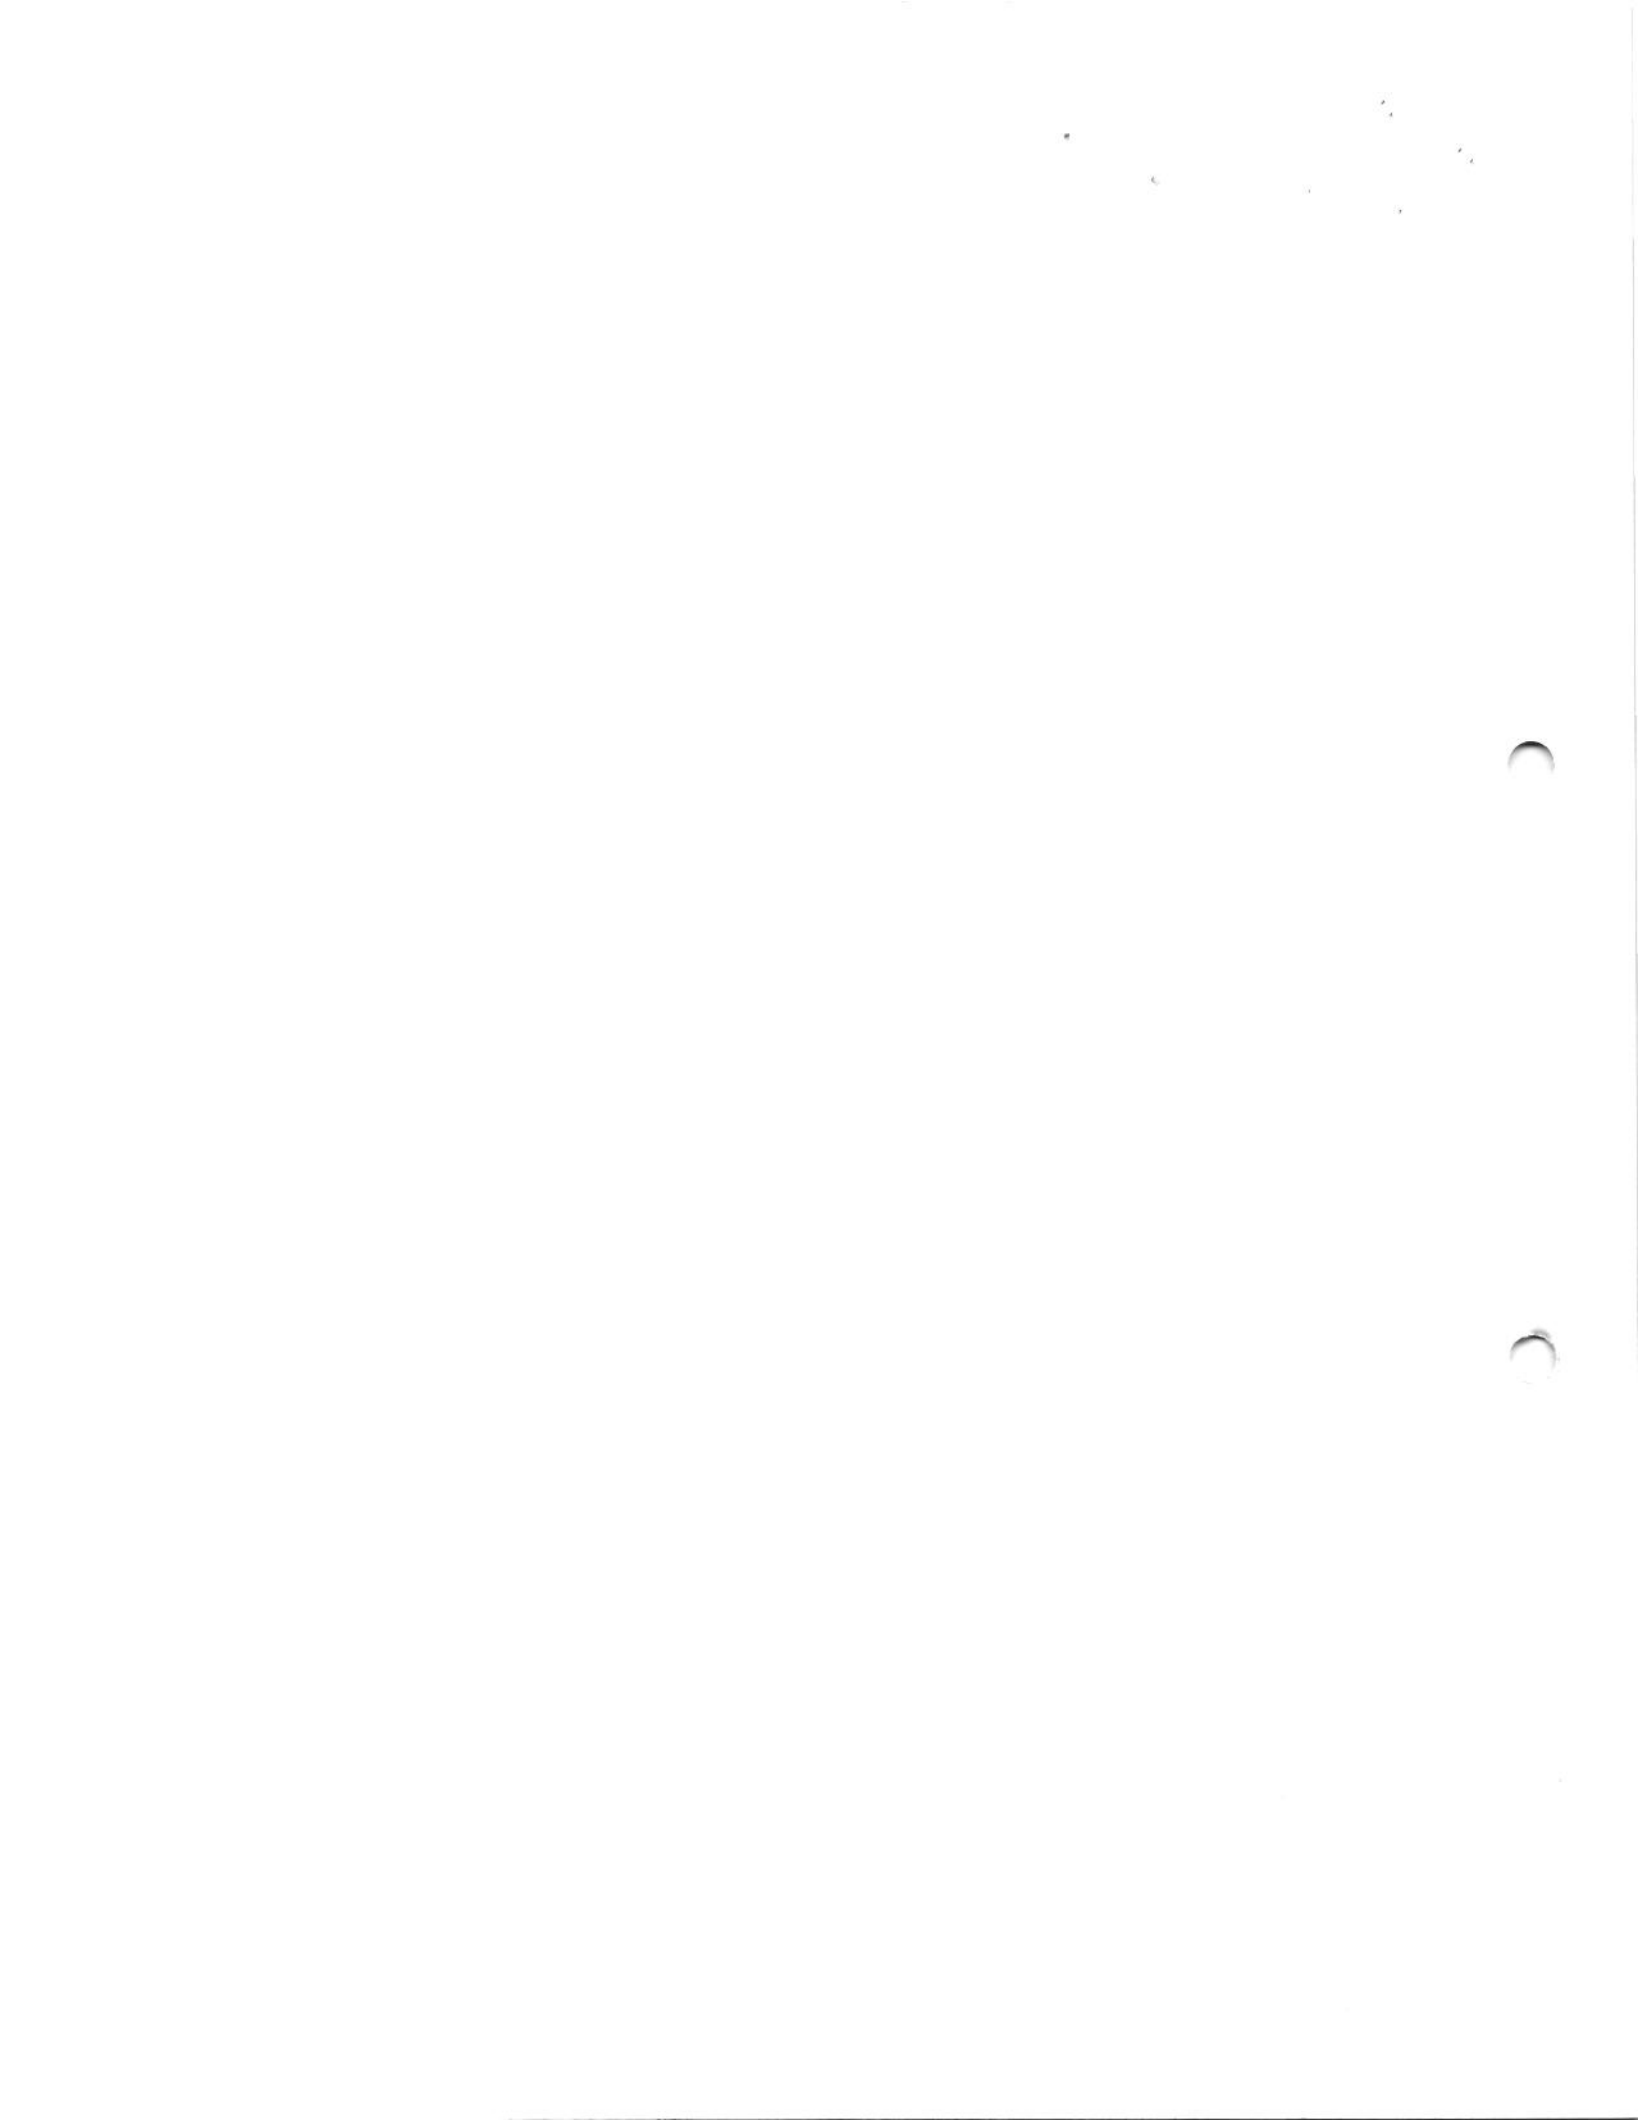



AC Proyectos y Servicios Industriales

Saltillo Coahuila a 10 de Marzo del 2022

ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO

Subdirector de Servicios Generales

PRESENTE;

Por medio de la presente me permito saludarle y hacer de su entero conocimiento el **INICIO** de obra de **IMPERMEABILIZACIÓN CON TERMOFUSIÓN EN EDIFICIO DE FORESTAL** que nos fue asignado, iniciando la obra el día 10 de Marzo del 2022 bajo los conceptos y presupuestos que les hicimos llegar los cuales fueron aprobados.

Sin más por el momento me despido de usted agradeciendo la atención prestada a la presente

Atentamente:

Ing. Jesus Alejandro Alviso Cepeda

Business Development

AC PROYECTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES
PEÑA DE PLATA #969 FRACC. VISTAS DE PEÑA C.P.25096, SALTILLO COAHUILA

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 341

PROBLEM SET 1

Due: 10/10/2011

10/10/2011

1. A particle of mass m moves in a circular path of radius r with constant speed v . Find the magnitude of the centripetal force acting on the particle.

2. A particle of mass m moves in a circular path of radius r with constant speed v . Find the magnitude of the centripetal force acting on the particle.

3. A particle of mass m moves in a circular path of radius r with constant speed v . Find the magnitude of the centripetal force acting on the particle.

4. A particle of mass m moves in a circular path of radius r with constant speed v . Find the magnitude of the centripetal force acting on the particle.



AC Proyectos y Servicios Industriales

Saltillo Coahuila a 28 de Marzo del 2022

ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO
Subdirector de Servicios Generales

PRESENTE:

ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA

Por medio de la presente me permito informarle que la empresa Jesús Alejandro Alviso Cepeda recibe de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro la cantidad de \$167,594.67 (Ciento sesenta y siete mil quinientos noventa y cuatro pesos 67/100 MN) por concepto de finiquito de obra bajo contrato 016/22 AD. MTTO. "IMPERMEABILIZACIÓN CON TERMOFUSIÓN EN EDIFICIO DE FORESTAL "

Dándose por recibido y de conformidad la cantidad antes mencionada.

Sin más por el momento me despido de usted agradeciendo la atención prestada a la presente

Atentamente:

Ing. Jesús Alejandro Alviso Cepeda

Business Development



AC Proyectos y Servicios Industriales

Saltillo Coahuila a 28 de Marzo del 2022

ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO
Subdirector de Servicios Generales

PRESENTE:


Por medio de la presente me permito saludarle y hacer de su entero conocimiento el **TERMINO** de obra de **IMPERMEABILIZACIÓN CON TERMOFUSIÓN EN EDIFICIO DE FORESTAL** que nos fue asignado, iniciando la obra el día 10 de Marzo del 2022 bajo los conceptos y presupuesto que les hicimos llegar los cuales fueron aprobados, y dando fin a esta obra el día 19 de Marzo del 2022.

Sin más por el momento me despido de usted agradeciendo la atención prestada a la presente

Atentamente:

Ing. Jesus Alejandro Alviso Cepeda

Business Development

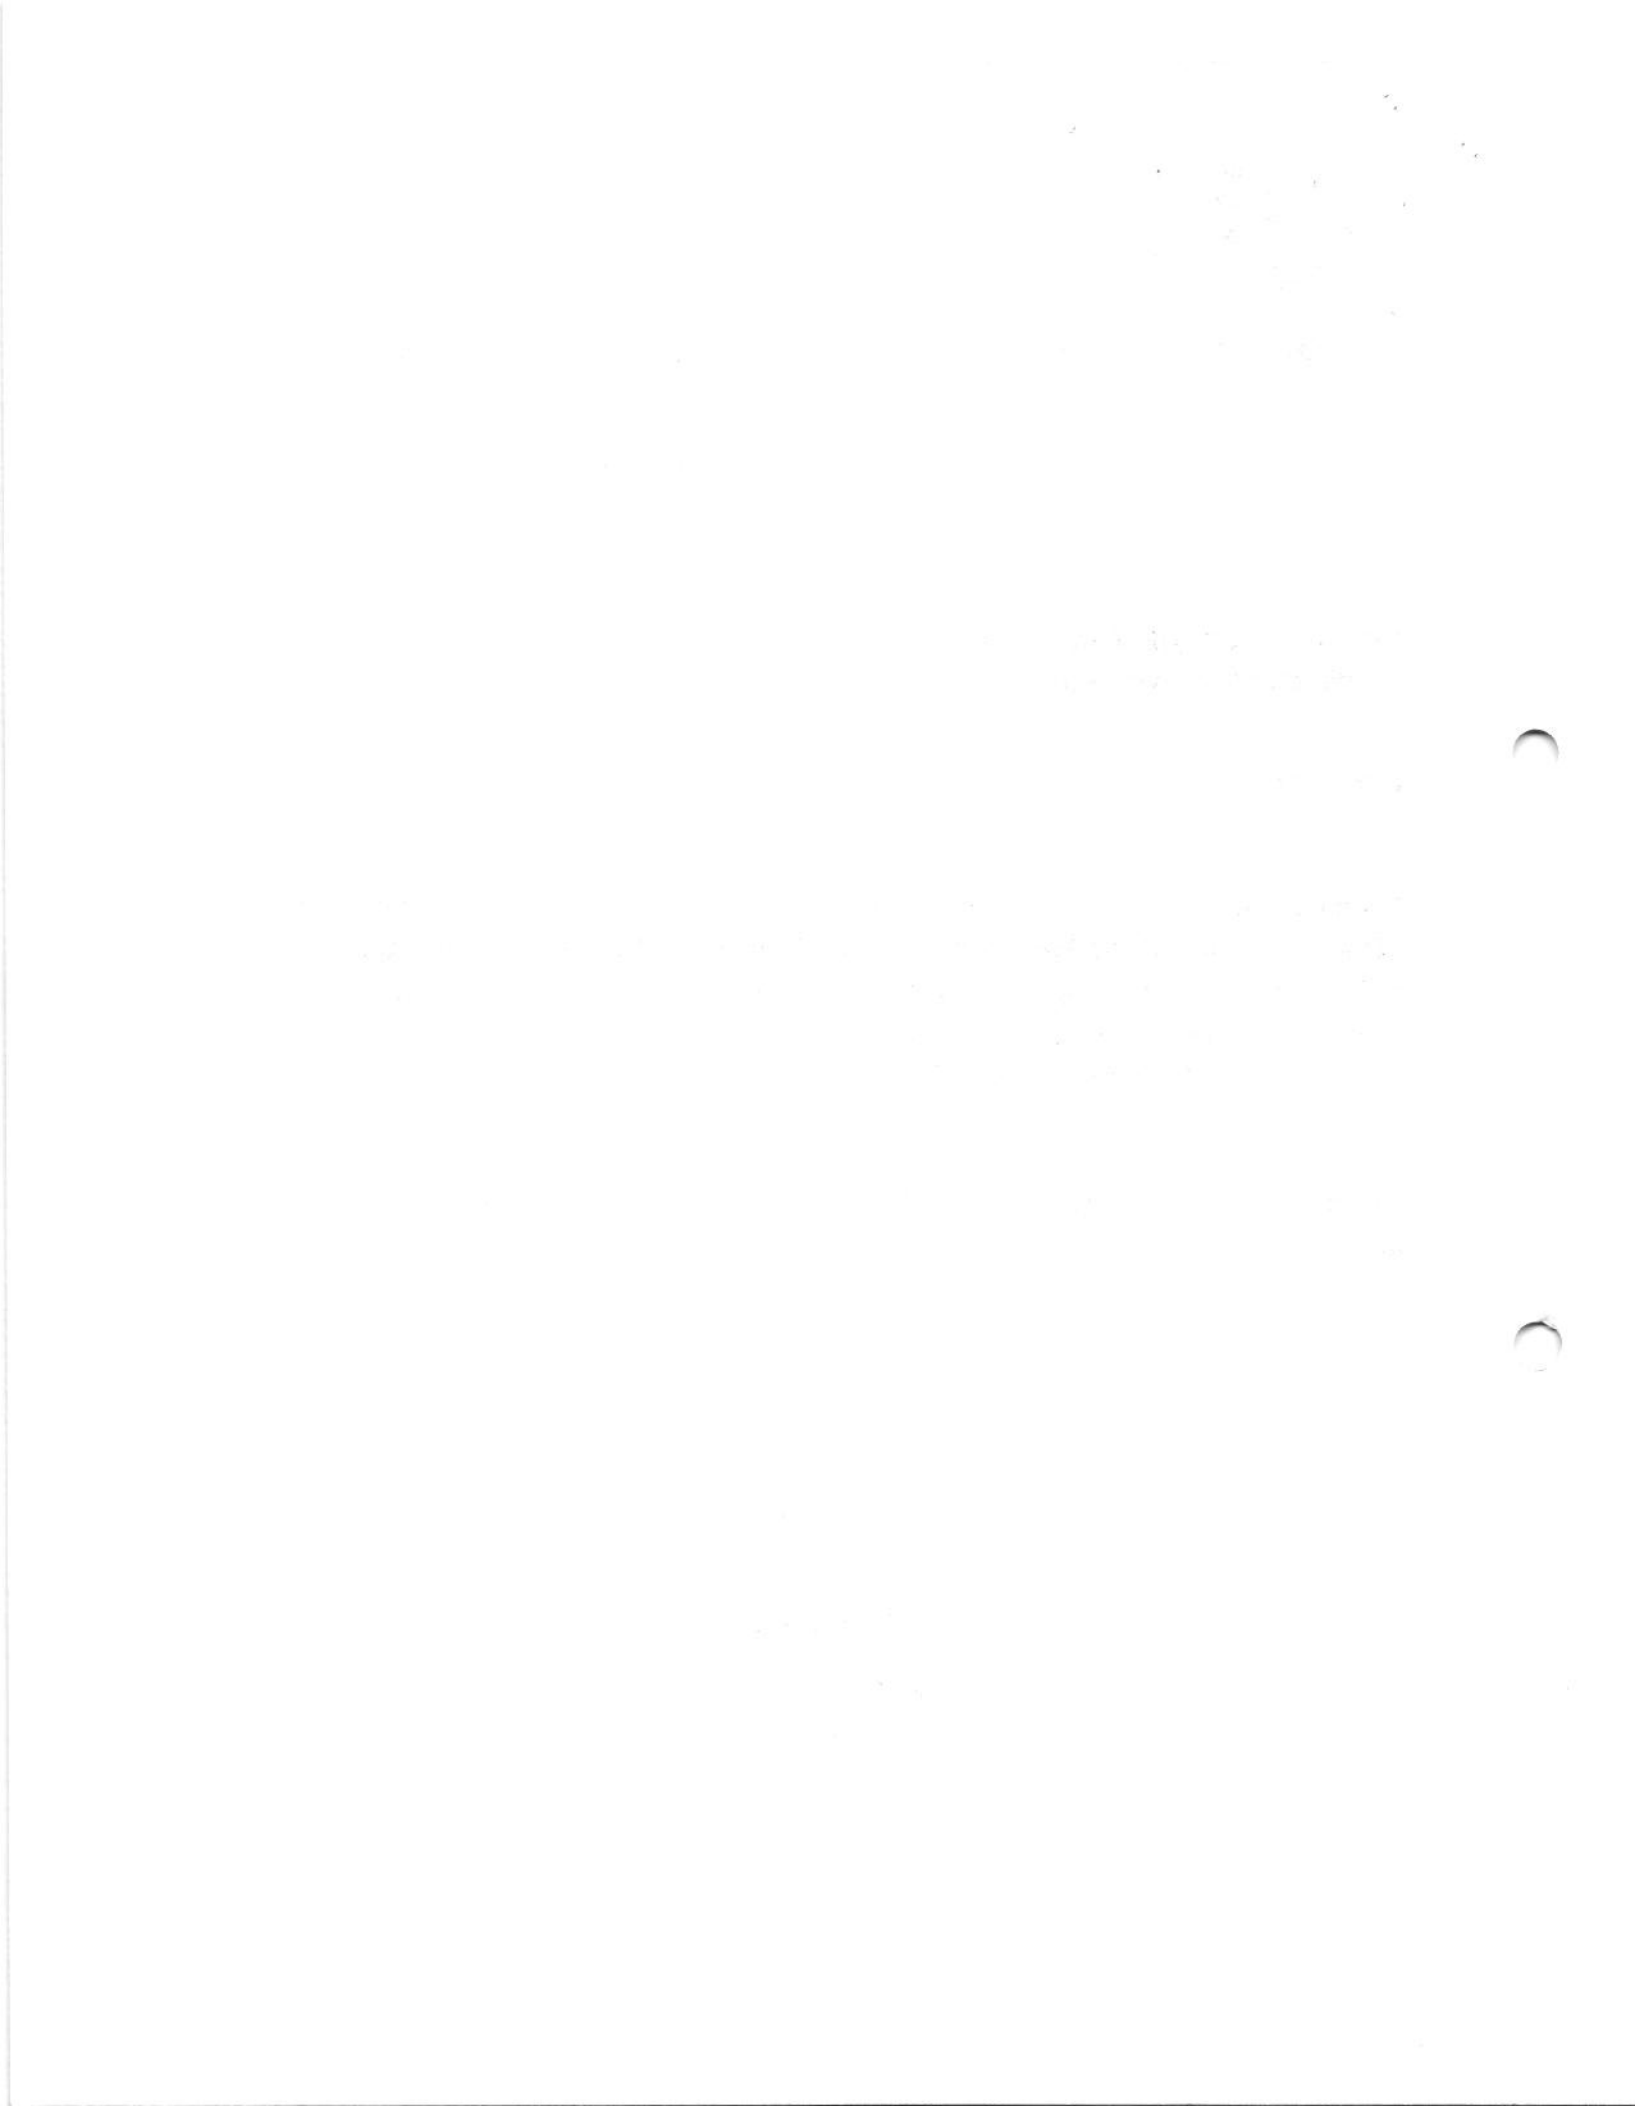



BITACORA

PROYECTO: IMPERMEABILIZACION CON TERMOFUSION EN EDIFICIO FORESTAL

Dia 1:

Lunes 14 de Marzo del 2022. Se dio por iniciado el proyecto haciendo una limpieza general de área (techo) edificio forestal y retirando los residuos del impermeabilizante anterior

Dia 2:

Martes 15 de Marzo del 2022. Entortado de pasta para corregir pendiente en losa



Reunys

[Handwritten signature]








AC Proyectos y Servicios Industriales

Día 3:

Miércoles 16 de Marzo del 2022. Aplicación de sello en losa para tapar grietas



Revisado

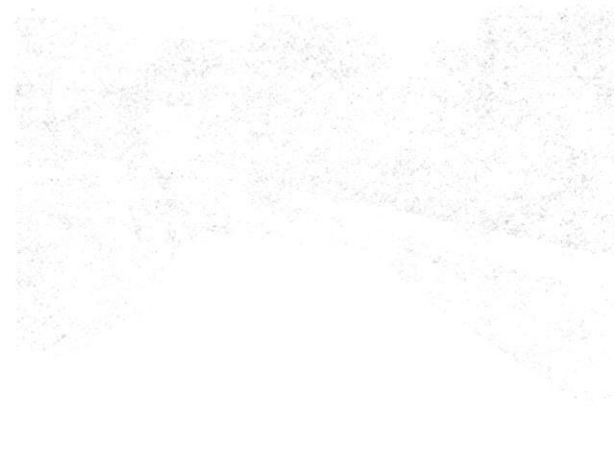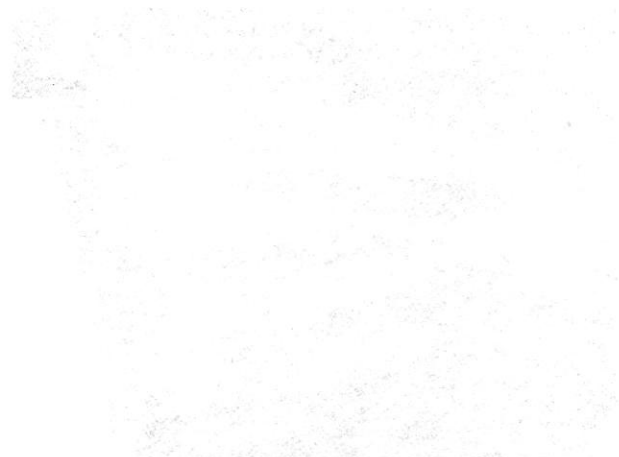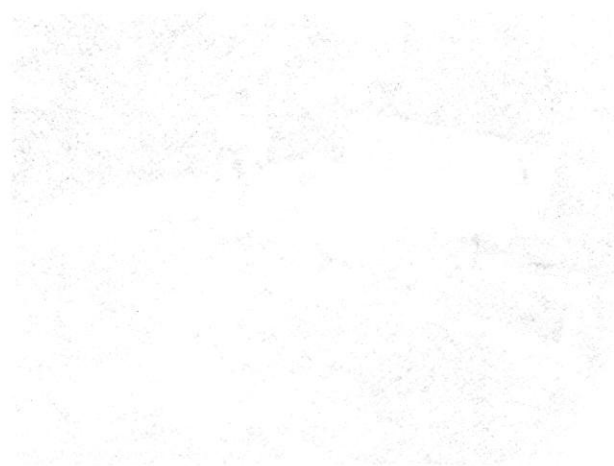




AC Proyectos y Servicios Industriales

Día 4:

Jueves 17 de Marzo del 2022. Inicia la aplicación de impermeabilizante con termofusión



Resumen
[Handwritten signature]

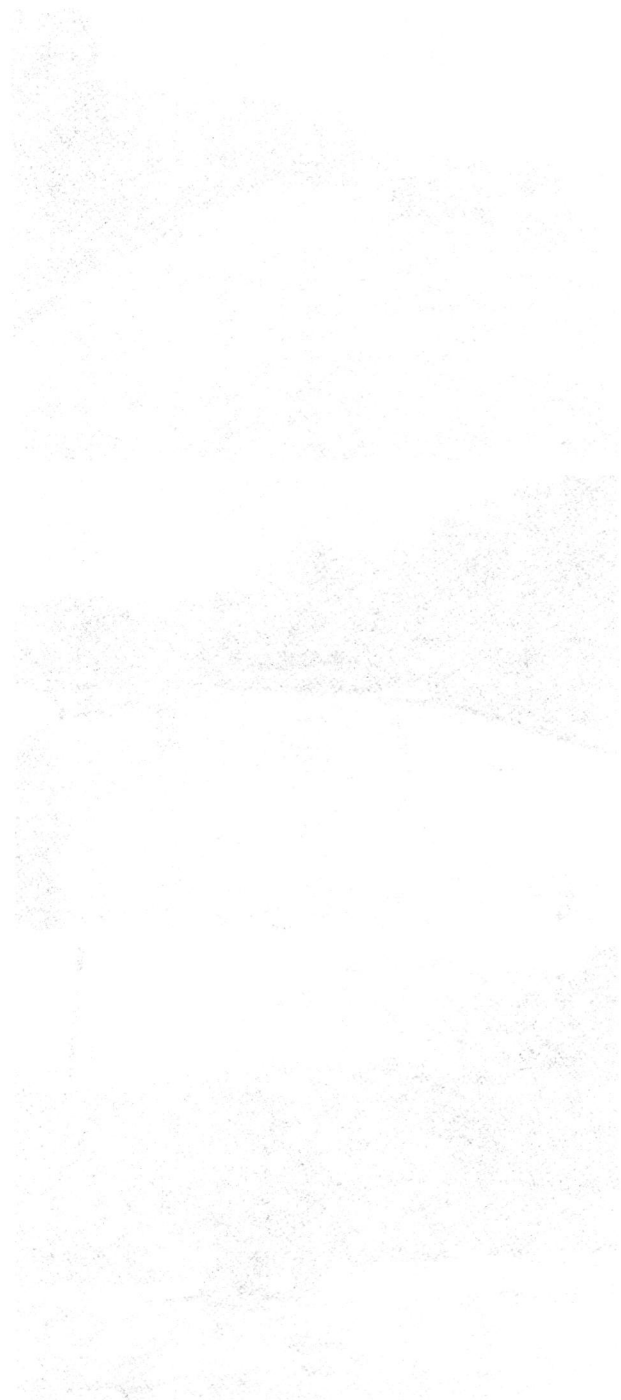




AC Proyectos y Servicios Industriales

Día 5:

Viernes 18 de Marzo del 2022. Se termina de aplicar termofusión

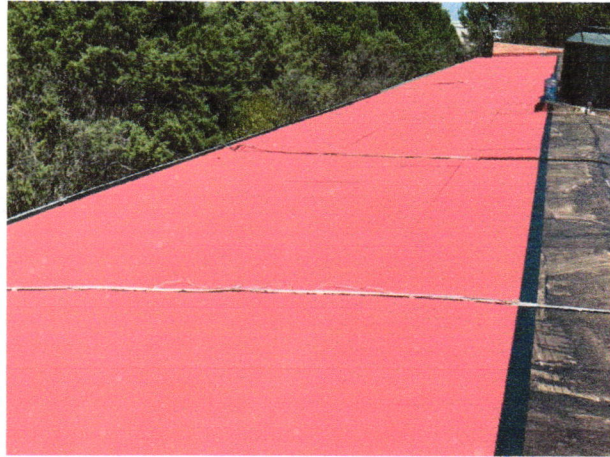

Ramiro

[Handwritten signature]





AC Proyectos y Servicios Industriales

Día 6:

Sábado 19 de Marzo del 2022. Demolición de yeso dañado para eliminar hongos por humedad, aplicación de yeso nuevo y pintura



Renovar





NOTA:

El Sábado 19 de Marzo de 2022 damos por terminada la obra denominada **"IMPERMEABILIZACION CON TERMOFUSION EN EDIFICIO FORESTAL"** con el número de contrato **016/22 AD. MTTO**. Cumpliendo con todos los conceptos solicitados en el contrato antes mencionado por el departamento de obras y mantenimiento de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

2000
10/10/00
10/10/00





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas

Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



CONTRATO DE OBRA Y MANTENIMIENTO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, A LA QUE EN LO SUCESIVO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "LA UNIVERSIDAD", REPRESENTADA POR EL MC. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y APODERADO LEGAL DE LA UNIVERSIDAD PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y POR LA OTRA EL C. JESUS ALEJANDRO ALVISO CEPEDA, POR SUS PROPIOS DERECHOS, A QUIEN SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA. -" LA UNIVERSIDAD " DECLARA:

I. DECLARA "LA UNIVERSIDAD"

1. Que de conformidad con el artículo 1º. de la Ley Orgánica publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 26 de Abril de 2006, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que basada en el principio de su autonomía tiene como objetivos fundamentales: I. Impartir educación superior en el campo de las ciencias agrarias y sus afines para formar profesionistas con juicio crítico, humanista, democrático y nacionalista, capaces de contribuir a la solución de los problemas en el medio rural. II. Realizar investigación en las áreas científicas de su competencia que favorezcan al desarrollo social y económico, integral, armónico e independiente tanto de la república y sus regiones como del estado, y III. Preservar, promover y acrecentar la cultura, la ciencia y la tecnología, en un proceso de intercambio sistemático con la sociedad, para contribuir al desarrollo rural de manera integral.
2. Que en su representación comparece el **M.C. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ**, en su carácter de **DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO** y apoderado general para actos de administración, quien acredita su personalidad mediante el poder general para actos de administración y para la suscripción de títulos de crédito que le fue otorgado por el **DR. MARIO ERNESTO VAZQUEZ BADILLO**, en su carácter de **RECTOR** de "LA UNIVERSIDAD", mediante instrumento público número (64) sesenta y cuatro, siendo las (09:00) nueve horas de fecha martes (25) veinticinco de Agosto de (2020) dos mil veinte, otorgado ante la fe del notario público número (127) ciento veintisiete, Lic. Demián Enrique Maldonado Pámanes.
3. Que la Universidad requiere la realización de la obra **IMPERMEABILIZACION CON TERMOFUSION DE 4 MM. EN EL EDIFICIO DE FORESTAL.**
4. Que la Universidad cuenta con la suficiencia presupuestal, para cubrir la realización de la obra **IMPERMEABILIZACION CON TERMOFUSION DE 4 MM. EN EL EDIFICIO DE FORESTAL** en los términos que se precisan en el anexo I del presente contrato.
5. Que la celebración del presente contrato se realizó por el Procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamento en lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados



Faint header text, possibly containing a title or reference number.

Main body of faint text, appearing to be a list or series of entries.

Section of faint text, possibly a sub-header or a specific category label.

Section of faint text, continuing the list or entries.

Section of faint text, possibly a concluding paragraph or a summary.

Final section of faint text at the bottom of the page.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas

Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315

Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



con las Mismas, adjudicándose a "EL CONTRATISTA", el contrato relativo a la realización de la obra IMPERMEABILIZACION CON TERMOFUSION DE 4 MM. EN EL EDIFICIO DE FORESTAL que se precisan en el anexo I del presente contrato.


6. Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el número UAA-750303-NHA.
7. Que tiene establecido su domicilio en el edificio de "La Dirección General Administrativa" ubicado en la Calzada Antonio Narro número 1923, colonia Buenavista, en Saltillo, Coahuila, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

SEGUNDA. - "EL CONTRATISTA" DECLARA:

1. Que es una Persona Física con actividad empresarial, según su alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
2. Que tiene la capacidad jurídica para celebrar el presente contrato con "LA UNIVERSIDAD", y para ello cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para cumplir con su objeto.
3. Que es una persona física que se encuentra en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el número AICJ780509T22.
4. Que declara bajo protesta de decir verdad que formaliza este contrato con la seguridad que ninguno de los dueños o directivos de "EL PROVEEDOR", se encuentra desempeñando un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, o están inhabilitados para desempeñarlos y por consecuencia declara con la misma formalidad, que no tiene parentesco con los Servidores Públicos que decidieron directamente sobre la adjudicación de este contrato, no existiendo ningún impedimento de tipo legal para formalizarlo.
5. Que conoce debidamente el sitio en donde se realizará el **SERVICIO** objeto de este contrato, por lo que considera todos los factores que intervienen para su ejecución.
6. Que, para los fines y efectos legales del presente contrato, señala como su domicilio: Priv. Fray Landín #206, Fracc. Santa María en Saltillo, Coah., C.P. 25019, correo electrónico jaalviso@hotmail.com, tel. 844 880 2688.
7. Que de acuerdo con el Decreto de reformas por el que se modifican diversas Leyes Fiscales y otros ordenamientos federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1998, manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de conformidad con las disposiciones tributarias vigentes.

III.- DE AMBAS PARTES

1. Que se reconocen la personalidad con la que acuden a la firma del presente instrumento.
2. Que cuenta con la capacidad técnica, económica y moral para dar cumplimiento al objeto de este contrato.
3. Que este contrato se celebra en función del Procedimiento de Adjudicación Directa del contrato número 016/22 AD. MTTO.

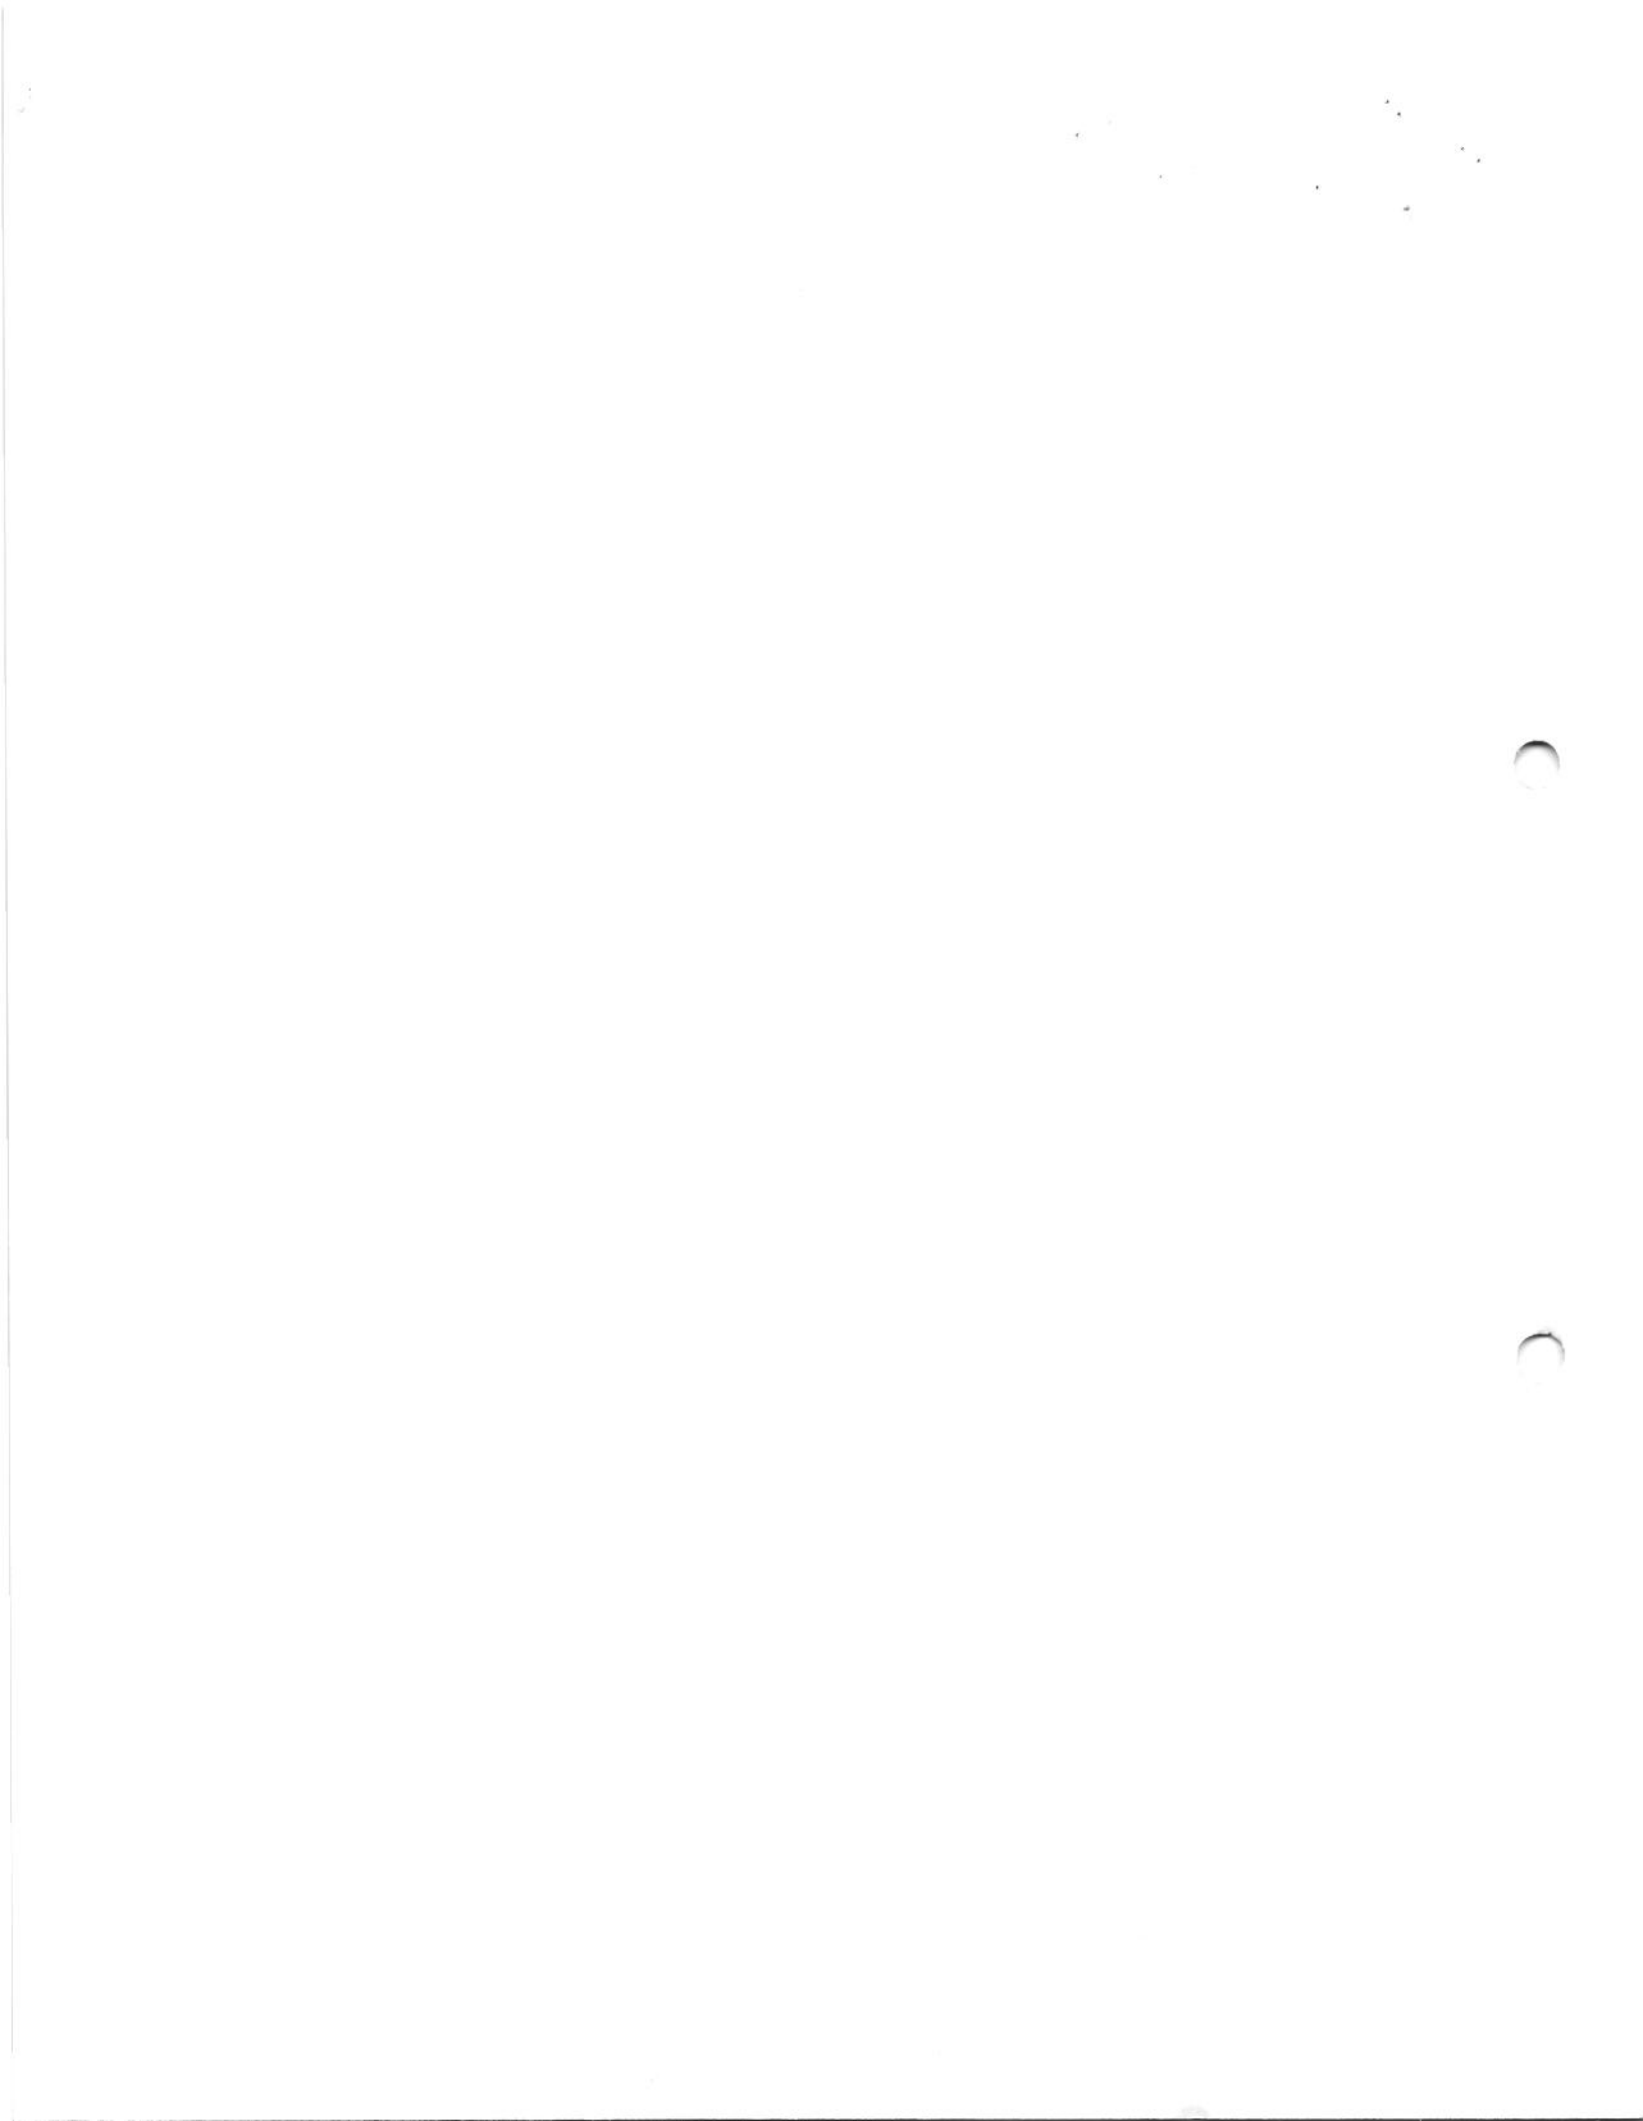



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas

Buenvista, Saltillo, Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



CLAUSULAS


PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. -

1. "LA UNIVERSIDAD" Encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de una obra consistente en IMPERMEABILIZACION CON TERMOFUSION DE 4 MM. EN EL EDIFICIO DE FORESTAL335, y este se obliga a realizarla hasta su total terminación acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos de este contrato, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas cláusulas. En caso de que "EL CONTRATISTA" construya por su propia decisión una obra que no esté especificada en el contrato lo hará bajo su propia cuenta y riesgo, siendo además responsable, en tal supuesto, de los daños y perjuicios que cause "LA UNIVERSIDAD" o a terceros.
2. Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante del presente contrato.
3. Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante del presente contrato.
4. Queda entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos, materia de este contrato, formarán parte del mismo y su uso será obligatorio.
5. Lo anterior en base a la propuesta presentada en el procedimiento citado.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es de: \$243,420.00 (doscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N.) antes de I.V.A. más la cantidad de \$38,947.20 (treinta y ocho mil novecientos cuarenta y siete pesos 20/100 M.N.), menos la cantidad de \$3,042.75 (tres mil cuarenta y dos pesos 75/100 M.N.), sumando un monto total de **\$279,324.45** (doscientos setenta y nueve mil trescientos veinticuatro pesos 45/100 M.N.) IVA incluido.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. - "EL CONTRATISTA" Se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el día **10 de marzo de 2022** y a terminar a más tardar el día **31 de marzo de 2022**, de conformidad con el programa por concepto y con erogaciones mensuales de la obra que se anexa al presente contrato.

1. El plazo pactado para la ejecución de la obra solo podrá ser prorrogado por decisión de "LA UNIVERSIDAD". Si en el desarrollo de los trabajos se presentaran circunstancias por las cuales "LA UNIVERSIDAD" estimará necesario modificar el programa a que se refiere esta cláusula, o bien en el caso de que "EL CONTRATISTA" se viere obligado a solicitar variación a dicho programa por causas no imputables a él, debidamente justificadas y dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, después de que hubiere(n) ocurrido la(s) causa(s) que apoyen su solicitud, "LA UNIVERSIDAD" establecerá la reforma que juzgue pertinente y hará del conocimiento de "EL CONTRATISTA" las modificaciones que apruebe, y

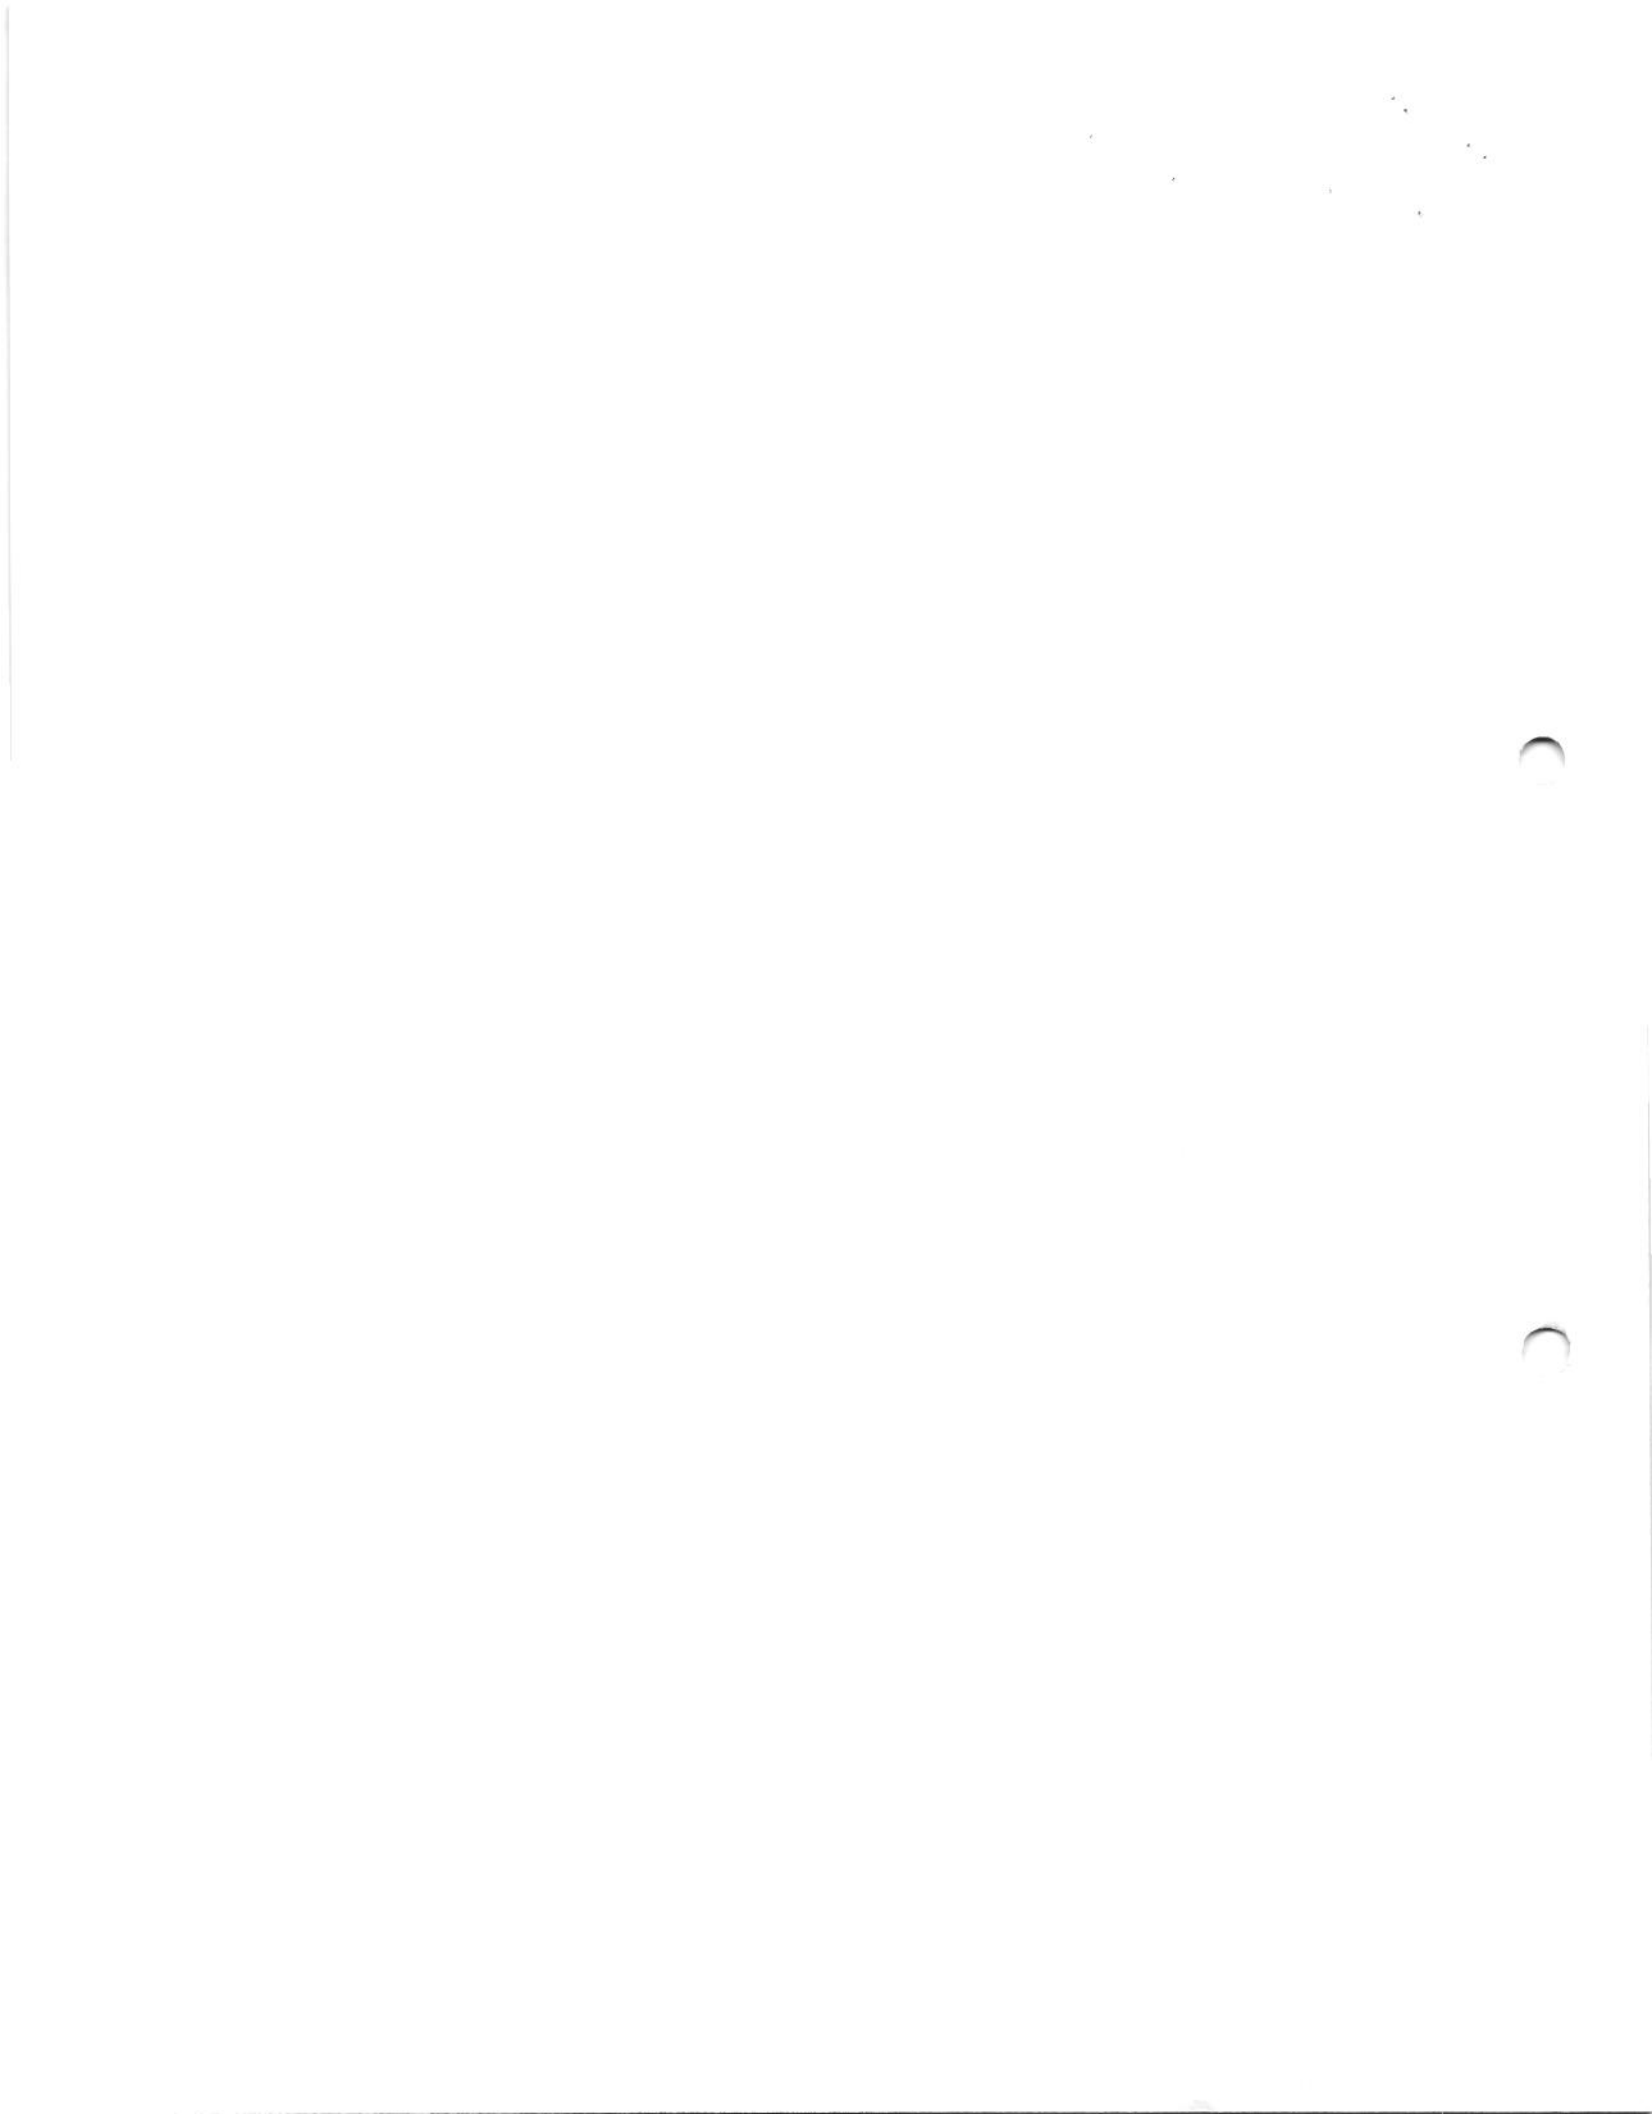



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas

Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



este último a su vez, quedará obligado a aceptarla. Estas modificaciones, o en su caso el nuevo programa que se formulare, se consideraran incorporados a este contrato y, por lo tanto, obligatorio para las partes.

Renguel

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "LA UNIVERSIDAD" Se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, debiendo "EL CONTRATISTA" prever y obtener los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización.


QUINTA. - ANTICIPOS. - Para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato "LA UNIVERSIDAD" SE DARA EL 40% DE ANTICIPO.

1. En los casos de rescisión de contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a "LA UNIVERSIDAD" en un plazo no mayor de veinte días naturales contados a partir de la fecha en que sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA".
2. "EL CONTRATISTA" que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, cubrirá los cargos que resulten conforme a una tasa que será igual a la establecida en las leyes fiscales del estado de Coahuila de Zaragoza en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales.
3. Igual procedimiento se utilizará para que "EL CONTRATISTA", en su caso, reintegre a "LA UNIVERSIDAD" las cantidades que, en cualquier forma, hubiere recibido en exceso para la contratación o durante la ejecución de la obra.

SEXTA. - FORMA DE PAGO. - "LA UNIVERSIDAD" pagará a "EL CONTRATISTA" hasta el 90% del monto del contrato, quedando el 10% restante para ser pagado mediante la presentación del acta de recepción y entrega y la estimación de finiquito correspondiente.

SEPTIMA. - GARANTÍAS. - Además de la garantía del anticipo mencionado en la cláusula quinta, "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir, las siguientes garantías:

1. **Fianza de Anticipo:** Consistente en el 100% del monto total del anticipo otorgado, deberá garantizarse con **CHEQUE** expedido por "EL CONTRATISTA" a favor de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Se presentará antes de la entrega del anticipo.
2. **Fianza de Cumplimiento Del Contrato:** Consistente en el 10% del monto total del contrato antes de IVA, deberá garantizarse con **CHEQUE** expedido por "EL CONTRATISTA" a favor de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Se presentará antes del trámite de firma del contrato. No aplica, ya que se realizaron los trabajos y posteriormente se pagará el trabajo realizado.
3. **Fianza Para Responder de Obra Mal Ejecutada o Vicios Ocultos.** - Se constituirá **CHEQUE** expedido por "EL CONTRATISTA" por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato, a favor de "LA UNIVERSIDAD" Autónoma Agraria Antonio Narro, que se presentará el día de la entrega recepción de la obra, si transcurrido este plazo no hubiere otorgado la fianza respectiva "LA UNIVERSIDAD" podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. La fianza garantizará defectos de calidad o de construcción, vicios ocultos, daños y perjuicios que, por inobservancia o negligencia del contratista, se lleguen a causar a terceros, así como el pago de adeudos contraídos por "EL CONTRATISTA" con "LA UNIVERSIDAD", durante la ejecución

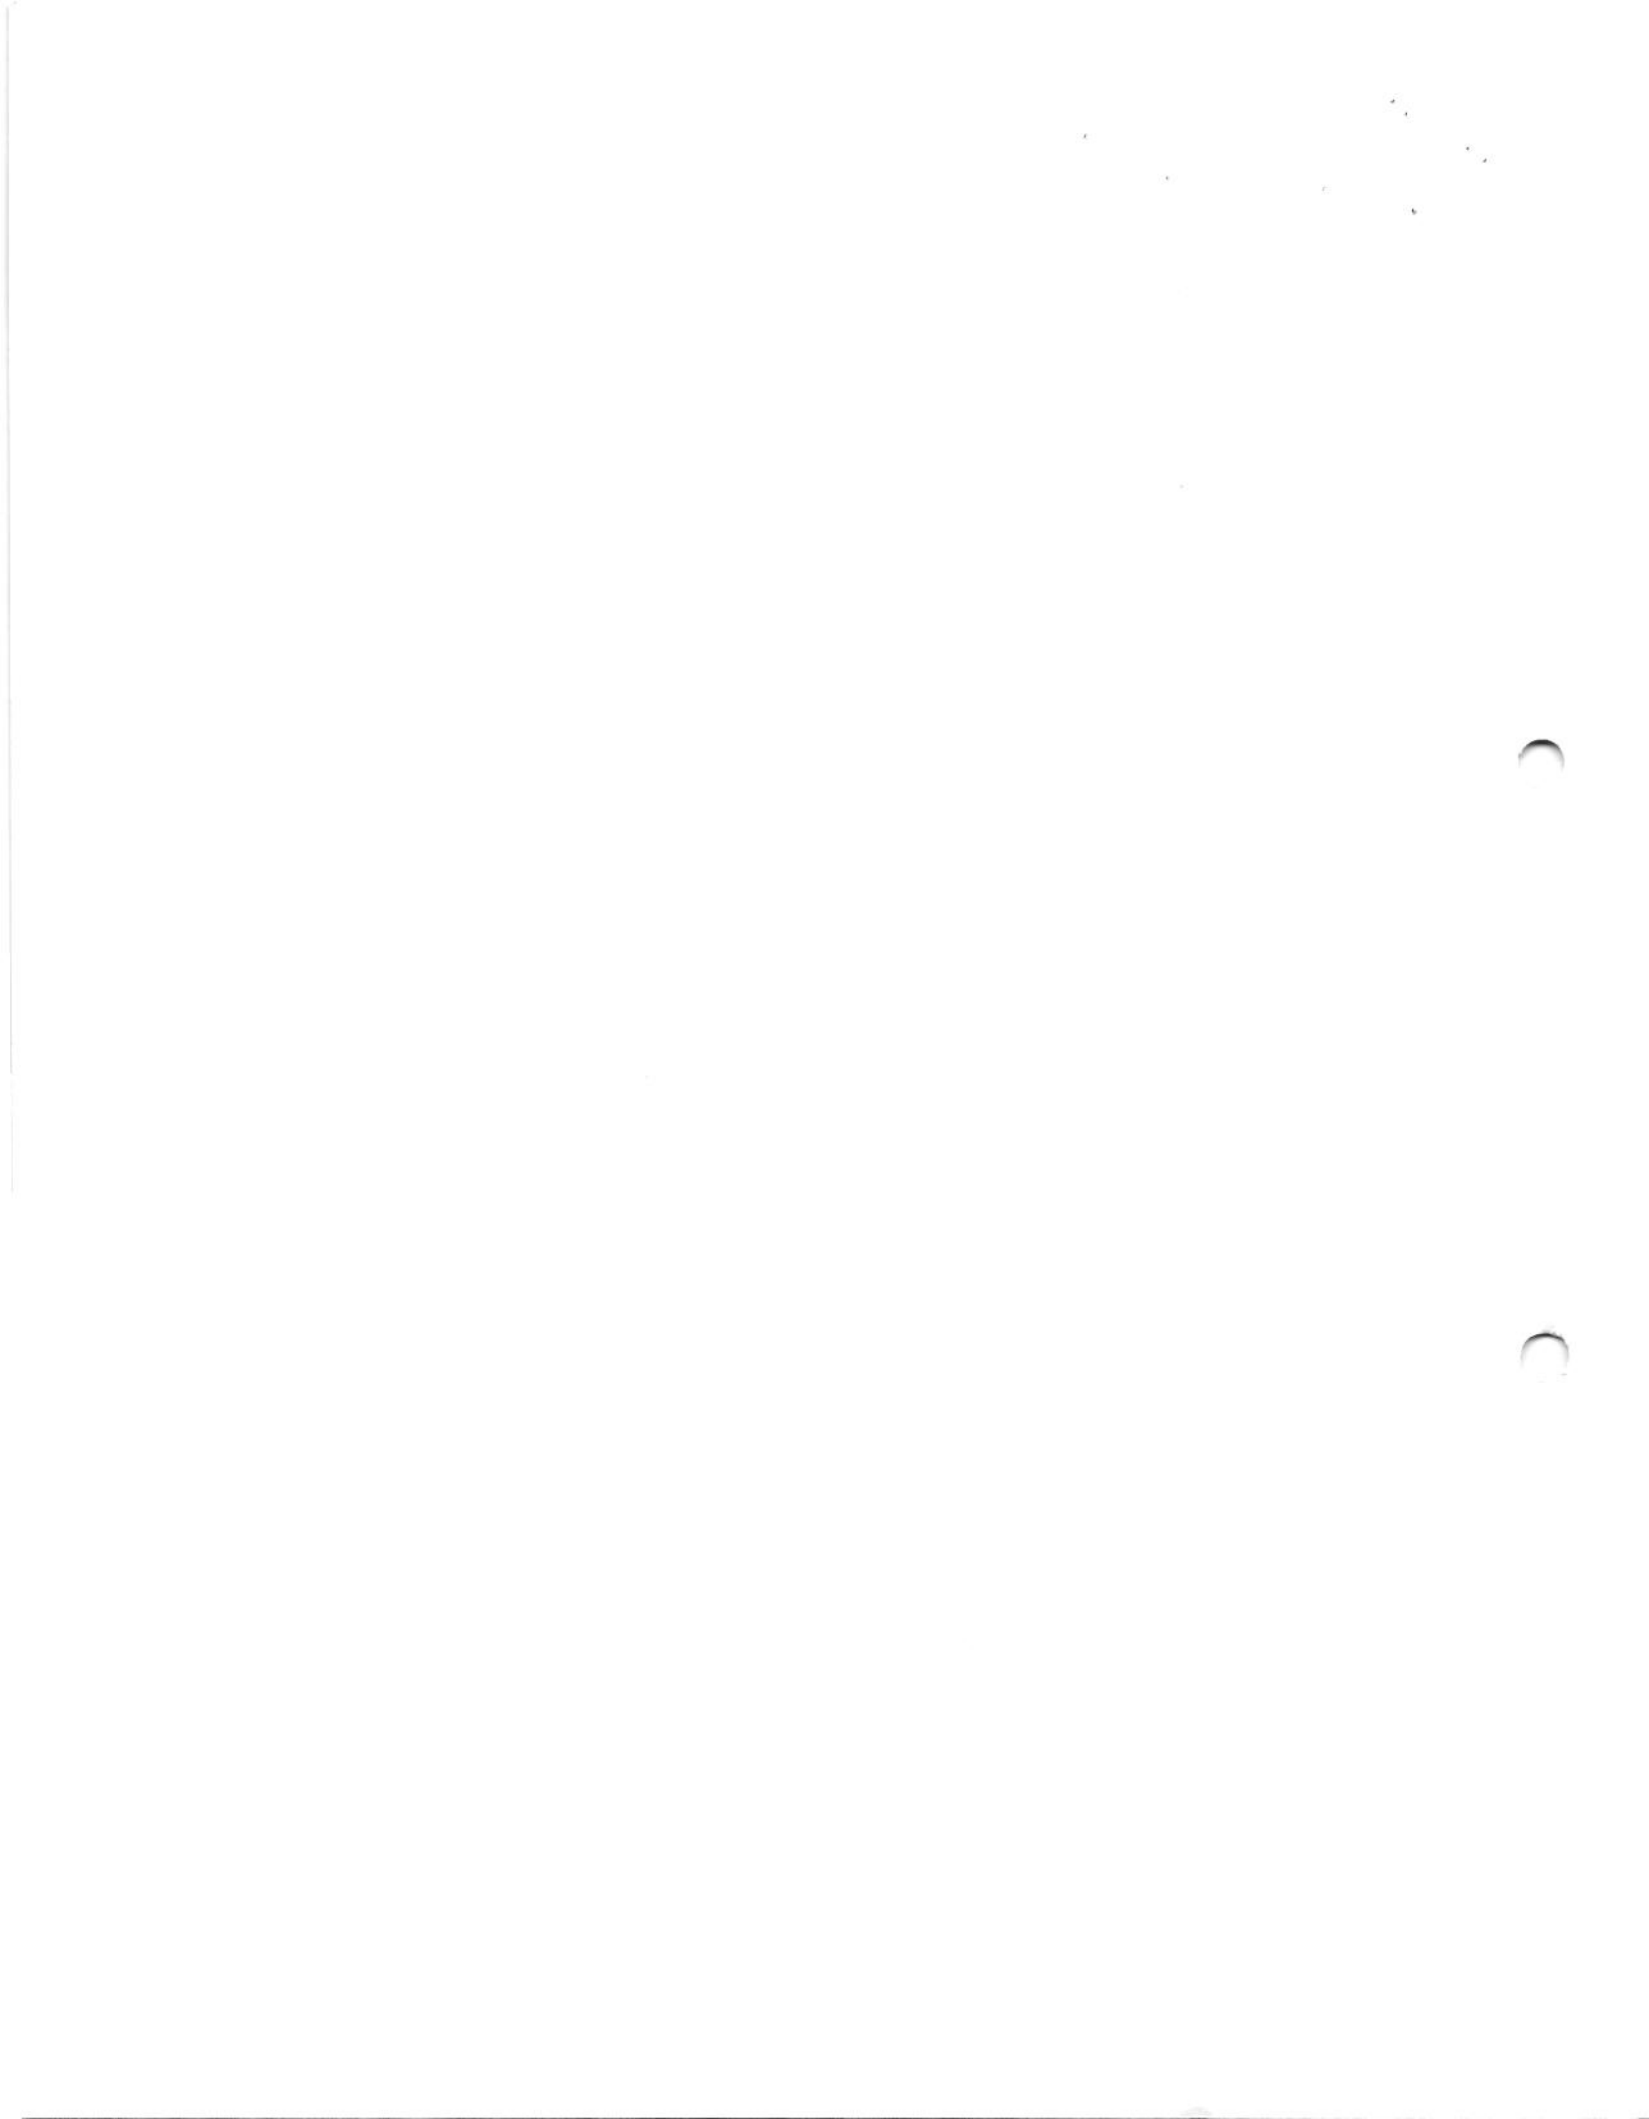



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas

Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



de la obra durante dieciocho meses posteriores a la terminación de la misma. Esta garantía subsistirá durante la ejecución de los trabajos y hasta por dieciocho meses contados a partir de la fecha de terminación de los trabajos, al término de dicho plazo la institución afianzadora procederá a su cancelación previa manifestación expresa y por escrito de "LA UNIVERSIDAD".

4. En caso de que sean autorizados trabajos adicionales y se amplíe el monto del presente contrato mediante uno o más convenios adicionales, deberá presentarse un cheque de cumplimiento y para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos, en los términos que el convenio o solicita.

OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS. -


Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados.

NOVENA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. -

1. "EL CONTRATISTA", Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la terminación de los trabajos, lo comunicará por escrito a "LA UNIVERSIDAD" quien, realizará la recepción de los mismos ya sea total o parcial, conforme a los lineamientos o requisitos que para tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las modalidades que la misma prevé dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la verificación que esta haga de que están debidamente concluidos, reservándose "LA UNIVERSIDAD" el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. "LA UNIVERSIDAD" podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. Reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.
2. Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán dentro de los 60 días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir acuerdo o en caso de que "EL CONTRATISTA" no acuda a la elaboración de éste, "LA UNIVERSIDAD" procederá a elaborarlo, comunicando el resultado a "EL CONTRATISTA" en un plazo de 10 días naturales, contados a partir de la fecha de elaboración. "EL CONTRATISTA" tendrá un plazo de quince días para realizar reclamaciones o aclaraciones según corresponda a su derecho, en caso de que no realice ninguna reclamación y/o gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado.

DÉCIMA. - DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA. - "EL CONTRATISTA" se obliga a nombrar anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un responsable de obra, que tendrá las funciones y responsabilidades descritas en el artículo 220 del Reglamento de Construcciones para el Estado de Coahuila, nombramiento que deberá hacerlo saber "EL CONTRATISTA" por escrito a "LA UNIVERSIDAD". Esta último se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

DÉCIMO PRIMERA. - RELACIONES LABORALES. - "EL CONTRATISTA", en los términos de la Ley Federal del Trabajo, es una empresa establecida que contrata trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que "LA UNIVERSIDAD" no será en absoluto responsables con "EL CONTRATISTA" respecto a dichas relaciones laborales, las cuales se darán, con exclusividad, entre "EL CONTRATISTA" y sus trabajadores.

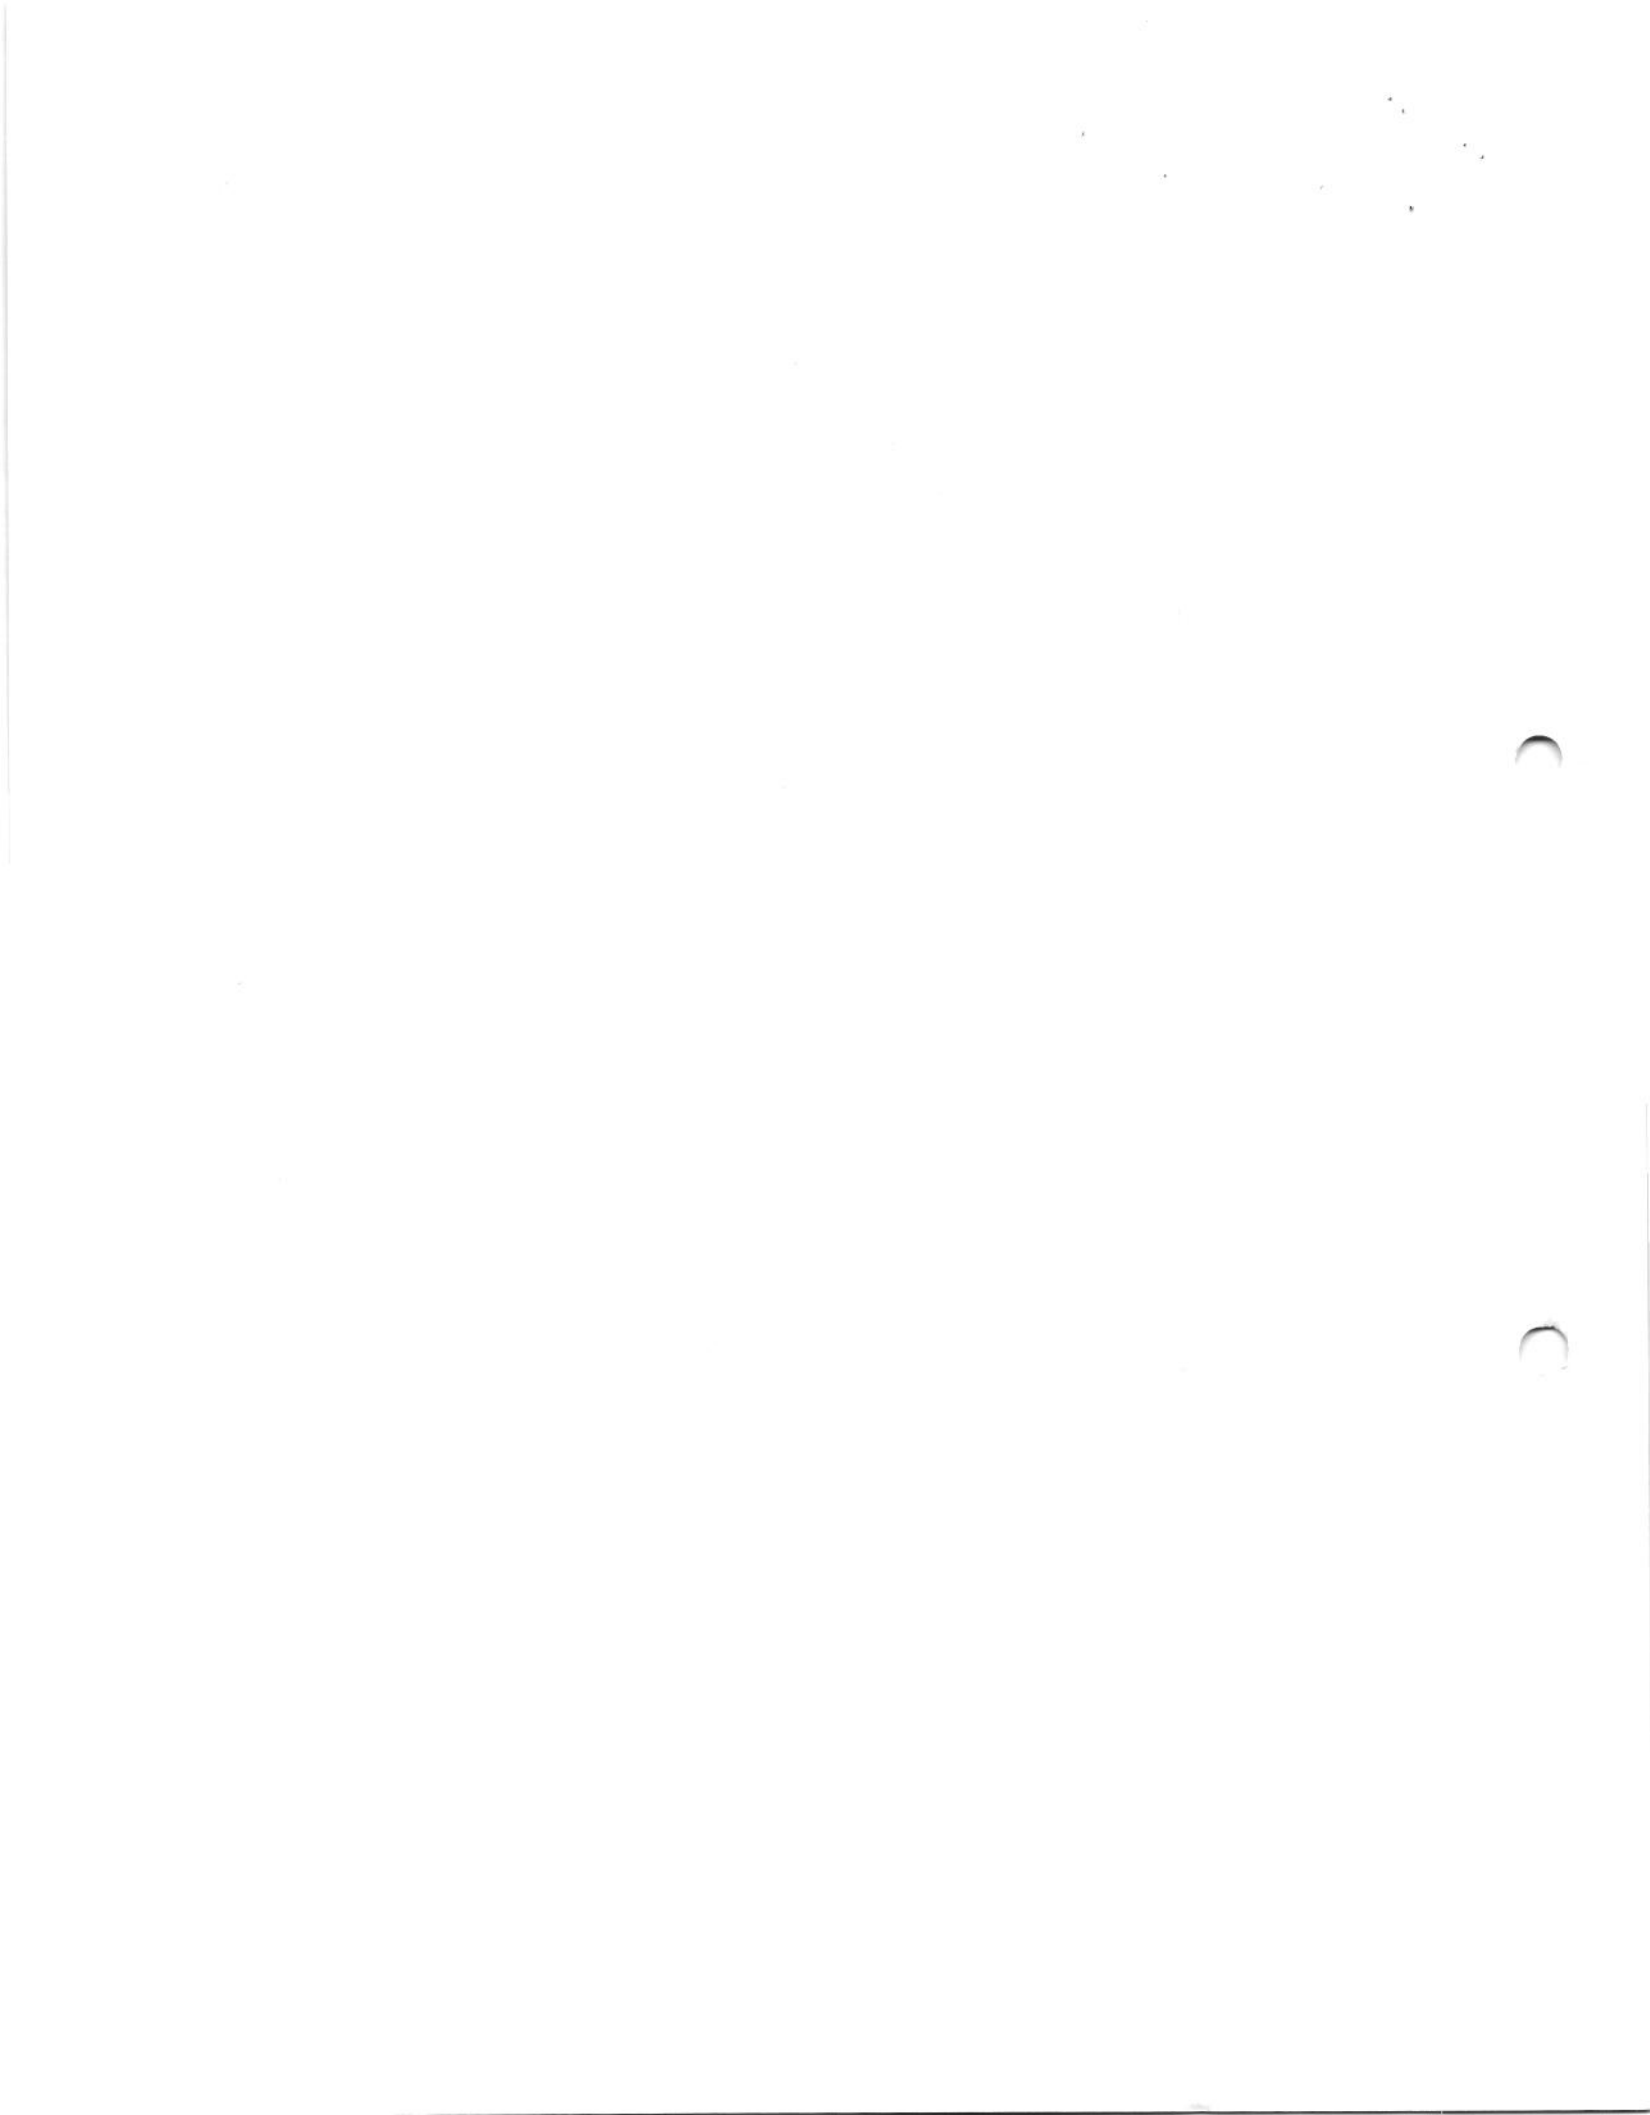



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas

Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315

Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208




DÉCIMO SEGUNDA. - SUPERVISIÓN DE LA OBRA. - " LA UNIVERSIDAD", a través de los representantes que para el efecto designe, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto del contrato, así como de inspeccionar los materiales que vayan a usarse en la ejecución de la misma.

DECIMO TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. -

1. **"EL CONTRATISTA"** se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de **"LA UNIVERSIDAD"**, así como, a responder por su cuenta y riesgo de los desperfectos, falta de calidad en los materiales, defectos o vicios ocultos, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **"LA UNIVERSIDAD"** o a terceros durante la ejecución de la obra y dentro del término de doce meses siguientes a la fecha de recepción de la misma, pudiendo **"LA UNIVERSIDAD"** ordenar su reparación sin que el contratista tenga derecho a retribución alguna, y que en caso de que el contratista se negare a ejecutar la reparación, **"LA UNIVERSIDAD"** podrá optar por encomendarla a un tercero, con cargo a **"EL CONTRATISTA"**, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma, quedando a salvo los derechos de **"LA UNIVERSIDAD"** para exigir el pago de cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas.
2. Igualmente se obliga **"EL CONTRATISTA"** a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, así como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos efectuados que ampara este contrato sin previa aprobación expresa y por escrito de **"LA UNIVERSIDAD"**.

DÉCIMO CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES. - "LA UNIVERSIDAD" tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por **"EL CONTRATISTA"** de acuerdo al programa de obra aprobado, para lo cual **"LA UNIVERSIDAD"** comparará periódicamente el avance de las obras.

1. Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior el avance de las obras es menor de lo que debió realizarse, **"LA UNIVERSIDAD"** procederá a:
2. La retención en total de 30 % (treinta por ciento) de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debió realizarse multiplicando por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciación de las obras hasta la de la revisión, por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que la retención total sea la procedente. Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor de **"LA UNIVERSIDAD"** como pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de **"EL CONTRATISTA"**.
3. Aplicar, para el caso de que **"EL CONTRATISTA"** no concluya la obra en la fecha señalada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 20% (veinte por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa, calculada por cada semana de retraso que cubrirá **"EL**

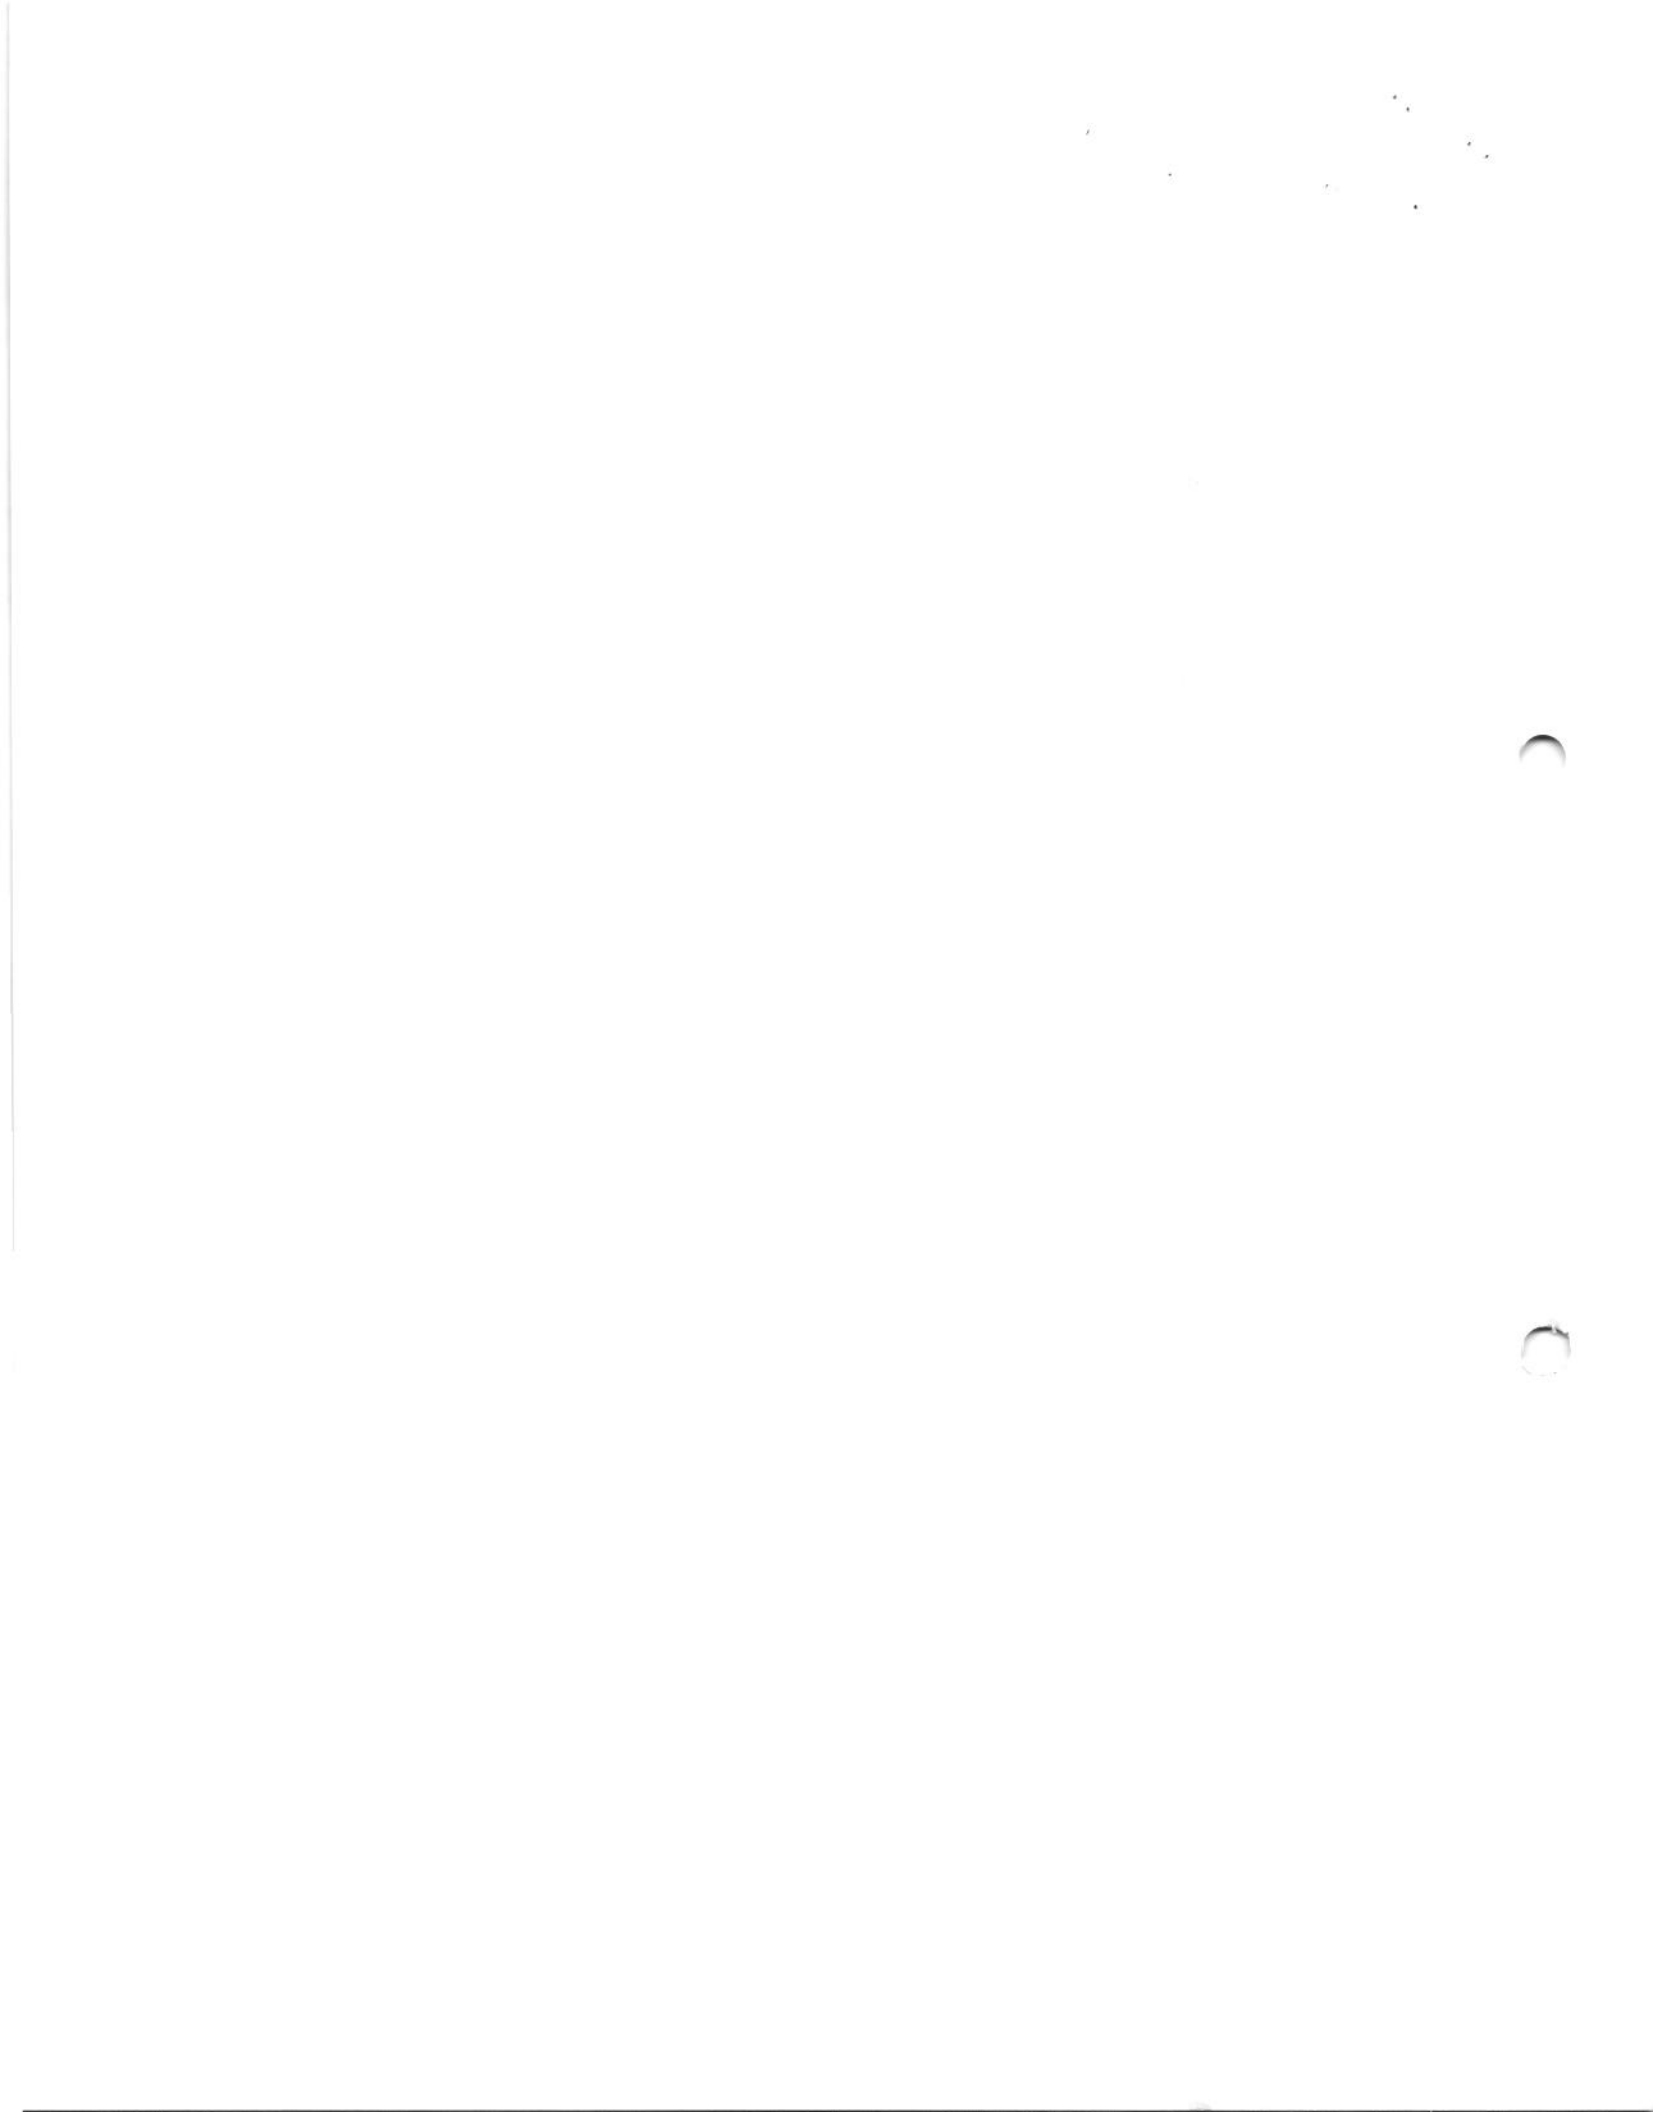



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas

Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208




CONTRATISTA mensualmente hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de "LA UNIVERSIDAD", presentando el finiquito correspondiente; en el caso de que el retraso sea mayor de un mes **"EL CONTRATISTA"** deberá cubrir mensualmente el importe de la sanción hasta finalizar la obra. Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de "LA UNIVERSIDAD" no sea imputable a **"EL CONTRATISTA"**.

- Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, "LA UNIVERSIDAD" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.
- En caso de rescisión de contrato por causas imputables al contratista, "LA UNIVERSIDAD" procederá a hacer efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente lo que deberá ejecutarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión.
- En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

DECIMA QUINTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. - "LA UNIVERSIDAD" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general sin que ello implique su terminación definitiva. El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

DECIMO SEXTA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - "LA UNIVERSIDAD" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general así como:

- La contravención a las disposiciones, lineamientos y requisitos que establece la ley de obras públicas y demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de **"EL CONTRATISTA"** que se estipulan en el presente contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD", además de que se le apliquen a **"EL CONTRATISTA"** las penas convencionales, conforme a lo establecido por este contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.
- Las partes convienen que cuando "LA UNIVERSIDAD" determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, la decisión correspondiente se comunicará a **"EL CONTRATISTA"**, exponiéndole las razones que al efecto se tuvieron para que este, dentro del término de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de la rescisión, en el domicilio convencional señalado, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso "LA UNIVERSIDAD" resolverá lo procedente, dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de **"EL CONTRATISTA"**.

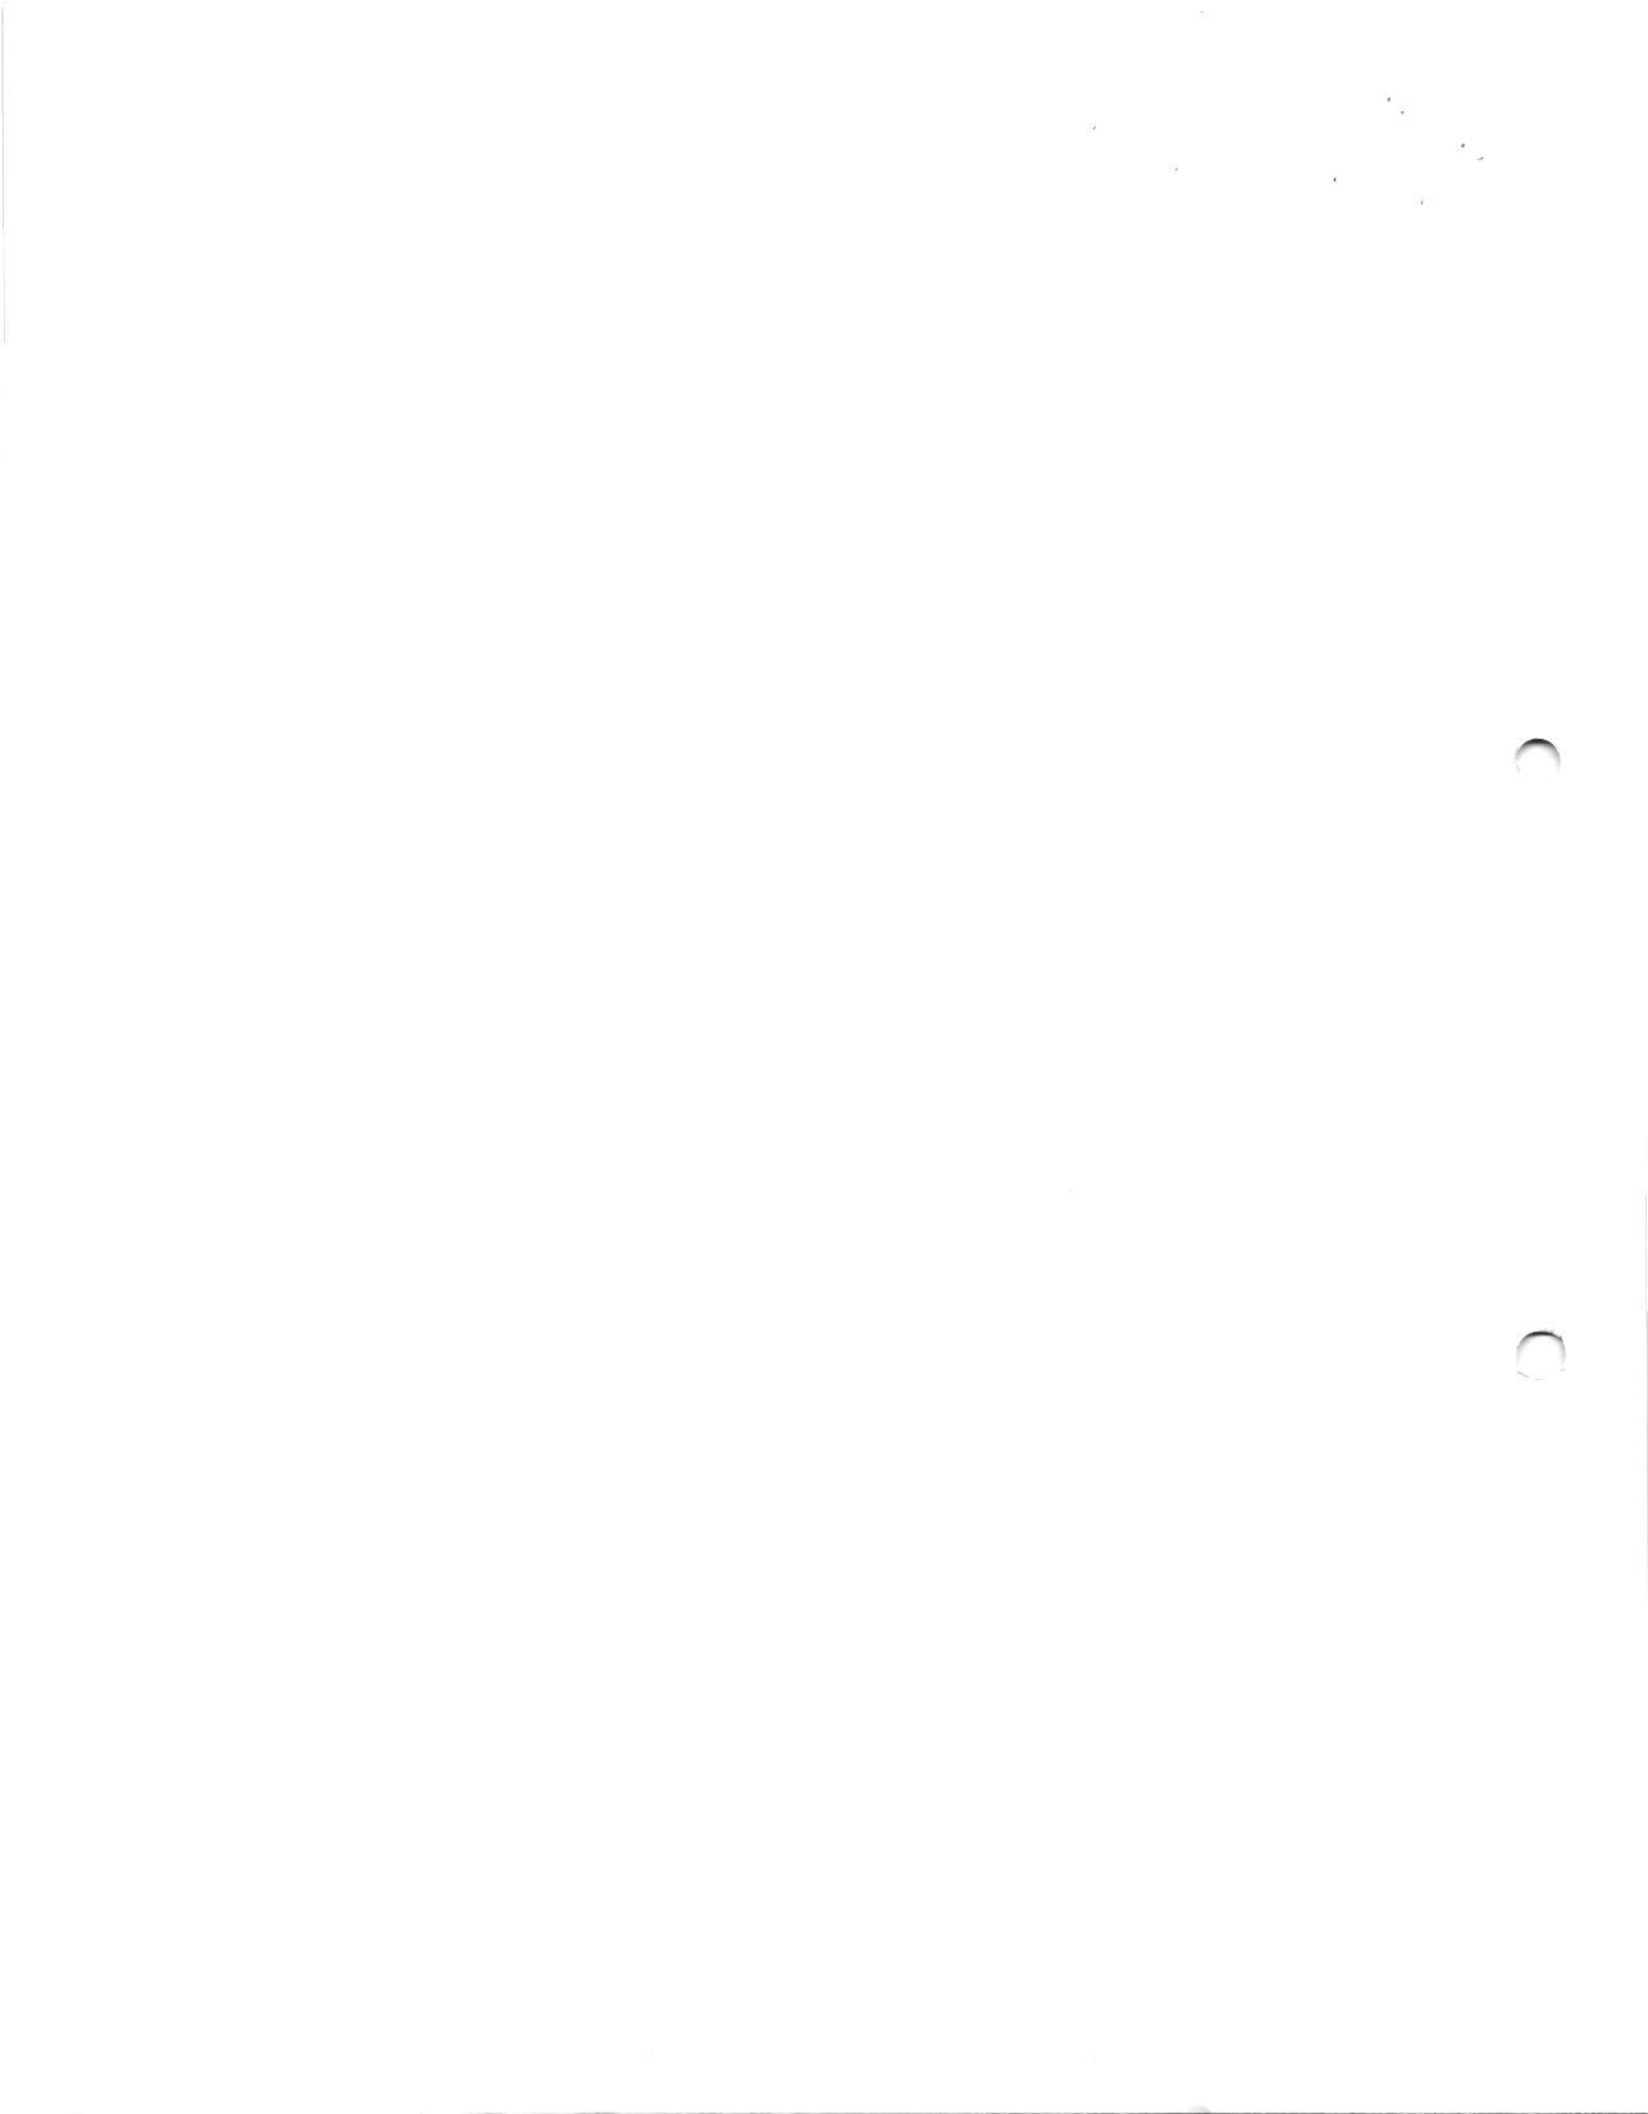



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas

Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



3. Cuando por caso fortuito o de fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podrá suspender la obra, previa notificación por escrito a "LA UNIVERSIDAD", en este supuesto, si opta por rescindir el contrato, lo solicitará a "LA UNIVERSIDAD", la cual decidirá dentro de los 10 días naturales siguientes al de la solicitud; en caso de negativa, será necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DÉCIMO SÉPTIMA. - SUJECIÓN A LAS DISPOSICIONES LEGALES. - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la ley de obras públicas y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

DÉCIMA OCTAVA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. - "EL CONTRATISTA" Acepta que de las estimaciones que le cubra "LA UNIVERSIDAD" se hará la siguiente deducción:


1. El 5/1000 (cinco por cada 1000) del importe de cada estimación por concepto de derechos por el servicio de inspección, vigilancia y control.
2. "EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a las disposiciones legales de carácter interno o, en su caso de competencia federal y a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, preservación del medio ambiente y uso de la vía pública, así como de cualquier otra naturaleza que corresponda al tipo de la obra encomendada.

DÉCIMA NOVENA. - DIFUSIÓN DE LA OBRA. - "EL CONTRATISTA" Se obliga a construir e instalar en el lugar o lugares que "LA UNIVERSIDAD" le indique, hasta tres letreros relativos a la obra en ejecución, construidos con estricto apego al modelo que proporcione "LA UNIVERSIDAD", en la inteligencia de que será condición indispensable para que se haga el primer pago de obra ejecutada. Será obligación de "EL CONTRATISTA" solicitar los permisos de las autoridades respectivas para la colocación de los mencionados letreros.

VIGESIMA.- ÁREA DE COORDINACIÓN: "LA UNIVERSIDAD", designa como responsable para el debido cumplimiento del presente contrato al Ing. José Enrique Mandujano Álvarez, Subdirector de Servicios Generales, con facultades para resolver de común acuerdo con su contraparte, todos los asuntos derivados de su aplicación y que no se encuentren previstos en sus cláusulas.

VIGESIMA PRIMERA. - JURISDICCIÓN. - Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes en la ciudad de Saltillo Coahuila, por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.

PREVIA LECTURA Y CON PLENO CONOCIMIENTO DE LAS PARTES DE SU CONTENIDO, SE EXTIENDE EN CINCO TANTOS EL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO "I" QUE DE CONFORMIDAD SUSCRIBEN LAS PARTES EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL 10 DE MARZO DE 2022, CONSERVANDO CUATRO EJEMPLARES "LA UNIVERSIDAD" Y UN EJEMPLAR "EL CONTRATISTA".

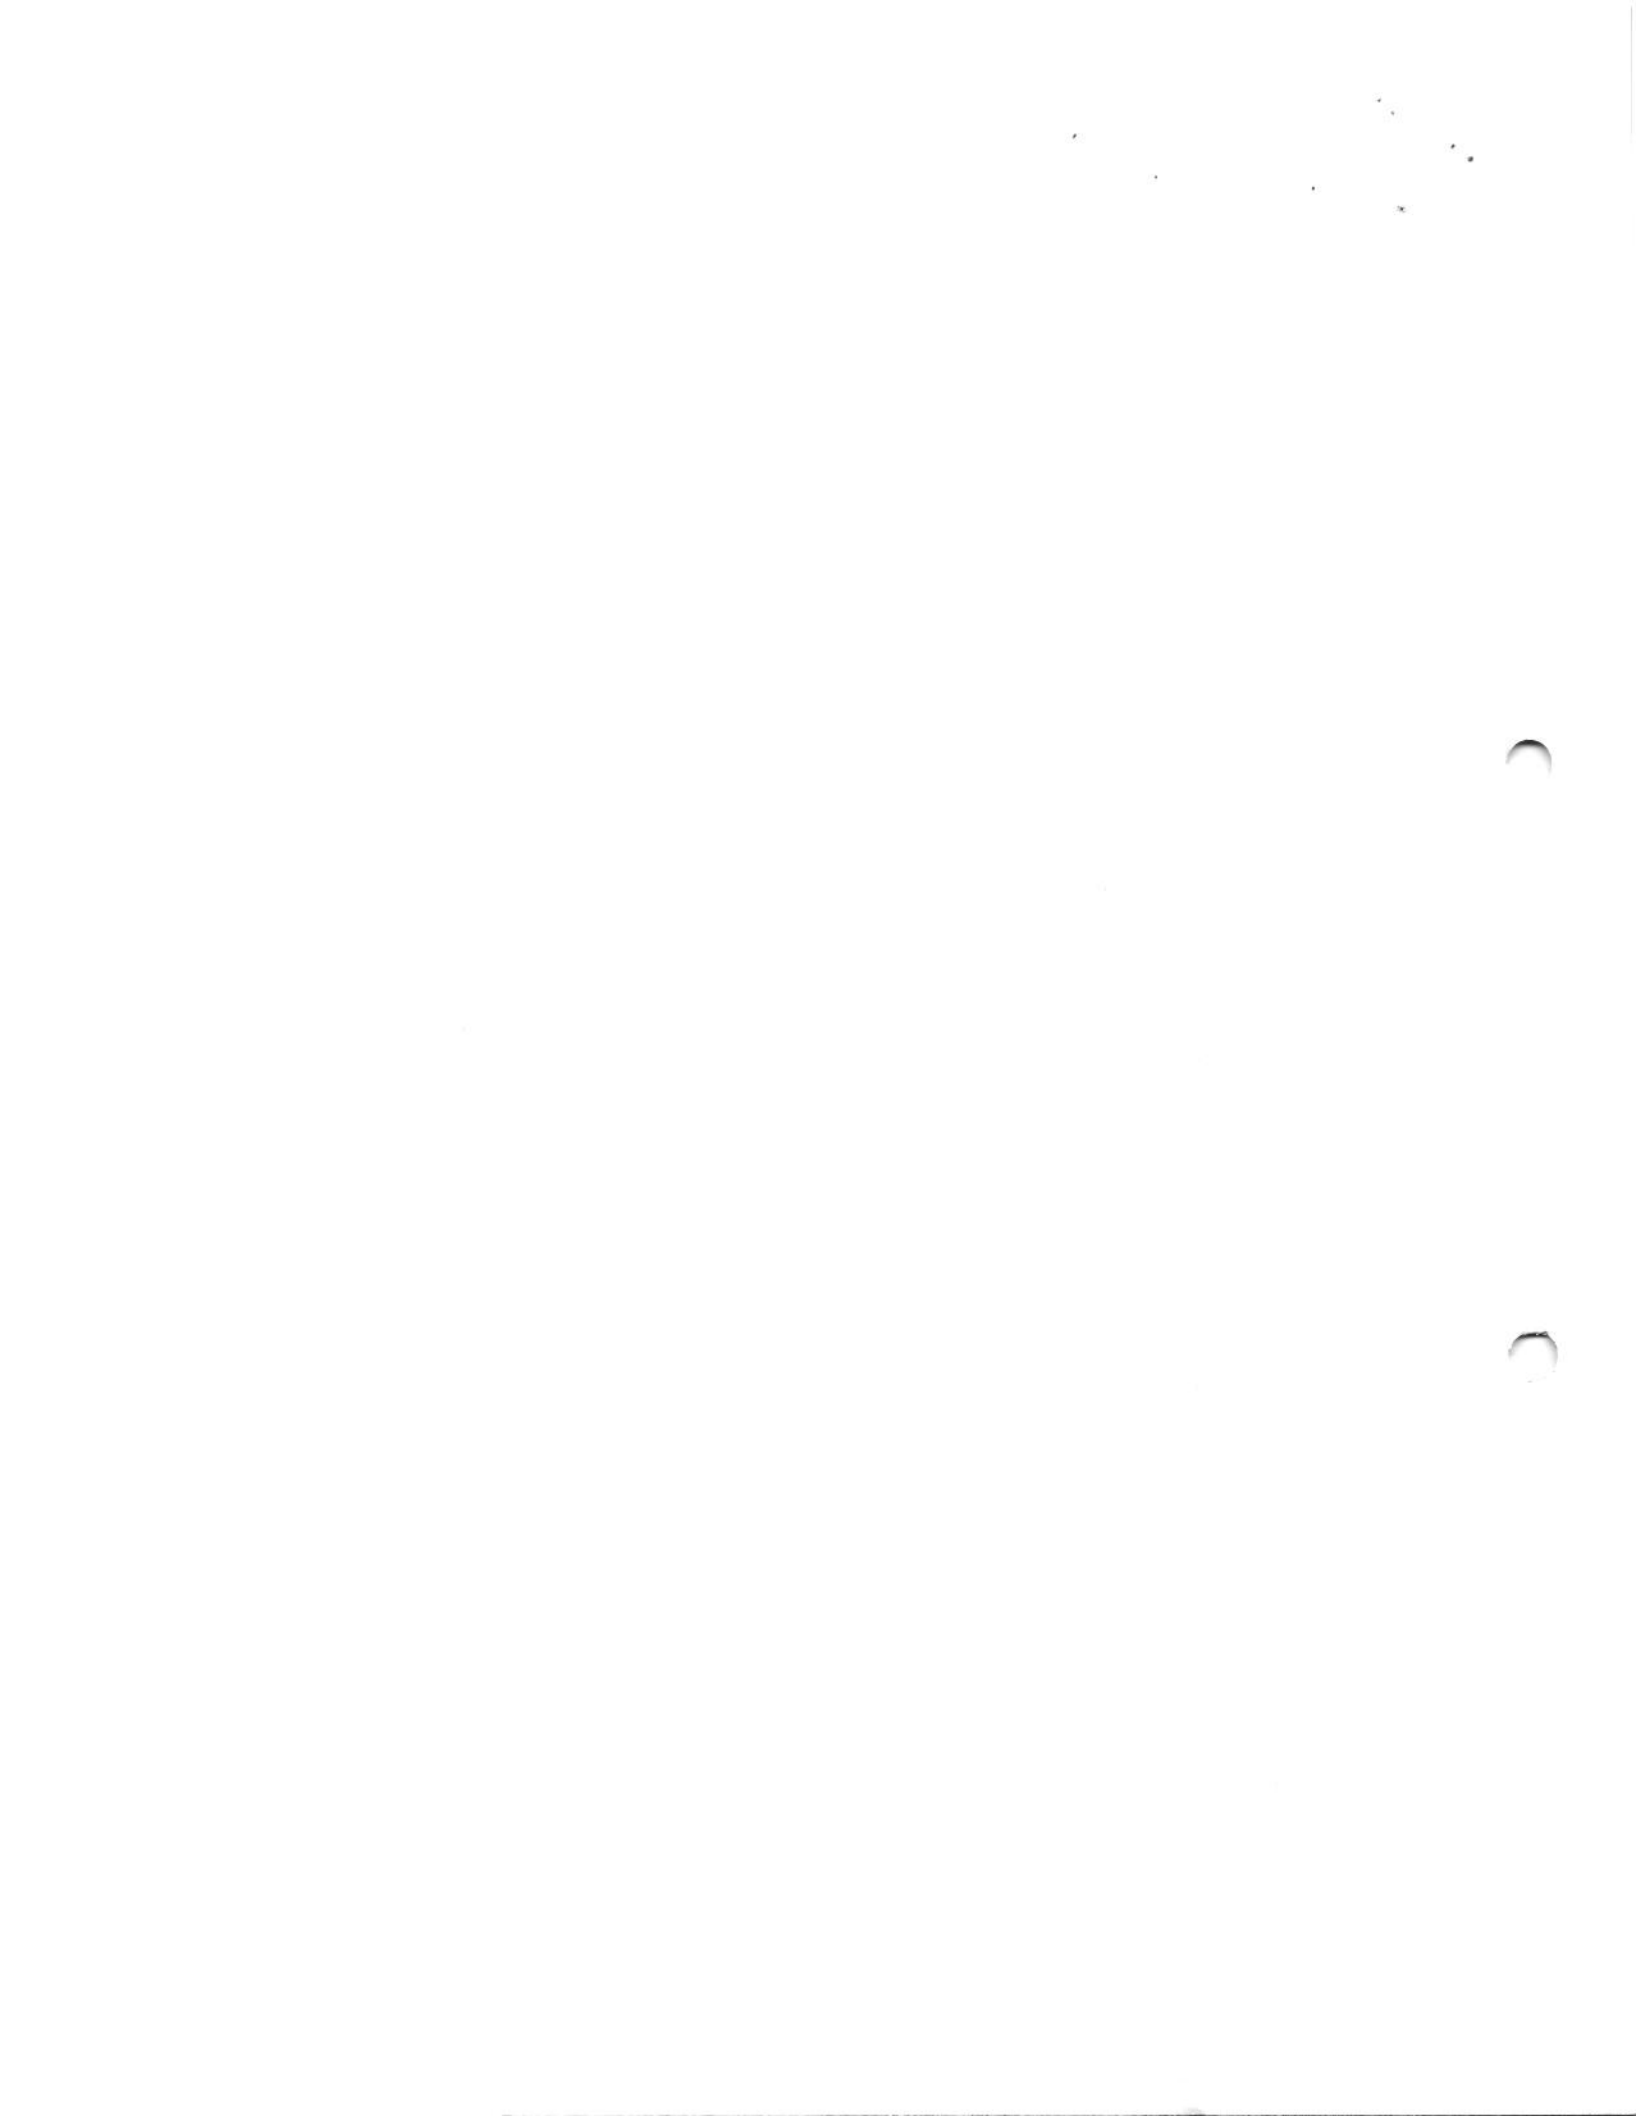



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas

Buenvista, Saltillo, Coahuila CP 25315

Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



POR "LA UNIVERSIDAD"

**MC. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
Y APODERADO LEGAL**


POR EL "PROVEEDOR"

**JESUS ALEJANDRO ALVISO CEPEDA
APODERADO LEGAL**

RESPONSABLE DEL TRABAJO

**ING. JOSE ENRIQUE MANDUJANO ALVAREZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES**

LAS FIRMAS QUE APARECEN EN ESTA HOJA SE REFIEREN AL CONTRATO QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO Y JESUS ALEJANDRO ALVISO CEPEDA, CON EL OBJETO DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA .IMPERMEABILIZACION CON TERMOFUSION DE 4 MM. EN EL EDIFICIO DE FORESTAL -----

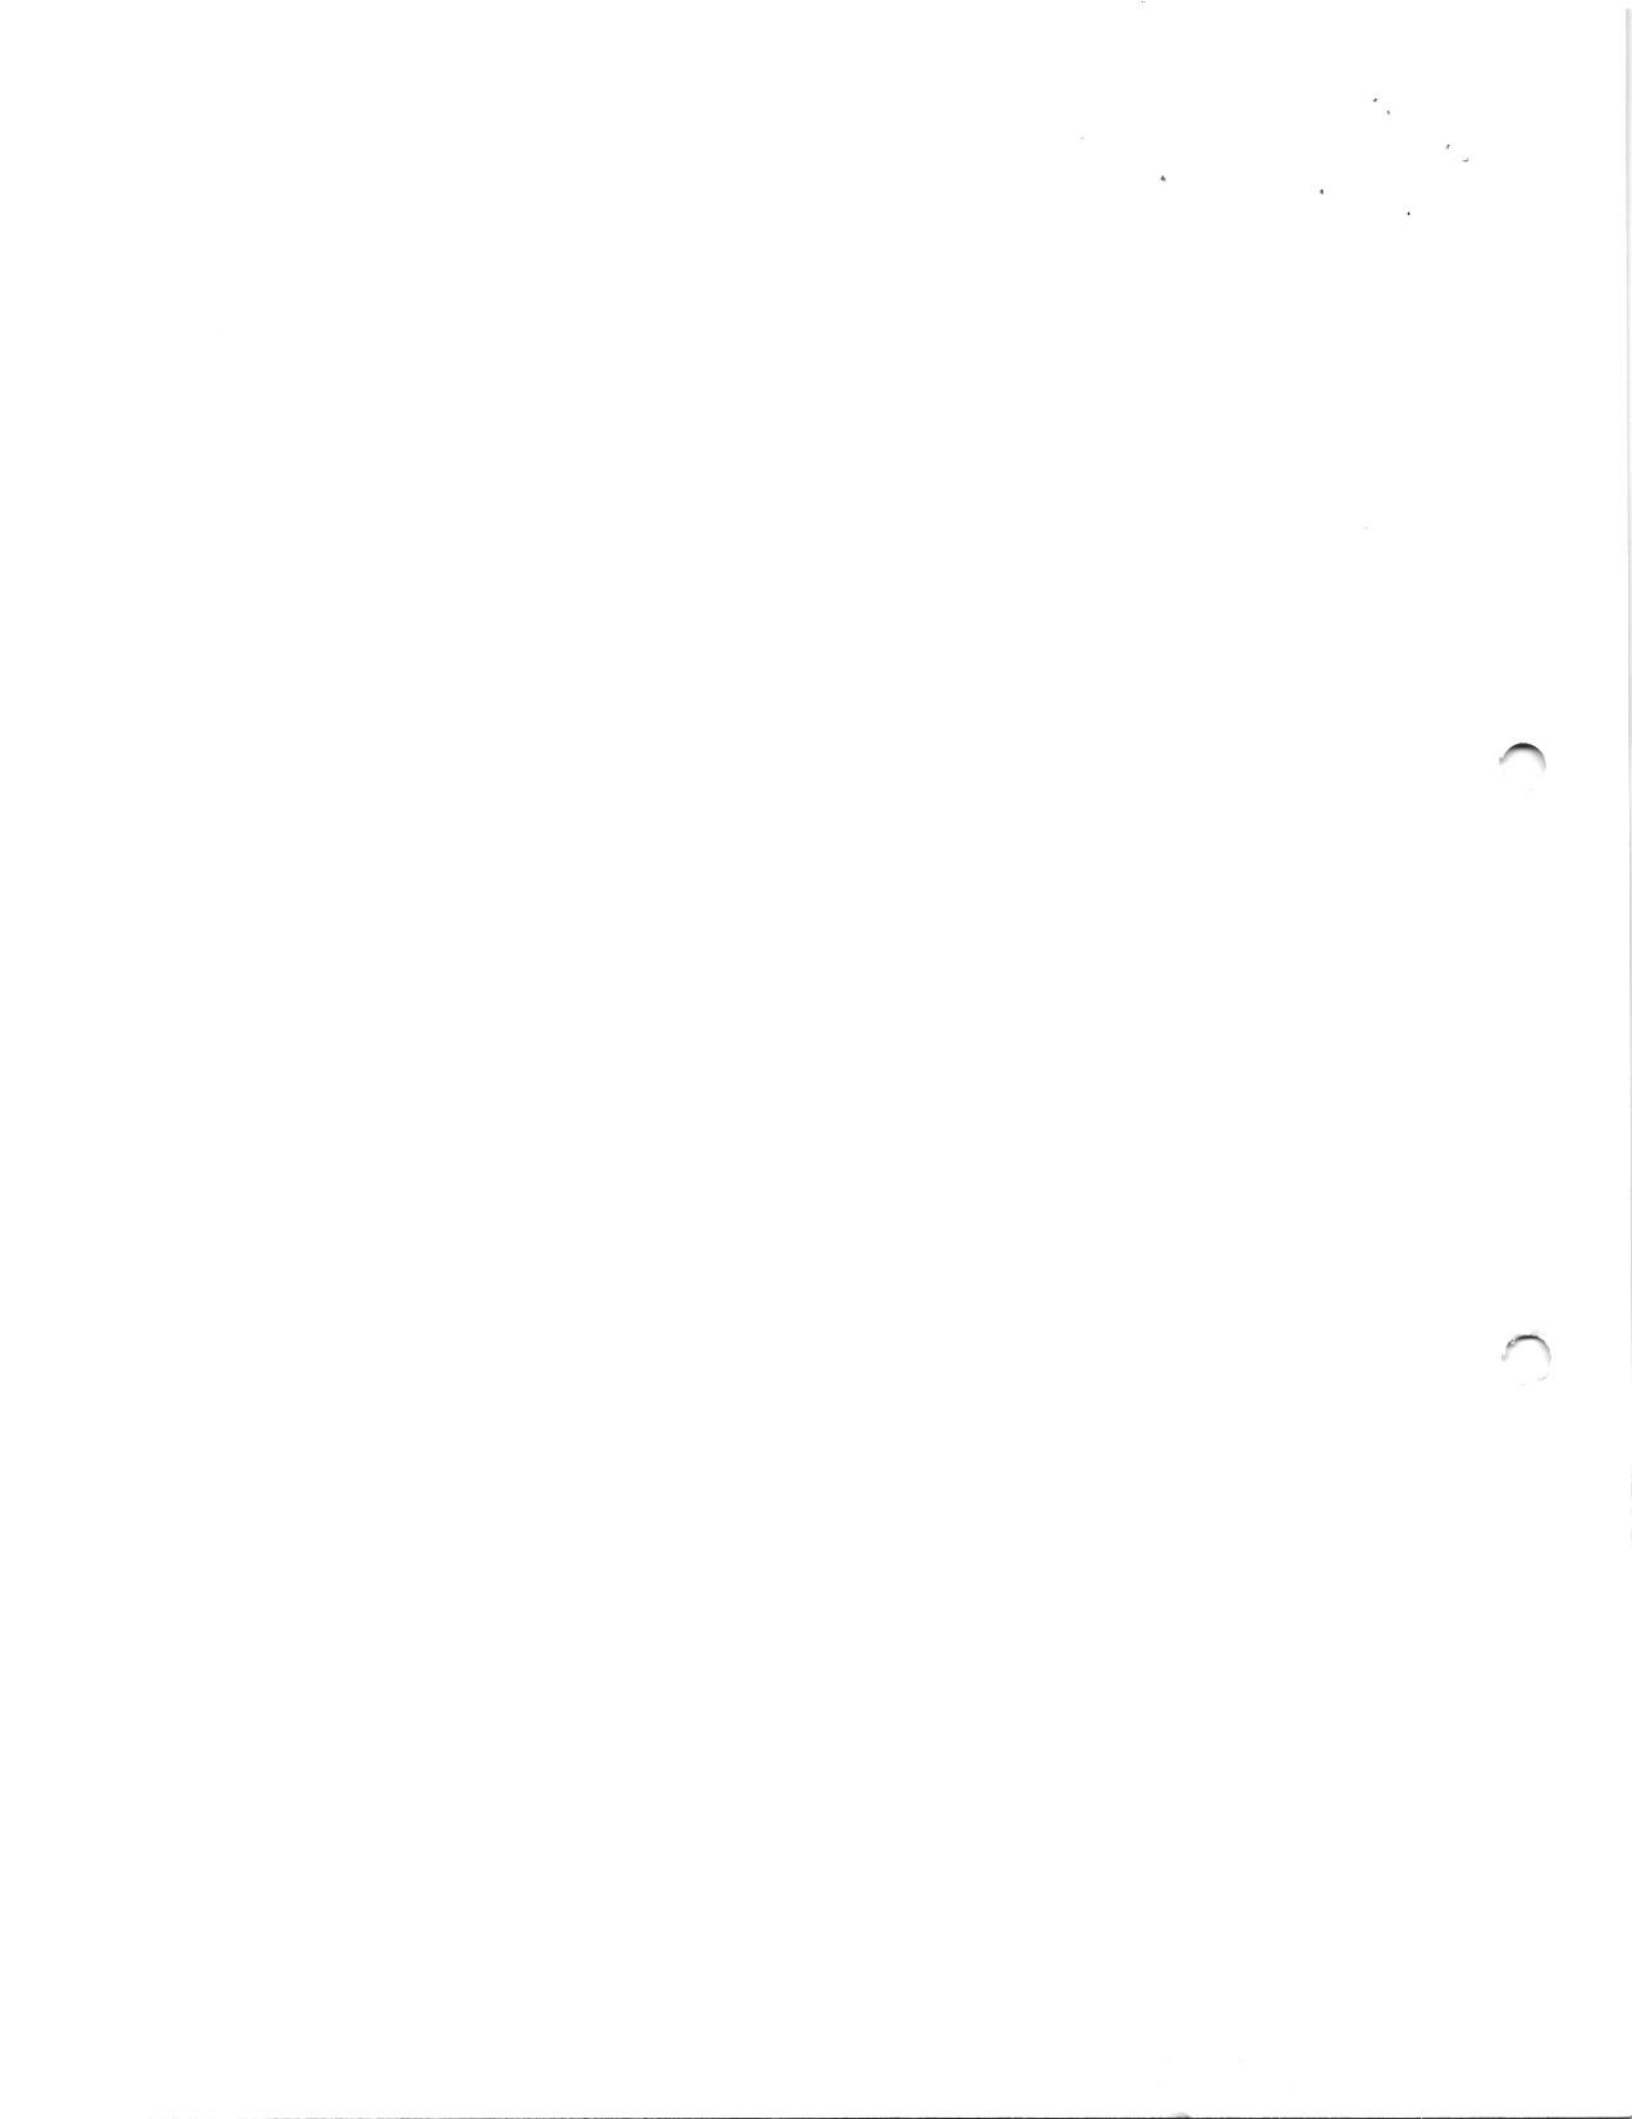



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas
Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208



ANEXO I

JESUS ALEJANDRO ALVISO CEPEDA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA "ANTONIO NARRO" CATÁLOGO DE CONCEPTOS "IMPERMEABILIZACION CON TERMOFUSION DE 4 MM. EN EL EDIFICIO DE FORESTAL"

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Importe
	NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS A LOS QUE CORRESPONDA INCLUYE: SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN , INSTALACIÓN, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, APLICACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRAZO, HERRAJES, CORTES, FLETES, ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA, VELADOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.				
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE 4 MM. TERMOFUSION CON REFUERZO DE TELA POLIESTER 180 G/M2, RECUBIERTO CON GRAVILLA ESMALTEADA AL FUEGO COLOR ROJO (TERRACOTA), INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE ELIMINANDO FALSAS ADHERENCIAS DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION EXISTENTE, APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, SELLADO DE ZONAS CRITICAS (GRIETAS) CON CEMENTO PLASTICO ASFALTICO, GAS RECOLECCIÓN DE TODOS LOS RESIDUOS, CONFINAMIENTO AL LUGAR AUTORIZADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	528.00	M-2	315.00	\$166,320.00
2	LIMPIEZA DE LOSA, INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO FIBRATADO EXISTENTE EN LOSA. LOS MATERIALES RESIDUALES SERÁN DEPOSITADOS EN LUGAR DE TIRO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES FUERA DE LA UNIVERSIDAD (FLETES INCLUIDOS)	528.00	M-2	50.00	\$26,400.00
3	REPARACION INTERIOR DE TECHO, INCLUYE: LIMPIEZA DE PINTURA DAÑADA, RESANE DE GRIETAS Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTI-HONGO PARA MEJOR ACABADO DEL INTERIOR.	180.00	M-2	135.00	\$24,300.00
4	ENTORTADO PARA DAR PENDIENTE EN AZOTEA CON CONCRETO LIGERO 2% PENDIENTE INCLINACION, INCLUYE: ACARREOS, NIVELADO, ACABADO PULIDO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE TIPO TERMOFUSION DE 4 MM.	528.00	M-2	50.00	\$26,400.00
Docientos cuarenta y tres mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N.				SUB-TOTAL	\$243,420.00
Treinta y ocho mil novecientos cuarenta y siete pesos 20/100 M.N.				I.V.A.	\$38,947.20
Tres mil cuarenta y dos pesos 75/100 M.N. (.0125%)				- RET. ISR	\$3,042.75
Docientos setenta y nueve mil trescientos veinticuatro pesos 415/100 M.N.				TOTAL:	\$279,324.45

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second section of faint, illegible text, appearing as a separate paragraph or section.

Third section of faint, illegible text, continuing the document's content.

Fourth section of faint, illegible text, showing further detail or a list.

Fifth section of faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a conclusion or footer.



Universidad Autónoma Agraria Narro Antonio

Necesidades de Mantenimiento y Encuesta Satisfacción de Cliente

Código F 6.17

Fecha Revisión 15/11/07

Revisión No. 0

Tiempo de Retención Un Año Después de su Vida Útil

Solicitud No. 672

Fecha Elab. Solicitud: 09/03/2022

Área / Depto.:

Fecha Rec. Mto. 10/03/2022

Nom. Del Solicitante: M.C. HECTOR DARIO

Fecha Rec. Supervisor:

GONZALEZ LOPEZ

Fecha Rec. Material:

Ubicación FORESTAL

Fecha Elabor. Vale Con.:

Fecha Eng. Oper.y/o Provee:

Acciones a Realizar:

Causa y/o Raíz:

Material requerido:

Marque con una X el recuadro requerido

Herramientas requeridas

- Equipo de Carpintería
- Equipo de Fontanería
- Equipo de Electricidad
- Equipo de Tabla roca
- Equipo de Herrería
- Equipo de Agua

- Equipo de Pintura
- Equipo de Albañilería
- Equipo de Teléfonos
- Equipo de Jardinería
- Equipo de Limpieza
- Equipo de Oficina

Días estimados hábiles de inicio del Mto

1 3 6 9 12 15 mas

Días estimados hábiles de termino del Mto

1 3 6 9 12 15 mas

Operadores Requeridos

1 2 3 4 5 6 7

Observaciones:

Nombre y Firma del Supervisor

Nombre y Firma del Oper. Provee.

Fecha, Nombre y Firma del Usuario

Hector Dario

Encuesta Satisfacción del Cliente

Tiempo estimado de inicio de Mto. u Obra.

Tiempo estimado de término de Mto. u Obra .

- Antes del tiempo estimado
- Justo a tiempo estimado
- Después del tiempo estimado

- Antes del tiempo estimado
- Justo a tiempo estimado
- Después del tiempo estimado

Los materiales fueron los adecuados para el Mto.

El mantenimiento se realizó como lo solicitó.

- SI
- NO

- BIEN
- REGULAR
- MAL

Observaciones: muy atento en las observaciones el responsable de la Empresa Jesús Alvariz
