



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

CONTRATO DE PRETACION DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, A LA QUE EN LO SUCESIVO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "LA UNIVERSIDAD", REPRESENTADA POR EL DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y POR LA OTRA LA C. CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO, POR SUS PROPIOS DERECHOS, A QUIEN SE DENOMINARÁ "PRESTADOR DE SERVICIOS", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA. -" LA UNIVERSIDAD " DECLARA:

I. DECLARA "LA UNIVERSIDAD"

1. Que de conformidad con el artículo 1º. de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 26 de Abril de 2006, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que basada en el principio de su autonomía tiene como objetivos fundamentales: I. Impartir educación superior en el campo de las ciencias agrarias y sus afines para formar profesionistas con juicio crítico, humanista, democrático y nacionalista, capaces de contribuir a la solución de los problemas en el medio rural. II. Realizar investigación en las áreas científicas de su competencia que favorezcan al desarrollo social y económico, integral, armónico e independiente tanto de la república y sus regiones como del estado, y III. Preservar, promover y acrecentar la cultura, la ciencia y la tecnología, en un proceso de intercambio sistemático con la sociedad, para contribuir al desarrollo rural de manera integral.
1. Que en su representación comparece el **DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO**, en su carácter de **ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA** y apoderado general para actos de administración, quien acredita su personalidad mediante el poder general para actos de administración y para la suscripción de títulos de crédito que le fue otorgado por el **DR. ALBERTO FLORES OLIVAS**, en su carácter de Rector de "LA UNIVERSIDAD", mediante instrumento público número (80) ochenta, siendo las (09:30) nueve treinta horas de fecha martes (22) veintidós de Junio de (2023) dos mil veintitrés, otorgado ante la fe del notario público número (1110) ciento diez, Lic. Manuel Cisneros González, Registrado el día 23 (veintitrés) de junio de 2023 (dos mil veintitrés) bajo el acuse de registro de poder en el Registro de Poder en el Registro Nacional de avisos y poderes bajo la clave de registro N°. D6FQJRBNVPKG, de la Cd. de Saltillo, Coahuila, bajo protesta de decir la verdad, que las facultades conferidas y que ostenta en este acto, a la fecha no han sido renovadas, modificadas o limitadas en forma alguna.
2. Que la Universidad requiere la realización del **MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL**.
3. Que la Universidad cuenta con la suficiencia presupuestal, para cubrir la realización del **MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL** en los términos que se precisan en el anexo I del presente contrato.
4. Que la celebración del presente contrato se realizó por el Procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamento en lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, adjudicándose a "PRESTADOR DE SERVICIOS", el contrato relativo a la realización del



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL, que se precisan en el anexo I del presente contrato.

5. Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el número UAA-750303-NHA.
6. Que tiene establecido su domicilio ubicado en Calzada Antonio Narro #1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315, mismo que señalan para los fines y efectos legales de este contrato

SEGUNDA. - "PRESTADOR DE SERVICIOS" DECLARA:

1. Que es una Persona Física con actividad empresarial, según su alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
2. Que tiene la capacidad jurídica para celebrar el presente contrato con "LA UNIVERSIDAD", y para ello cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para cumplir con su objeto..
3. Que es una persona física que se encuentra en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con el número **DUAC790607IK3**.
4. Que declara bajo protesta de decir verdad que formaliza este contrato con la seguridad que ninguno de los dueños o directivos de "PRESTADOR DE SERVICIOS", se encuentra desempeñando un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, o están inhabilitados para desempeñarlos y por consecuencia declara con la misma formalidad, que no tiene parentesco con los Servidores Públicos que decidieron directamente sobre la adjudicación de este contrato, no existiendo ningún impedimento de tipo legal para formalizarlo.
5. Que conoce debidamente el sitio en donde se realizará el **SUMINISTRO DE LOS BIENES** objeto de este contrato, por lo que considera todos los factores que intervienen para su ejecución.
6. Que, para los fines y efectos legales del presente contrato, señala como su domicilio: Corona #1229, del Estado en Saltillo, Coah., C.P. 25000, correo electrónico mse.salttillo@gmail.com, tel. (844) 1747018.
7. Para efectos de lo previsto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, han presentado a "LA UNIVERSIDAD", la opinión favorable emitida por el Servicio de Administración Tributaria respecto del cumplimiento de sus obligaciones Fiscales conforme lo dispuesta la regla 2.1.37 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para 2024, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2023.

III.- DE AMBAS PARTES

1. Que se reconocen la personalidad con la que acuden a la firma del presente instrumento.
2. Que cuenta con la capacidad técnica, económica y moral para dar cumplimiento al objeto de este contrato.
3. Que este contrato se celebra en función del Procedimiento de Adjudicación Directa del contrato número **019/24 AD. MTTO.**

PRIMERA. - OBJETO: El objeto del presente contrato es obtener "LA UNIVERSIDAD" y otorgar por parte de "EL PRESTADOR" la MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL, con los beneficios marcados en el Anexo I, el cual forma parte de este contrato.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es de **\$207,425.00** (doscientos siete mil cuatrocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) antes de I.V.A. más la cantidad de **\$33,188.00** (treinta y tres mil ciento ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) sumando un monto total de **\$240,613.00** (doscientos cuarenta mil seiscientos trece pesos 00/100 M.N.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. - "PRESTADOR DE SERVICIOS" Se obliga a iniciar el mantenimiento objeto de este contrato el día **25 de marzo de 2024** y a terminar a más tardar el día **30 de abril de 2024**, de conformidad con el programa por concepto y con erogaciones mensuales del mantenimiento que se anexa al presente contrato.

1. El plazo pactado para la ejecución del mantenimiento solo podrá ser prorrogado por decisión de "LA UNIVERSIDAD". Si en el desarrollo de los trabajos se presentaran circunstancias por las cuales "LA UNIVERSIDAD" estimará necesario modificar el programa a que se refiere esta cláusula, o bien en el caso de que "PRESTADOR DE SERVICIOS" se viere obligado a solicitar variación a dicho programa por causas no imputables a él, debidamente justificadas y dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, después de que hubiere(n) ocurrido la(s) causa(s) que apoyen su solicitud, "LA UNIVERSIDAD" establecerá la reforma que juzgue pertinente y hará del conocimiento de "PRESTADOR DE SERVICIOS" las modificaciones que apruebe, y este último a su vez, quedará obligado a aceptarla. Estas modificaciones, o en su caso el nuevo programa que se formulare, se consideraran incorporados a este contrato y, por lo tanto, obligatorio para las partes.

CUARTA. - OBLIGACIONES DE "LA UNIVERSIDAD":

1. **PAGAR EL PRECIO CONVENIDO:** Si se recibe de acuerdo a la Propuesta Técnica y Económica aceptada.
2. **ACCESO:** "LA UNIVERSIDAD", se compromete a permitir al personal de "PRESTADOR DE SERVICIOS" el acceso al área institucional y otorgar las facilidades necesarias a fin de que el personal de "PRESTADOR DE SERVICIOS" pueda cumplir con el objeto del contrato.
3. **INFORMACIÓN:** Otorgar toda la información necesaria al personal responsable que designe "PRESTADOR DE SERVICIOS", para el mejor cumplimiento del objeto del contrato.
4. **PERSONAS AJENAS:** Impedir que personal ajeno a "PRESTADOR DE SERVICIOS" proporcione el servicio, señalado en el ANEXO I, del presente instrumento.
5. **LIBERACIÓN DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% ANTES DEL IVA:** Liberación del cheque otorgada por "PRESTADOR DE SERVICIOS" al término del presente contrato, siempre y cuando ésta haya cumplido a satisfacción de "LA UNIVERSIDAD" con todas sus obligaciones. Este Cheque únicamente podrá ser liberado por la Dirección General Administrativa de "LA UNIVERSIDAD". **No aplica, ya que realiza el servicio y posteriormente se le hace el pago correspondiente.**
6. **CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES DPRESTADOR DE SERVICIOS:** a satisfacción de la dependencia o entidad, el servidor público facultado, procederá inmediatamente a extender las constancias de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que dé inicio, a los trámites para la cancelación de las garantías de anticipo en su caso y cumplimiento del contrato.

QUINTA.- OBLIGACIONES "DEL PRESTADOR"

1. **PRESTACION DE LOS SERVICIOS:** Prestar con la mayor eficacia, calidad y honradez, con sus propios recursos humanos, técnicos y materiales, el suministro relativo al servicio, de acuerdo a lo establecido en el "ANEXO I" del presente instrumento.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

2. **ATENCION DE OBSERVACIONES:** Atender con toda diligencia las observaciones que se le hagan en forma verbal o por escrito que formule "LA UNIVERSIDAD" para lograr que los servicios se presten en forma óptima.
3. **FACTURACIÓN:** Presentar a "LA UNIVERSIDAD" la factura debidamente requisitada, especificando con toda claridad el concepto correspondiente, así como todos y cada uno de los requisitos fiscales y en general todos aquellos de carácter legal que para los efectos del presente contrato fueren necesarios.

SEXTA.- GARANTÍA: "PRESTADOR DE SERVICIOS" entregará a más tardar a los 10 días naturales siguientes a la fecha de la firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento, pudiendo ser cheque, expedido por el prestador de servicios, conforme a lo establecido en el artículo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que garantice el cumplimiento del presente contrato o cualquiera de las formas que el mismo precepto señala, por el 10% del monto máximo convenido en la Cláusula Cuarta, antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), según el artículo 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuando Aplique. **No aplica, ya que realiza el servicio y posteriormente se le hace el pago correspondiente.**

SEPTIMA.- SUPERVISION DE LOS SERVICIOS: "LA UNIVERSIDAD", designa como Supervisor al depto. de Obras y Mantenimiento y darán instrucciones que se estimen pertinentes a "PRESTADOR DE SERVICIOS" para el CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS objeto del presente contrato.

OCTAVA.- CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualesquiera otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, se deberá contar con la aprobación expresa y por escrito, de "LA UNIVERSIDAD".

NOVENA.- RELACIÓN LABORAL: Las partes expresamente convienen que el presente instrumento no atribuye a ninguna de ellas, o a sus agentes o empleados, el cargo de agentes o empleados de las partes contratantes, por lo tanto, todo el personal que labore para el cumplimiento del presente convenio, será en los términos del mismo, personal precisamente contratado por cada una de ellas y dado que éstas cuentan con elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones, laborales y de seguridad social derivadas de las relaciones existentes con su propio personal, tales como salarios, indemnizaciones, riesgos profesionales o cualquier otra obligación y/o prestación que derive de las citadas relaciones laborales, de la Ley Federal del Trabajo y/o de la Ley del Seguro Social.

1. Por lo anterior, "LA UNIVERSIDAD" está de acuerdo que el presente contrato no le confiere ninguna facultad de representación de "PRESTADOR DE SERVICIOS", ni generará relación laboral alguna entre ellas o sus dependientes, cualquiera que sea la relación jurídica que los vincule, reconociendo y aceptando que actuarán como personas o entidades independientes; por lo que se obligan indemnizar y sacar en paz y a salvo a cualquiera de ellas, de cualquier demanda, queja o reclamación judicial o extrajudicial, de carácter laboral, civil, penal, mercantil o de otra índole que pudiera surgir durante la vigencia del presente contrato, en relación con cualquier supuesto aquí mencionado incluyendo sin limitación cualquier demanda, queja o



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

reclamación derivada de o en relación con cualquier hecho o acto que se interprete o pudiere interpretarse como una representación de "LA UNIVERSIDAD" por parte de "PRESTADOR DE SERVICIOS" o viceversa, comprometiéndose la parte que corresponda a pagar los honorarios y gastos que se generen en defensa de los intereses de la otra.

DÉCIMA.- PENAS CONVENCIONALES: En caso de mora en la entrega de los servicios por parte de "PRESTADOR DE SERVICIOS", se obliga a pagar a "LA UNIVERSIDAD" una pena convencional equivalente al dos al millar (2 por cada 1000) sobre el monto total del contrato antes de IVA.

1. En el supuesto de que las penas aplicadas por "LA UNIVERSIDAD" excedan el 10% del monto de la garantía de cumplimiento otorgada por "PRESTADOR DE SERVICIOS", iniciará el procedimiento de rescisión administrativa previsto en este contrato.
2. "PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que en caso de que "LA UNIVERSIDAD" le aplique la penalización a que se refiere la presente Cláusula, "PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá de realizar el pago en efectivo en la Caja General de "LA UNIVERSIDAD" ubicada en el Edificio Central Administrativo del domicilio señalado en el numeral I, numeral 4 de las declaraciones. Las penas convencionales a que se refiere la presente Cláusula se harán efectivas siempre y cuando el incumplimiento o causa sean directamente imputables a "PRESTADOR DE SERVICIOS", en el caso de que los retrasos o incumplimientos sean atribuibles a "LA UNIVERSIDAD", los días correspondientes no serán imputables a "PRESTADOR DE SERVICIOS" y en consecuencia no estarán sujetos al régimen de penalidades que establece esta Cláusula.

DÉCIMA PRIMERA.- RESCISIÓN: "LA UNIVERSIDAD" en cualquier momento podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa, cuando el prestador incurra en incumplimiento de sus obligaciones, las cuales se estipulan en este contrato en la cláusula Quinta en "Obligaciones del Prestador".

1. Transcurrido el término señalado en el párrafo anterior, "LA UNIVERSIDAD" tomando en cuenta los argumentos y pruebas ofrecidas por "PRESTADOR DE SERVICIOS", determinará de manera fundada y motivada si resulta procedente o no la rescisión del contrato.
2. "LA UNIVERSIDAD", comunicará por escrito dentro de los 15 días hábiles siguientes al término señalado en el primer párrafo de la presente Cláusula, la resolución anterior y en caso de resultar procedente la rescisión administrativa del contrato, se realizará el finiquito correspondiente, del importe de los bienes, suministrados hasta esa fecha se hubieren aceptado a entera satisfacción de "LA UNIVERSIDAD" y que encontraren pendientes de pago, quedando a cargo de "LA UNIVERSIDAD" la liquidación correspondiente, de existir diferencias a favor de "LA UNIVERSIDAD", éstas deberán ser restituidas por "PRESTADOR DE SERVICIOS".
3. Si previamente a la determinación de rescisión del contrato "PRESTADOR DE SERVICIOS" realizará el suministro de los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de "LA UNIVERSIDAD" de que continúa vigente la necesidad del mismo, aplicando en su caso las penas convencionales correspondientes.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

4. **"LA UNIVERSIDAD"**, podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a **"LA UNIVERSIDAD"**, en este supuesto **"LA UNIVERSIDAD"** deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.
5. **"LA UNIVERSIDAD"**, al no dar por rescindido el contrato, establecerá con **"PRESTADOR DE SERVICIOS"** otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento.

DÉCIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: **"LA UNIVERSIDAD"**, cualquier tiempo y sin responsabilidad alguna podrá dar por **terminado anticipadamente el presente contrato**, cuando concurren razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de adquirir la necesidad de **CONTRATAR LOS SERVICIOS** originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"LA UNIVERSIDAD"**, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o cuando **"PRESTADOR DE SERVICIOS"** sea emplazada a huelga o se le presente cualquier conflicto de carácter laboral, siempre y cuando afecte el objeto del presente contrato, en estos supuestos **"LA UNIVERSIDAD"** reembolsará a **"PRESTADOR DE SERVICIOS"** los gastos no recuperable en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente. Bastando para ello notificación por escrito con 10 días naturales de anticipación.

DÉCIMA TERCERA. - SUSPENSIÓN: **"LA UNIVERSIDAD"** en caso fortuito o de fuerza mayor, podrá suspender temporalmente en todo o en parte la entrega de los bienes objeto del presente contrato, dando aviso por escrito a **"PRESTADOR DE SERVICIOS"** con 5 días naturales de anticipación cuando concurren razones de carácter presupuestal o cualquier otra causa justificada, en este caso se procederá a realizar las estimaciones y liquidaciones de los bienes recibidos a satisfacción, hasta la fecha de la suspensión.

1. Cuando las causas de suspensión sean imputables a **"LA UNIVERSIDAD"** pagará a **"PRESTADOR DE SERVICIOS"** los gastos no recuperables durante el tiempo que dure esta suspensión. Asimismo, las partes establecerán el tiempo de suspensión, a cuyo caso podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato, o también se podrá reanudar el suministro una vez que hayan desaparecido las causas de suspensión temporal.

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES: dentro de su presupuesto aprobado y disponible, **"LA UNIVERSIDAD"** por razones fundadas, podrá acordar con **"PRESTADOR DE SERVICIOS"** modificaciones o prórrogas al mismo, debiendo cualquier modificación formalizarse por escrito.

DÉCIMA QUINTA. - ASUNTOS NO PREVISTOS: Los asuntos relacionados con el objeto de este contrato y que no se encuentren expresamente previstos en sus cláusulas, serán resueltos de común acuerdo por las partes y las decisiones que se tomen deberán hacerse constar por escrito. En caso de no existir acuerdo, se sujetarán a la legislación aplicable.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

DÉCIMA SEXTA. - ÁREA DE COORDINACIÓN: "LA UNIVERSIDAD", designa como responsable para el debido cumplimiento del presente contrato el abajo firmante por parte de la Subdirección de Recursos Humanos el Ing. Cesar Estrada Torres, con facultades para resolver de común acuerdo con su contraparte, todos los asuntos derivados de su aplicación y que no se encuentren previstos en sus cláusulas.

DÉCIMA SEPTIMA.- JURISDICCIÓN: Para el arreglo de toda controversia que se suscite con motivo de la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato y que no se resuelva de común acuerdo por las partes, éstas se someterán a los tribunales de la Ciudad de Saltillo, Coahuila, renunciando desde ahora a cualquier otro fuero que les pudiese corresponder en razón de sus respectivos domicilios presentes o futuros.

DÉCIMA OCTAVA.- DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL OBJETO Y CONDICIONES DE ENTREGA.- La empresa del **CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO**, realizará trabajos de **MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICIÓN ANIMAL**, el cual inicia en el mes **25 de marzo de 2024** y a terminar a más tardar el día **30 de abril de 2024**, con un monto de **\$207,425.00** (doscientos siete mil cuatrocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) antes de I.V.A. más la cantidad de **\$33,188.00** (treinta y tres mil ciento ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) sumando un monto total de **\$240,613.00** (doscientos cuarenta mil seiscientos trece pesos 00/100 M.N.), quedando el trabajo a entera satisfacción de "LA UNIVERSIDAD".

PREVIA LECTURA Y CON PLENO CONOCIMIENTO DE LAS PARTES DE SU CONTENIDO, SE EXTIENDE EN DOS TANTOS EL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO "I" QUE DE CONFORMIDAD SUSCRIBEN LAS PARTES EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL 03 DE MARZO DE 2024, CONSERVANDO DOS EJEMPLARES "LA UNIVERSIDAD" Y UN EJEMPLAR "PRESTADOR DE SERVICIOS".

POR "LA UNIVERSIDAD"

DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION
GENERAL ADMINISTRATIVA
Y APODERADO LEGAL

POR EL "PROVEEDOR"

CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO
POR SUS PROPIOS DERECHOS

RESPONSABLE DEL TRABAJO

MC. LUIS ANGEL MUÑOZ ROMERO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
 Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

LAS FIRMAS QUE APARECEN EN ESTA HOJA SE REFIEREN AL CONTRATO QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO Y CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO, CON EL OBJETO DE LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL -----

ANEXO I

CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

Calz. Antonio Narro 1923, Buenavista, 25315 Saltillo, Coah.

Tel: (844) 4-11-02-00

TRABAJOS: MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL

NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS A LOS QUE CORRESPONDA INCLUYE: SUMINISTRO, ELABORACIÓN, INSTALACIÓN, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, APLICACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRAZO, HERRAJES, CORTES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PROTECCIÓN DE LOS MUEBLES Y MATERIALES EXISTENTES, FLETES, ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO A 5 KMS. FUERA DE LA UNIVERSIDAD, VELADOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	TOTAL
1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE MARCA BEREL EN COLOR BLANCO, LINEA SUMA, EN LABORATORIO DE NUTRICIÓN ANIMAL (INCLUYE: APLICACION A 2 MANOS, ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN)	M2	215.00	\$145.00	\$31,175.00
1.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA MARCA BEREL EN COLOR BLANCO, LINEA BERELINTE, EN LABORATORIO DE NUTRICIÓN ANIMAL (INCLUYE: APLICACION A 2 MANOS, ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN)	M2	495.00	\$90.00	\$44,550.00



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
 Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

1.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YESO A PLOMO EN PLAFONES DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO DE YESO FALSAMENTE ADHERIDO EN PLAFONES, INCLUYE ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION)	M2	230.00	\$320.00	\$73,600.00
1.4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MESAS DE LABORATORIO "1,80 X 5 MTS" (EL SERVICIO CONSTA DE APLICACION DE RECINA EPOXICA EN TODA EL AREA DE CUBIERTA PARA CREAR UNA CAPA RESISTENTE Y UN ACABADO BRILLOSO TIPO HUMEDO EN LAS MESAS, PINTURA DE 24 VALVULAS DE GAS, PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO A CAJONES Y GAVETAS EN INTERIOR Y EXTERIOR DE MESAS).	PZA	4.00	\$4,000.00	\$16,000.00
1.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED CON MEDIDAS DE 1.20 M, (INCLUYE DESMONTAJE DE LAMPARAS DAÑADAS EXISTENTES CON RECUPERACION PARA LA UNIVERSIDAD, E INTERCONEXIONES DE LAMPARAS NUEVAS, FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION)	PZA	12.00	\$850.00	\$10,200.00
1.6	SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS EN AMBAS CARAS DEL LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DE SER NECESARIO, AL IGUAL QUE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA LIMPIEZA)	PZA	30.00	\$30.00	\$900.00
1.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE, MEZCLADORA, JUEGO DE HERRAJES Y FABRICACION DE MUROS LATERALES DE CONCRETO CON ACABADOS PARA RECIBIR TARJA (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACION Y ACABADO)	PZA	1.00	\$9,200.00	\$9,200.00
1.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA TIPO BARRA, MARCA PHILIPS O SIMILAR (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION)	PZA	1.00	\$1,800.00	\$1,800.00
1.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE A PUERTAS Y ACCESOS DEL LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE PREPARACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION)	PZA	14.00	\$800.00	\$11,200.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Carretera Interamericana s/n, San Juan de los Rios, Santo Domingo, D.R. 54118
 Teléfono: (809) 447-0200 y 447-0201 Fax: (809) 447-0202

1.9	M2	200.00	\$250.00	\$50,000.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YESO A PLOMO EN PLANOS DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO DE YESO FALSAMENTE ADHERIDO EN PLANOS, INCLUYE ANDAMIOS ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION)
1.8	PZA	4.00	\$4,000.00	\$16,000.00	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MESA DE LABORATORIO "1.80 X 5 MTS" (EL SERVICIO CONSTA DE APLICACION DE RESINA EPOXICA EN TODA EL AREA DE CUBIERTA PARA CREAR UNA CAPA RESISTENTE Y UN ACABADO BRILLOSO TIPO HUMEDO EN LAS MESA. PINTURA DE 24 VALVULAS DE GAS. PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO A CAJONES Y GAVETAS EN INTERIOR Y EXTERIOR DE MESA)
1.5	PZA	12.00	\$885.00	\$10,620.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED CON MEDIDAS DE 120 M (INCLUYE DESMONTAJE DE LAMPARAS DAÑADAS EXISTENTES CON RECUPERACION PARA LA UNIVERSIDAD E INTERCONEXIONES DE LAMPARAS NUEVAS, FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION)
1.6	PZA	20.00	\$200.00	\$4,000.00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS EN AMBAS CARAS DEL LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DE SER NECESARIO AL IGUAL QUE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA LIMPIEZA)
1.7	PZA	1.00	\$8,200.00	\$8,200.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE, MEZCLADORA, JUEGO DE HERRALES Y FABRICACION DE MUROS LATERALES DE CONCRETO CON ACABADOS PARA RECIBIR TARJA (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACION Y ACABADO)
1.8	PZA	1.00	\$1,800.00	\$1,800.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA TIPO BARRA MARCA PHILIPS O SIMILAR (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION)
1.9	PZA	14.00	\$800.00	\$11,200.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE A PUERTAS Y ACCESOS DEL LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE PREPARACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION)



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
 Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

1.1	MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE EPOXICO A MAQUINA KJELDAHL EN EL AREA DE CUBICULOS DEL LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE PREPARACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION)	PZA	2.00	\$2,000.00	\$4,000.00
1.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE CON COLORES REPRESENTATIVOS A TUBERIAS HIDRAULICAS, DE GAS Y CONTRA INCENDIOS DEL LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE PREPARACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION)	ML	60.00	\$ 80.00	\$4,800.00
DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.				SUBTOTAL	\$ 207,425.00
TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESO 00/100 M.N.				IVA	\$ 33,188.00
DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTO TRECE PESOS 00/100 M.N.				TOTAL	\$ 240,613.00

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



Universidad Agraria Antonio Nariño

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Carrera Alfonso Bello 1823 U.E. Universidad Agraria Antonio Nariño
 Bogotá (Colombia) - Teléfono: 228 7000 (línea) - 228 7000 (línea) - 228 7000 (línea)

1.1	LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE PREPARACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION)	2.00	\$2.000.00	\$4.000.00
1.1.1	NUTRICION ANIMAL (INCLUYE PREPARACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION)	00.00	\$ 80.00	\$4.800.00
DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTO TRECE PESOS 00100 M.N.				
TOTAL			\$ 240.813.00	
DOSCIENTOS Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00100 M.N.				
IVA			\$ 33.188.00	
SUBTOTAL			\$ 207.458.00	
DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00100 M.N.				



Universidad Autónoma Agraria Narro Antonio

Necesidades de Mantenimiento y Encuesta Satisfacción de Cliente

Código F 6.17

Fecha Revisión 15/11/07

Revisión No. 0

Tiempo de Retención Un Año Después de su Vida Útil

Solicitud No. 936
 Área / Depto.: _____
 Nom. Del Solicitante: M.C. CAMELIA CRUZ RODRIGUEZ
 Ubicación NUTRICION ANIMAL

Fecha Elab. Solicitud: 05/03/2024
 Fecha Rec. Mto. 05/03/2024
 Fecha Rec. Supervisor: 06/05/24
 Fecha Rec. Material: _____
 Fecha Elabor. Vale Con. _____
 Fecha Eng. Oper.y/o Provee _____

Acciones a Realizar: _____

Causa y/o Raíz: _____

Material requerido: _____

Marque con una X el recuadro requerido

Herramientas requeridas

- Equipo de Carpintería
- Equipo de Fontanería
- Equipo de Electricidad
- Equipo de Tabla roca
- Equipo de Herrería
- Equipo de Agua

- Equipo de Pintura
- Equipo de Albañilería
- Equipo de Teléfonos
- Equipo de Jardinería
- Equipo de Limpieza
- Equipo de Oficina

Días estimados hábiles de inicio del Mto

1 3 6 9 12 15 mas _____

Días estimados hábiles de termino del Mto

1 3 6 9 12 15 mas _____

Operadores Requeridos

1 2 3 4 5 6 7

Observaciones: _____

Nombre y Firma del Supervisor

[Handwritten Signature]

Nombre y Firma del Oper. / Provee.

[Handwritten Signature]
Claudia V Duran

Fecha, Nombre y Firma del Usuario

7 - Mayo - 24
[Handwritten Signature]
M.C. Camelia Cruz Rdz

Encuesta Satisfacción del Cliente

Tiempo estimado de inicio de Mto. u Obra.

- Antes del tiempo estimado
- Justo a tiempo estimado
- Después del tiempo estimado

Tiempo estimado de término de Mto. u Obra .

- Antes del tiempo estimado
- Justo a tiempo estimado
- Después del tiempo estimado

Los materiales fueron los adecuados para el Mto.

SI NO

El mantenimiento se realizó como lo solicitó.

BIEN REGULAR MAL

Observaciones: _____



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Solicitud de Mantenimiento	Código F 6.16	Fecha Revisión 15/11/07	Revisión No. 0
	Tiempo de Retención Un Año Después de su Vida Útil		

No. Solicitud: 936 Fecha: 05-mar-24

Fecha de Falla: _____

Área y/o Departamento:	NUTRICIÓN ANIMAL	Prog.	SubProg.	Proy.	E.U.J.	Partida	Monto Sistema
Nombre del Solicitante:	M.C. CAMELIA CRUZ RODRÍGUEZ	25	311	220	3623	220	

Marque con una X el el servicio de Mantenimiento que requiere.

<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Limpieza
<input type="checkbox"/> Pintura	<input type="checkbox"/> Electricidad	<input type="checkbox"/> Abastecimiento de Agua
<input type="checkbox"/> Fontanería	<input type="checkbox"/> Teléfonos	<input type="checkbox"/> Cerrajería
<input type="checkbox"/> Tabla Roca	<input type="checkbox"/> Equipo de Oficina	<input type="checkbox"/> Jardinería
<input type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Equipo de Laboratorio	Otros: X

Defectuoso de falla o daño en equipo: MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL
 (YESO, PINTURA ESMALTE, PINTURA VINILICA , INTALACION DE MESA CON TARJA , LAMPARAS , Y EXTRACTOR MESAS LAP.)
PINTURA AL KJENDHAL , PINTURA AL RAC METALICO

<p><u>M.C. CAMELIA CRUZ RODRIGUEZ</u> Firma Solicitante</p> <p><u>M.C. CAMELIA CRUZ RODRIGUEZ</u> Vo.Bo. Jefe de Departamento o Área JEFA DEL DEPTO. NUTRICIÓN ANIMAL</p>	<p>Sello de Recibido-Mtto.</p> <p>Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro</p> <p>05 MAR 2024</p> <p>RECIBIDO</p> <p>ÁREA DE MANTENIMIENTO</p>	<p><u>[Firma]</u> Nombre Recibido en Mtto.</p>
---	--	--

8

2000

1/2

1/2

1/2



PRESUPUESTOS 2024
INFORME DE ACTUACION DEL PRESUPUESTO - 2025-03-26

Area exclusiva para el sello
fechador de recepción

ENTIDAD 5 COAHUILA DE ZARAGOZA
REGION 5
MUNICIPIO 30 SALTILLO
FINALIDAD 25311 PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR
UNIDAD 410302001 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
SUBPROGRAMA 4151 Mantenimiento de Obra de Interes General
RESPONSABLE 2050 MUÑOZ ROMERO LUIS ANGEL

--- * ---

Table with 10 columns: Part., Descripción de la Partida, Asignado, Modificado, Compr., Deven., Ejercido, Pagado, Disp. a la Fecha, Disponible. Rows include: 3510100 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos; Total del Capítulo 3; TOTAL DEL PROYECTO.

Techo Financiero: \$ 22,827,175.00

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE

No.POL	FECHA	CUENTA	BEN.	NUM.BEN.	PROY.	DOC	NUM.DOC.	DESCRIPCIÓN	STS	SDO.IN.	CARGO	ABONO	SDO.FIN.
5-B-1015	2024-05-28	5135-1000	PAR	3510100	4151	PAG	1445	FACTURA NO. DC952/ SOL 936 MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICIÓN ANIMAL	P		240,613.00	0.00	
5-B-1015	2024-05-28	2112-1000	PRV	1539	4151	PAG	1445	FACTURA NO. DC952/ SOL 936 MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICIÓN ANIMAL	P		0.00	240,613.00	
5-B-1015	2024-05-28	2112-1000	PRV	1539	4151	PAG	1445	CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO	P		240,613.00	0.00	
5-P-3137	2024-05-21	8221-0000				PAG	1445	MOVIMIENTO AUTOMATICO (AC) DOC: PAG - 1445	P		0.00	240,613.00	
5-P-3137	2024-05-21	8241-0000				PAG	1445	MOVIMIENTO AUTOMATICO (AC) DOC: PAG - 1445	P		240,613.00	0.00	
5-P-3531	2024-05-23	8251-0000				PAG	1445	MOVIMIENTO AUTOMATICO (CD) DOC: PAG - 1445	P		240,613.00	0.00	
5-P-3531	2024-05-23	8241-0000				PAG	1445	MOVIMIENTO AUTOMATICO (CD) DOC: PAG - 1445	P		0.00	240,613.00	
5-P-4535	2024-05-28	8271-0000				PAG	1445	MOVIMIENTO AUTOMATICO (DP) DOC: PAG - 1445	P		240,613.00	0.00	
5-P-4535	2024-05-28	8251-0000				PAG	1445	MOVIMIENTO AUTOMATICO (DP) DOC: PAG - 1445	P		0.00	240,613.00	
5-P-4535	2024-05-28	8261-0000				PAG	1445	MOVIMIENTO AUTOMATICO (DP) DOC: PAG - 1445	P		240,613.00	0.00	
5-P-4535	2024-05-28	8261-0000				PAG	1445	MOVIMIENTO AUTOMATICO (DP) DOC: PAG - 1445	P		0.00	240,613.00	
TOTALES										0.00	1,443,678.00	1,203,065.00	240,613.00

Fecha del Reporte: 2:30pm on Thursday 20th March 2025



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-05-01015** ✓

Elab : 2024-05-28

Cheque No.

Imprimir

Referencia DEP: CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO - FACTURA NO. DC952 MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICIÓN ANIMAL CONTRATO NO. 019/24 AD. MTTO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	1539	PAG	1445	CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO	\$ 240,613.00	
5135-1000	PAR	3510100	PAG	1445	FACTURA NO. DC952/ SOL 936 MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICIÓN ANIMAL	\$ 240,613.00	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 1445 DEP) CLAUDIA VERONICA DUR - FACTURA NO. DC952 MANTENIMIENT		\$ 240,613.00
2112-1000	PRV	1539	PAG	1445	FACTURA NO. DC952/ SOL 936 MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICIÓN ANIMAL		\$ 240,613.00
TOTALES POLIZA						\$ 481,226.00	\$ 481,226.00

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B.05-1015
4535



Pagos SPEI enviados

Fecha: 28/05/2024
Hora: 09:01:15
Página: 1

Fecha valor 28/05/2024 Clave de Rastreo: HSBC386480
Fecha de liquidación: 28/05/2024 Hora de liquidación: 14:47:28 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4001749597
Nombre del Ordenante: A UAAAN
Referencia del ordenante: F DC952 CLAUDIA
Comisión cobrada: 0.00
Moneda: MXN
Monto: 240,613.00

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 012078015037435789 Referencia Numérica: 1445
Nombre del Beneficiario: DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA
Banco Receptor: BBVA BANCOMER
Concepto de Pago: F DC952 CLAUDIA



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
PAGO DIRECTO
 FORMATO: F-7.14-1

Imprimir



DOCUMENTO No. 1445 PAGO DIRECTO

Entidad Federativa : **5 - COAHUILA DE ZARAGOZA**

Región : **5 -**

Municipio : **30 - SALTILLO**

Finalidad : **25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR**

Entidad Responsable : **410302001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO**

Sub Programa : **4151 - Mantenimiento de Obra de Interes General**

Solicitante **2050-MUÑOZ ROMERO LUIS ANGEL**

Concepto **FACTURA NO. DC952 MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICIÓN ANIMAL CONTRATO NO. 019/24 AD. MTTO.**

BENEFICIARIO PRV-1539 : CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO


Cuenta Bancaria

PENDIENTE

Elaborado : 2024-05-16

Liberado :

Autorizado :




Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3510100	FACTURA NO. DC952/ SOL 936 MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICIÓN ANIMAL	\$ 240,613.00
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 240,613.00

Vo.Bo.	
SOLICITANTE	U.A.A.A.N. AUTORIZADO
MUÑOZ ROMERO LUIS ANGEL	DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO 23 MAY 2024 RODRIGUEZ ACOSTA NATALIA MONSERRAT

P-05-3137
P-05-3531

ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA
ENCARGADO DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO





Saltillo Coahuila a 06 de Mayo del 2024.

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

A QUIEN CORRESPONDA

A través de este medio se informa que recibí de la **UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO** la cantidad de **\$240,613.00** (doscientos cuarenta mil seiscientos trece pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. **MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL** del contrato número **019/24 AD. MTTO.**

Sin más por el momento quedo de usted.

Atte.

Claudia Verónica Durán Arellano

Soluciones integrales



[Leonardo Moreno, cel:844174 70 18, E-mail mse.salttillo@gmail.com]

Gracias por hacer negocios con nosotros!

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGUASCALIENTES
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS



Salvo Contratación a partir del día 2024

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGUASCALIENTES

A QUIEN CORRESPONDA

LABORATORIO Y CURSOS DE NUTRICIÓN ANIMAL del contrato número 01324 AG.
MANTENIMIENTO DEL
LABORATORIO Y CURSOS DE NUTRICIÓN ANIMAL del contrato número 01324 AG.
LABORATORIO Y CURSOS DE NUTRICIÓN ANIMAL del contrato número 01324 AG.
LABORATORIO Y CURSOS DE NUTRICIÓN ANIMAL del contrato número 01324 AG.
LABORATORIO Y CURSOS DE NUTRICIÓN ANIMAL del contrato número 01324 AG.
LABORATORIO Y CURSOS DE NUTRICIÓN ANIMAL del contrato número 01324 AG.

sin más por el momento. Queda a disposición de usted.

Atte.

Dr. Víctor Manuel Aguilar

Director del Laboratorio

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGUASCALIENTES
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS





SOLUCIONES INTEGRALES

RFc emisor: DUAC790607IK3 **Folio fiscal:** 49995D85-3E82-41CA-BC6E-B14F2AFDC952
Nombre emisor: CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO **No. de serie del CSD:** 00001000000512478710
Folio: 936 **Serie:** A
RFc receptor: UAA750303NHA **Código postal, fecha y hora de emisión:** 25010 2024-05-06 00:43:42
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 25315 **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
80111618	servicio	1.00	E48	Unidad de servicio	207,425.00	207,425.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL contrato: 019/24 AD.MTTO Solicitud: 936 Proveedor: 1539				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	207,425.00	Tasa	16.00%	33,188.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 207,425.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 33,188.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 240,613.00

Sello digital del CFDI:

VJU1dChsv5ooRgXOwix4q8OyC2NC+4BrhmXVTGblRXYAumleECXaaPWEw1uCG1NGLcBnaDTRvnculjph4EO6MqUqB9i3AnT7vJjzpY2OqsVLkCgX6KTtC4gsvyxFLjJo3d/viHOpdlCqoq+G9qolav543vTXHFN81Q8xnFzh8JuUbpSRI4dEXe9+oBGC/qXS4glAhhqxC1hyRBHcWEZnzQ97SnaHyIMv608c3yD2ZjkU/GTxf/enmlsqmcBS/8C5pkSruoY7cVt0XtzqoydJtBHf919VMWT9cL0R8c3o+JQX/6ZStCCZo6EpNA9UnVMinMK1XZlqwFw09eXPQ==

Sello digital del SAT:

Q6tY1db94vH5phBesGc95wYeZ5CAJVhGcZvSju2l0ktySiiH57dreJBc16S8//SQpB207D3Cl84qSx7yc6CRWcXKRypS+ob/HqLEKPDEFJQOHybywIBoP5oNHRb3Lc4FPCFVJDwCGzL866kPolJAItbUyowLUktNQdpZAH50ldFWKqkdI97m807stIjKuxUeQcFFB6FmJ/ObPVYsrfxawj+rMgthUhiUUMFhr47oje3NLbjZeFkRdrQPrtGRcFIzmsuUg1T0TYS/aos9daZUMbVOWpBmuQW+Ol2y0xPuQnt+oE58AZD083dHA7dSwt1SaczfqnphHufS1A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|49995D85-3E82-41CA-BC6E-B14F2AFDC952|2024-05-06T00:45:29|SAT970701NN3|VJU1dChsv5ooRgXOwix4q8OyC2NC+4BrhmXVTGblRXYAumleECXaaPWEw1uCG1NGLcBnaDTRvnculjph4EO6MqUqB9i3AnT7vJjzpY2OqsVLkCgX6KTtC4gsvyxFLjJo3d/viHOpdlCqoq+G9qolav543vTXHFN81Q8xnFzh8JuUbpSRI4dEXe9+oBGC/qXS4glAhhqxC1hyRBHcWEZnzQ97SnaHyIMv608c3yD2ZjkU/GTxf/enmlsqmcBS/8C5pkSruoY7cVt0XtzqoydJtBHf919VMWT9cL0R8c3o+JQX/6ZStCCZo6EpNA9UnVMinMK1XZlqwFw09eXPQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-06 00:45:29

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



(Handwritten signatures and marks)


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" LugarExpedicion="25010"
MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="240613.00" Moneda="MXN" SubTotal="207425.00"
Certificado="MHGSzCCBDOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTI0Nzg3MTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQOQDBdBVVRPT
NoCertificado="00001000000512478710" FormaPago="03"
Sello="VJU1dChsv5ooRgXOwix4q8OyC2NC+4BrhmXVTGbIRXYAumIeECXaaPrWEw1uCG1NGLcBnaDTRvnCuIjpH4EO6MqUqB9i3AnT7vJjzpY2OqsVl
Fecha="2024-05-06T00:43:42" Folio="936" Serie="A" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO" Rfc="DUAC790607IK3"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" Rfc="UAA750303NHA" UsoCFDI="G03"
    RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="25315"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="207425.00" ValorUnitario="207425" Descripcion="MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y
      CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL" contrato: 019/24 AD.MTTO Solicitud: 936 Proveedor: 1539 Unidad="Unidad de servicio"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Noidentificacion="servicio" ClaveProdServ="80111618">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="33188.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="207425.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="33188.00">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="33188.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="207425.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="Q6tY1db94vH5phBesGc95wYeZ5CAJVhGCeZvSju2I0ktySiiH57dreJBcl6S8/SQpB2O7D3CI8t4qSx7yc6CRWcXKRypS+ob/HqLEl
      NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
      SelloCFD="VJU1dChsv5ooRgXOwix4q8OyC2NC+4BrhmXVTGbIRXYAumIeECXaaPrWEw1uCG1NGLcBnaDTRvnCuIjpH4EO6MqUqB9i3A
      RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2024-05-06T00:45:29" UUID="49995D85-3E82-41CA-BC6E-B14F2AFDC952"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
  
```

The Commission on the Status of Women, in its 1995 report, "Women 2000: Gender Equality, Development and Peace", stated that women's empowerment is essential for sustainable development. The Commission also noted that women's participation in decision-making is crucial for the achievement of the Millennium Development Goals.

The Commission further stated that women's empowerment is not only a goal in itself, but also a means to achieve other development goals. It is through women's empowerment that we can achieve sustainable development, peace, and justice for all.

The Commission also noted that women's empowerment is a cross-cutting issue that affects all areas of development. It is therefore essential to mainstream gender equality in all development policies and programs.

The Commission further stated that women's empowerment is a shared responsibility that requires the active participation of all stakeholders, including governments, the private sector, civil society, and the media.

The Commission also noted that women's empowerment is a long-term process that requires sustained commitment and resources. It is therefore essential to build a strong and inclusive coalition of partners to support women's empowerment.

The Commission further stated that women's empowerment is a key to achieving the Millennium Development Goals, particularly in the areas of poverty reduction, education, health, and environmental sustainability.

The Commission also noted that women's empowerment is a key to achieving the Sustainable Development Goals, particularly in the areas of economic growth, social inclusion, and environmental sustainability.

The Commission further stated that women's empowerment is a key to achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development, particularly in the areas of economic growth, social inclusion, and environmental sustainability.

The Commission also noted that women's empowerment is a key to achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development, particularly in the areas of economic growth, social inclusion, and environmental sustainability.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DUAC790607IK3	CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO	UAA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
49995D85-3E82-41CA-BC6E-B14F2AFDC952	2024-05-06T00:43:42	2024-05-06T00:45:29	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$240,613.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DUAC1906071K8	CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO	UAA150303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha de certificación SAT	PAC que certifica
19995D85-3E82-41CA-508B-B14F2AFDC952	2024-02-06T00:13:42	2024-05-08T00:46:29	SAT19707071N13
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
2240.613.00	Ingreso	Vigencia	Cancelado sin aceptación

Imprimir



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

**Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y
Contratación de Servicios**

Calzada Antonio Narro 1923, Colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 4110200 ext. 2014. Tel.dir (844) 411 02 08
e-mail: administrativa@uaaan.edu.mx - Página Web: www.uaaan.edu.mx



Saltillo, Coah. A 03 de marzo de 2024

CONSTANCIA

La Dirección General Administrativa de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro hace constar que:

El proveedor **CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO**, en cumplimiento al contrato **019/24 AD. MTTO. "MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL"**, y con fundamento en el Artículo 48 de la Ley de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas, entrega a esta Universidad, a fin de garantizar el anticipo, el cumplimiento y vicios ocultos de las obligaciones contraídas en el referido contrato lo siguiente:

Cheque emitido por la Institución Bancaria BBVA BANCOMER, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero.

Derivado de la cuenta: 00479009787

Cheque Número: 000022

Cantidad: \$20,742.50 (veinte mil setecientos cuarenta y dos pesos 50/100 M.N.) por el 10% de garantía cumplimiento.

Cheque Número: 000023

Cantidad: \$20,742.50 (veinte mil setecientos cuarenta y dos pesos 50/100 M.N.) por el 10% de garantía vicios ocultos.

Sucursal: 941, Saltillo, Coah. Plaza Mirasierra

Titular de la cuenta: CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO

Quedarán bajo resguardo de esta Dirección y a su vez serán liberados cuando haya concluido el servicio del objeto del contrato de forma satisfactoria para la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

**ATENTAMENTE
ALMA TERRA MATER**

**DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO
ENCARGADO DEL DEPACHO DE LA DIRECCION GENERAL ADMVA.
Y PRESIDENTE DEL CAACS**

Ccp. Archivo

BBVA

15526290

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 03 - Marzo - 2024

Universidad Autonoma Agraria Antonio N \$ 20,742.50

CON LETRA veinte mil setecientos cuarenta y dos pesos ^{50/100} Moneda Nacional

* D0300

CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO
OFICINA : 0941 PLAZA MIRASIERRA SALTILLO
No DE CUENTA: 00479009787
SALTILLO, COAH.

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.

Firma (s)

76251510780175100479009787#0000021

CUENTA No.

CHEQUE No.

BBVA

37146892

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 03 Marzo 2024

Universidad Autonoma Agraria Antonio \$ 20,742.50

CON LETRA Veinte mil setecientos cuarenta y dos pesos ^{50/100} Moneda Nacional

* D0300

CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO
OFICINA : 0941 PLAZA MIRASIERRA SALTILLO
No DE CUENTA: 00479009787
SALTILLO, COAH.

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.

Firma (s)

16841510780175100479009787#0000022

CUENTA No.

CHEQUE No.



Saltillo Coahuila a 25 de Marzo del 2024

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

A QUIEN CORRESPONDA

A través de este medio se informa que el día 25 de Marzo del 2024 se da inicio los trabajos aprobados de **MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL** del contrato número **019/24 AD. MTTO.**

Sin más por el momento quedo de usted.

Atte.

Claudia Verónica Durán Arellano

Soluciones integrales



[Leonardo Moreno, cel:844174 70 18, E-mail mse.salttillo@gmail.com]

Gracias por hacer negocios con nosotros!





Saltillo Coahuila a 30 de Abril del 2024.

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

A QUIEN CORRESPONDA

A través de este medio se informa que el día 30 de Abril se finaliza el trabajo aprobado de **MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL** del contrato número **019/24 AD. MTTO.**

Sin más por el momento quedo de usted.

Atte.


Claudia Verónica Durán Arellano

Soluciones integrales



[Leonardo Moreno, cel:844174 70 18, E-mail mse.salttillo@gmail.com]

Gracias por hacer negocios con nosotros!



2024 de Abril del 30 a 2024 de Abril del 30

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

A QUIEN CORRESPONDA


A través de este medio se informa que el día 30 de Abril se finaliza el trabajo aprobado de MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL del contrato número 01924 AD.MTTO.

Sin más por el momento quedo de usted.

Atte

Claudia Verónica Durán Arfano

Soluciones Integrales



[Leonardo Moreno, cel: 541174 70 18, E-mail: mce.vstlito@gmail.com]

Gracias por hacer negocios con nosotros!



**SOLUCIONES
INTEGRALES**
MULTISERVICIOS

[Ramon Corona 1229]

FECHA 22 MARZO 2024

[Saltillo Coahuila]

Teléfono: [844 174 70 18]

Asesor de venta: [Leonardo Moreno]

SOLICITUD 936

PROVEDOR # 1539

CLIENTE

[Arq. MARIO GUTIERREZ]

JEFE DE MANTENIMIENTO

[UAAAN] UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Saltillo Coahuila

MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	TOTAL
NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS A LOS QUE CORRESPONDA INCLUYE: SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN , INSTALACIÓN, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, APLICACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRAZO, HERRAJES, CORTES, PROTECCIÓN DE LOS MUEBLES Y MATERIALES EXISTENTES, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE ESCOMBRO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA, VELADOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.					
1,1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE MARCA BEREL EN COLOR BLANCO, LINEA SUMA, EN LABORATORIO DE NUTRICIÓN ANIMAL (INCLUYE: APLICACION A 2 MANOS, ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN)	M2	215,00	145,00	31.175,00
1,2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA MARCA BEREL EN COLOR BLANCO, LINEA BERELINTE, EN LABORATORIO DE NUTRICIÓN ANIMAL (INCLUYE: APLICACION A 2 MANOS, ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN)	M2	495,00	90,00	44.550,00
1,3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YESO A PLOMO EN PLAFONES DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO DE YESO FALSAMENTE ADHERIDO EN PLAFONES, INCLUYE ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION)	M2	230,00	320,00	73.600,00
1,4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MESAS DE LABORATORIO "1,80 X 5 MTS" (EL SERVICIO CONSTA DE APLICACION DE RECINA EPOXICA EN TODA EL AREA DE CUBIERTA PARA CREAR UNA CAPA RESISTENTE Y UN ACABADO BRILLOSO TIPO HUMEDO EN LAS MESAS, PINTURA DE 24 VALVULAS DE GAS, PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO A CAJONES Y GAVETAS EN INTERIOR Y EXTERIOR DE MESAS).	PZAS	4,00	4.000,00	16.000,00



FECHA: 22-ENERO-2024

Proveedor # 1234

Saltillo, Coahuila

Teléfono: (844) 174 70 18

Asesor de Venta: [Nombre]

SOLICITUD 988

PROVEEDOR # 1234

CLIENTE


[A.p. MARIO GUTIERREZ]

JEFE DE MANTENIMIENTO

[UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO MARRO

Saltillo, Coahuila

MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.
TOTAL				
<p>NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS A LOS QUE CORRESPONDA INCLUYE: SUMINISTRO, CONSTRUCCION, INSTALACION, FABRICACION, COLOCACION, APLICACION, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS, ANDAMIOS, TRAZO, HERRAJES, CORTES, PROTECCION DE LOS MUEBLES Y MATERIALES EXISTENTES, PLETES, ACARRONES, LIMPIEZA, RETIRO DE ESCOMBRO A 2 KMS. FUERA DE LA OBRA, VELADOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.</p>				
1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE MARCA BEREL EN COLOR BLANCO, LINEA SUMA EN LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE: APLICACION A MANOS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION)	M2	272.00	142.00
1.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA MARCA BEREL EN COLOR BLANCO, LINEA BERELINTE EN LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE: APLICACION A MANOS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION)	M2	492.00	90.00
1.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YESO A PLOMO EN PLANCHAS DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO DE YESO TALAMANTE ADHERIDO EN PLANCHAS, INCLUYE ANDAMIOS, ACARRONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION)	M2	230.00	320.00
1.4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MESSAS DE LABORATORIO 1.80 X 3 MTS (EL SERVICIO CONSTA DE APLICACION DE RESINA EPOXICA EN TODA EL AREA DE CUBIERTA PARA CREAR UNA CAPA RESISTENTE Y UN ACABADO BRILLOSO TIPO HUMEDO EN LAS MESSAS, PINTURA DE 2A VALVULA DE GAS, PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO A CAJONES Y GAVIETAS EN INTERIOR Y EXTERIOR DE MESSAS)	PLAS	4.00	4,300.00
31,172.00				
14,550.00				
28,650.00				
28,000.00				

1,5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED CON MEDIDAS DE 1.20 M, (INCLUYE DESMONTAJE DE LAMPARAS DAÑADAS EXISTENTES CON RECUPERACION PARA LA UNIVERSIDAD, E INTERCONEXIONES DE LAMPARAS NUEVAS, FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION)	PZAS	12,00	850,00 ✓	10.200,00
1,6	SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS EN AMBAS CARAS DEL LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DE SER NECESARIO, AL IGUAL QUE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA LIMPIEZA)	PZAS	30,00	30,00 ✓	900,00
1,7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE, MEZCLADORA, JUEGO DE HERRAJES Y FABRICACION DE MUROS LATERALES DE CONCRETO CON ACABADOS PARA RECIBIR TARJA (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACION Y ACABADO)	PZAS	1,00	9.200,00 ✓	9.200,00
1,8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA TIPO BARRA, MARCA PHILIPS O SIMILAR (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION)	PZAS	1,00	1.800,00 ✓	1.800,00
1,9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE A PUERTAS Y ACCESOS DEL LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE PREPARACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN)	PZAS	14,00	800,00 ✓	11.200,00
2	MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE EPOXICO A MAQUINA KJELDAHL EN EL AREA DE CUBICULOS DEL LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE PREPARACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION)	PZAS	2,00	2.000,00 ✓	4.000,00
2,1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE CON COLORES REPRESENTATIVOS A TUBERIAS HIDRAULICAS, DE GAS Y CONTRA INCENDIOS DEL LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE PREPARACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN)	ML	60,00	80,00 ✓	4.800,00
TÉRMINOS Y CONDICIONES					
 CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO				SUBTOTAL \$ 207.425,00	
				IVA \$ 33.188,00	
				TOTAL \$ 240.613,00	

Handwritten initials/signature



OBRA CIVIL, ELECTRIFICACION Y SERVICIOS EN GENERAL

Arq. Jaime Alberto González Reyes

REG. FED. DE CAUS. GORJ-740403-465 C.U.R.P. GORJ740403HCLNYM06

CALLE EURIPIDES No. 563 FRACC. VALLE DORADO TEL. 01(844)418-09-04 CEL. 044-844-155-14-09
NEXTEL 231-13-83 I.D. 72*8*26653 SALTILLO, COAHUILA

23-03-24

Solicitud 936

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

DIRECCION: CALZADA ANTONIO NARRO

SOLICITUD: 936

ATENCION: ARQUITECTO MARIO GUTIERREZ (JEFE DE MANTENIMIENTO)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	TOTAL
NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS A LOS QUE CORRESPONDA INCLUYE: SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, APLICACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRAZO, HERRAJES, CORTES, PROTECCIÓN DE LOS MUEBLES Y MATERIALES EXISTENTES, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE ESCOMBRO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA, VELADOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.					
1,1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE MARCA BEREL EN COLOR BLANCO, LINEA SUMA, EN LABORATORIO DE NUTRICIÓN ANIMAL (INCLUYE: APLICACION A 2 MANOS, ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN)	M2	215,00	160,00	34.400,00
1,2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA MARCA BEREL EN COLOR BLANCO, LINEA BERELINTE, EN LABORATORIO DE NUTRICIÓN ANIMAL (INCLUYE: APLICACION A 2 MANOS, ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN)	M2	495,00	110,00	54.450,00
1,3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YESO A PLOMO EN PLAFONES DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO DE YESO FALSAMENTE ADHERIDO EN PLAFONES, INCLUYE ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION)	M2	230,00	420,00	96.600,00
1,4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MESAS DE LABORATORIO "1,80 X 5 MTS" (EL SERVICIO CONSTA DE APLICACION DE RECINA EPOXICA EN TODA EL AREA DE CUBIERTA PARA CREAR UNA CAPA RESISTENTE Y UN ACABADO BRILLOSO TIPO HUMEDO EN LAS MESAS, PINTURA DE 24 VALVULAS DE GAS, PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO A CAJONES Y GAVETAS EN INTERIOR Y EXTERIOR DE MESAS).	PZAS	4,00	6.000,00	24.000,00
1,5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED CON MEDIDAS DE 1.20 M, (INCLUYE DESMONTAJE DE LAMPARAS DAÑADAS EXISTENTES CON RECUPERACION PARA LA UNIVERSIDAD, E INTERCONEXIONES DE LAMPARAS NUEVAS, FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION)	PZAS	12,00	1.200,00	14.400,00
1,6	SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS EN AMBAS CARAS DEL LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DE SER NECESARIO, AL IGUAL QUE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA LIMPIEZA)	PZAS	30,00	60,00	1.800,00
1,7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE, MEZCLADORA, JUEGO DE HERRAJES Y FABRICACION DE MUROS LATERALES DE CONCRETO CON ACABADOS PARA RECIBIR TARJA (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACION Y ACABADO)	PZAS	1,00	12.000,00	12.000,00
1,8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA TIPO BARRA, MARCA PHILIPS O SIMILAR (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION)	PZAS	1,00	2.500,00	2.500,00
1,9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE A PUERTAS Y ACCESOS DEL LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE PREPARACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN)	PZAS	14,00	1.150,00	16.100,00
1,1	MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE EPOXICO A MAQUINA KJELDAHL EN EL AREA DE CUBICULOS DEL LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE PREPARACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION)	PZAS	2,00	4.000,00	8.000,00
				SUBTOTAL	\$ 264.250,00
				IVA	\$ 42.280,00
				TOTAL	\$ 306.530,00

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS

PROYECTO DE OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS

UNIDAD EJECUTIVA: COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS

DIRECCION: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

PROYECTO: OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS

33-03-24
Solicitud 036

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VAL	TOTAL
1.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS. OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS. OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS.	M2	112.00	1.800.00	199.200.00
1.2	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS. OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS. OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS.	M2	112.00	1.100.00	123.520.00
1.3	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS. OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS. OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS.	M2	200.00	420.00	84.000.00
1.4	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS. OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS. OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS.	M2	4.00	2.000.00	8.000.00
1.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS. OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS. OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS.	M2	15.00	1.300.00	19.500.00
1.6	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS. OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS. OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS.	M2	20.00	60.00	1.200.00
1.7	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS. OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS. OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS.	M2	1.00	13.000.00	13.000.00
1.8	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS. OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS. OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS.	M2	1.00	2.800.00	2.800.00
1.9	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS. OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS. OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS.	M2	24.00	1.100.00	26.400.00
2.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS. OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS. OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL CUARTO DE FUERZAS ARMADAS PERUANAS.	M2	1.00	4.000.00	4.000.00
SUBTOTAL 1					364.520.00
SUBTOTAL 2					12.352.00
TOTAL					376.872.00

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

CARLOS ALBERTO BARAGAÑO GARCIA
 RFC: GAGC800805 CI7
 SALTILLO COAHUILA
 MANUEL OTHON 325
 CEL: 8441011653

SOLICITUD 936
 ARQ. MARIO GUTIERREZ
 JEFE DE MTTO DE LA UAAAN



23-03-24
 Solicitud 936

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	TOTAL
NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS A LOS QUE CORRESPONDA INCLUYE: SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, APLICACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRAZO, HERRAJES, CORTES, PROTECCIÓN DE LOS MUEBLES Y MATERIALES EXISTENTES, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE ESCOMBRO A 5 KMS. FUERA DE LA OBRA, VELADOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.					
1,1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE MARCA BEREL EN COLOR BLANCO, LINEA SUMA, EN LABORATORIO DE NUTRICIÓN ANIMAL (INCLUYE: APLICACION A 2 MANOS, ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN)	M2	215,00	150,00	32.250,00
1,2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA MARCA BEREL EN COLOR BLANCO, LINEA BERELINTE, EN LABORATORIO DE NUTRICIÓN ANIMAL (INCLUYE: APLICACION A 2 MANOS, ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN)	M2	495,00	100,00	49.500,00
1,3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YESO A PLOMO EN PLAFONES DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO DE YESO FALSAMENTE ADHERIDO EN PLAFONES, INCLUYE ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION)	M2	230,00	350,00	80.500,00
1,4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MESAS DE LABORATORIO "1,80 X 5 MTS" (EL SERVICIO CONSTA DE APLICACION DE RECINA EPOXICA EN TODA EL AREA DE CUBIERTA PARA CREAR UNA CAPA RESISTENTE Y UN ACABADO BRILLOSO TIPO HUMEDO EN LAS MESAS, PINTURA DE 24 VALVULAS DE GAS, PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO A CAJONES Y GAVETAS EN INTERIOR Y EXTERIOR DE MESAS).	PZAS	4,00	5.000,00	20.000,00
1,5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED CON MEDIDAS DE 1.20 M, (INCLUYE DESMONTAJE DE LAMPARAS DAÑADAS EXISTENTES CON RECUPERACION PARA LA UNIVERSIDAD, E INTERCONEXIONES DE LAMPARAS NUEVAS, FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION)	PZAS	12,00	1.000,00	12.000,00
1,6	SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS EN AMBAS CARAS DEL LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DE SER NECESARIO, AL IGUAL QUE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA LIMPIEZA)	PZAS	30,00	40,00	1.200,00
1,7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE, MEZCLADORA, JUEGO DE HERRAJES Y FABRICACION DE MUROS LATERALES DE CONCRETO CON ACABADOS PARA RECIBIR TARJA (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACION Y ACABADO)	PZAS	1,00	10.500,00	10.500,00
1,8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA TIPO BARRA, MARCA PHILIPS O SIMILAR (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION)	PZAS	1,00	2.500,00	2.500,00
1,9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE A PUERTAS Y ACCESOS DEL LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE PREPARACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN)	PZAS	14,00	1.200,00	16.800,00
1,1	MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE EPOXICO A MAQUINA KJELDAHL EN EL AREA DE CUBICULOS DEL LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE PREPARACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION)	PZAS	2,00	3.200,00	6.400,00
1,11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE CON COLORES REPRESENTATIVOS A TUBERIAS HIDRAULICAS, DE GAS Y CONTRA INCENDIOS DEL LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE PREPARACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN)	ML	60,00	100,00	6.000,00
				SUBTOTAL	\$ 237.650,00
				IVA	\$ 38.024,00
				TOTAL	\$ 275.674,00

SOLUCIONES INTEGRALES



[Ramon Corona 1229]
[Saltillo Coahuila]
Teléfono: [844 174 70 18]

CARATULA DE ESTIMACION

CLAVE:	CONTRATO No.: 019-24 AD MITTO	PERIODO: DEL 26 DE MARZO 2024 AL 30 DE ABRIL 20:	ESTIMACION 1
OBRA : MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL		UBICACIÓN: Saltillo, Coah Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315 Commutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208	

ESTIMACION	RETENCIONES
IMPORTE ESTA ESTIMACION S/IVA: 207.425,00 AMORTIZACION DEL ANTICIPO (40%) S/ IVA (-): 0,00 SUBTOTAL: 207.425,00 16% Iva: 33.188,00 TOTAL: 240.613,00	RETENCION I.C.I.C. (-): 0,00 RETENCION I.V.C.(-): 0,00 PENA CONVENCIONAL (-): 0,00 TOTAL RETENCIONES: 0,00
NETO A PAGAR	240.613,00
(TOTAL CON LETRA M.N)	
DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M.N.	

RECIBI

[Signature]

CLAUDIA VERONICA DURAN
SOLUCIONES INTEGRALES

[Signature]
MC. LUIS ANGELO MUÑOZ ROMERO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
GENERALES

СЕРВИСЫ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
ИТЕРАТИВНО

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
ИТЕРАТИВНО

ИТЕРАТИВНО

ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ «ИТЕРАТИВНО»
(ООО ИТЕРАТИВНО)

ИТЕРАТИВНО

ИТЕРАТИВНО
ИТЕРАТИВНО
ИТЕРАТИВНО

ИТЕРАТИВНО
ИТЕРАТИВНО
ИТЕРАТИВНО

ИТЕРАТИВНО

ИТЕРАТИВНО

ИТЕРАТИВНО	ИТЕРАТИВНО	ИТЕРАТИВНО

ИТЕРАТИВНО



ИТЕРАТИВНО
ИТЕРАТИВНО
ИТЕРАТИВНО

ИТЕРАТИВНО

SOLUCIONES INTEGRALES



[Ramon Corona 1229]
[Saltillo Coahuila]
Teléfono: [844 174 70 18]

ESTADO DE CUENTA

UBICACIÓN: Saltillo, Coah Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315 Commutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208	CONTRATO No.: 019-24 AD MITTO
OBRA : MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL	DIFERIMIENTO / PRORROGA:
META:	PERIODO CONTRATO: DEL 25 DE MARZO 2024 AL 30 DE ABRIL 2024

IMPORTE CONTRATADO IVA INC.:	240,613.00	IMPORTE DEL ANTICIPO IVA INC.:	-
------------------------------	------------	--------------------------------	---

ESTIM No.-	PERIODO DE ESTIMACION		IMPORTE ESTIMACION	AMORTIZ ANTIC SIN IVA	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL	RETENCIONES			SALDO A PAGAR	
	DE	A						2% I.C.I.C.	5% I.V.C.	OTROS		TOTAL RET
1 Finiquito	25 DE MARZO 24	30 DE ABRIL 24	207,425.00	0.00	207,425.00	33,188.00	240,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,613.00
TOTALES								0.00	0.00	0.00	0.00	240,613.00

SALDO CONTRATADO IVA INC.:	0.00	SALDO POR AMORTIZAR IVA INC.:	0.00
----------------------------	------	-------------------------------	------

CLAUDIA VERONICA DURAN
REPRESENTANTE LEGAL

ARO. MARIO GUTIERREZ
NOMBRE DE SUPERVISOR
SUPERVISOR POR UAAAAN





SOLUCIONES INTEGRALES

JOSE MARIA LAFRAGUA #2447
844 4560389 / 844 2860018
Saltillo, Coah

Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315
Commutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208

OBRA : MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL
CLAVE :
CONTRATISTA : CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO 1539

UBICACION: Saltillo, Coah DIRECCION: Calzada Antonio Narro #1983 Col. Buenavista C.P.25315
CONTRATO No : 01924 AD. MTO

FECHA: 25/03/2024 - 30/04/2024
ESTIMACION: 1,00 FINQUIRO

CLAVE	CONCEPTO	EDIF	LARGO	ANCHO DIAM.	ALTO Kg-Ml.	PZA	VOL. EJECUTADO	VOLUMEN CONTRATADO	U N I	VOLUMEN			E S T A		
										ESTA ESTIMACION	ACUM. TOTAL	E EXCEDENTE	POR EJERCER	P. U.	ESTIMACION
PRELIMINARES INTERIAL															
1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE MARCA BEREL EN COLOR BLANCO, LINEA SUMA, EN LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE: APLICACION A 2 MANOS, ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION)	A	26	0,9			23,4								
		B	26	0,9			23,4								
		RAC	9	1			9								
		VITRINA	5	3			15								
		C	10	2,4			24								
		D	10	1			10								
		E	20	1			20								
		F	20	1			20								
		G	20	1			20								
		H	23	2,5			57,5								
		I	7	2,5			17,5								
							Σ	216,4	M2	215,00	216,40	1,40	0,00	\$ 145,00	\$ 31.175,00

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Claudia Veronica Duran Arellano
CONTRATISTA

ARC. MARIO GUTIERREZ
SUPERVISOR



DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	STATE	CITY	ZIP	ACCOUNT NO.	INITIALS	DATE
1/15/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	1/15/11
1/22/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	1/22/11
1/29/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	1/29/11
2/5/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	2/5/11
2/12/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	2/12/11
2/19/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	2/19/11
2/26/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	2/26/11
3/5/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	3/5/11
3/12/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	3/12/11
3/19/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	3/19/11
3/26/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	3/26/11
4/2/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	4/2/11
4/9/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	4/9/11
4/16/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	4/16/11
4/23/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	4/23/11
4/30/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	4/30/11
5/7/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	5/7/11
5/14/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	5/14/11
5/21/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	5/21/11
5/28/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	5/28/11
6/4/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	6/4/11
6/11/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	6/11/11
6/18/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	6/18/11
6/25/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	6/25/11
7/2/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	7/2/11
7/9/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	7/9/11
7/16/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	7/16/11
7/23/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	7/23/11
7/30/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	7/30/11
8/6/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	8/6/11
8/13/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	8/13/11
8/20/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	8/20/11
8/27/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	8/27/11
9/3/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	9/3/11
9/10/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	9/10/11
9/17/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	9/17/11
9/24/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	9/24/11
10/1/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	10/1/11
10/8/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	10/8/11
10/15/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	10/15/11
10/22/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	10/22/11
10/29/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	10/29/11
11/5/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	11/5/11
11/12/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	11/12/11
11/19/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	11/19/11
11/26/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	11/26/11
12/3/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	12/3/11
12/10/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	12/10/11
12/17/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	12/17/11
12/24/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	12/24/11
12/31/11	CHRYSLER FINANCIAL SERVICES	150.00		CHASE	NY	NEW YORK	10001	123456789	ABC	12/31/11

CHRYSLER FINANCIAL SERVICES
 1500 BROADWAY
 NEW YORK, NY 10001

CHRYSLER FINANCIAL SERVICES
 1500 BROADWAY
 NEW YORK, NY 10001

CHRYSLER FINANCIAL SERVICES
 1500 BROADWAY
 NEW YORK, NY 10001



CHRYSLER FINANCIAL SERVICES
 1500 BROADWAY
 NEW YORK, NY 10001



SOLUCIONES INTEGRALES
 JOSE MARIA LAERAGUA #2447
 844 450398 / 844 2860018
 Saltillo, Coah

Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315
 Contratador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel. dir. (844) 411-0208

OBRA : MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL
 CLAVE :
 CONTRATISTA CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO 1539

UBICACIÓN: Saltillo, Coah DIRECCIÓN: Calzada Antonio Narro #1093 Col. Buenavista C.P. 25315
 CONTRATO No : 019/24 AD. MITO

FECHA: 25/03/2024 - 30/04/2024
 ESTIMACION: 1.00 FINQUIRO

CLAVE	CONCEPTO	NUMEROS GENERADORES				ALTO Kg-MIL	PZA	VOL. EJECUTADO	VOLUMEN CONTRATADO	UNI	VOLUMEN			P.U.	ESTA ESTIMACION	IMPORTE
		EDIF	LARGO	ANCHO DIAM.	AREA						ACUM. TOTAL	E EXCEDENTE	POR EJERCER			
1.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA MARCA BEREL EN COLOR BLANCO. LINEA BERELINTE, EN LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE: APLICACION A 2 MANOS, ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION)	A	3.10	13.00			40.3									
		B	2.20	11.00			24.2									
		C	7.70	2.20			16.94									
		D	11.00	3.10			34.1									
		E (LOZA)	10.00	13.00			130									
		F	3.30	2.30			7.59									
		G	3.30	2.30			7.59									
		H	3.30	2.30			7.59									
		I	3.30	6.60			21.78									
		J	3.30	6.60			21.78									
		K	3.30	6.60			21.78									
		L	3.10	5.00			15.5									
		M	2.20	3.10			6.82									
		N	1.40	2.20			3.08									
		O	10.00	2.20			22									
		P	14.00	0.90			12.6									
		Q	10.00	3.10			31									
		R (LOZA 2)	23.00	0.90			20.7									
			5.00	10.00			50									
							Σ	495.35	495.00	M2	495.00	495.35	0.35	90.00	\$	44,550.00

1.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YESO A PLOMO EN PLAFONES DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO DE YESO FALSAMENTE ADHERIDO EN PLAFONES, INCLUYE ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION)		23.00	10.00			230.00	230.00	M2	230.00	230.00	0.00	0.00	\$	320.00	\$	75,600.00
-----	---	--	-------	-------	--	--	--------	--------	----	--------	--------	------	------	----	--------	----	-----------

[Signature]
 Claudia Verónica Durán Arellano
 CONTRATISTA

[Signature]

[Signature]
 ARQ. MARIO GUTIERREZ
 SUPERVISOR



SOLUCIONES INTEGRALES
 JOSE MARIA LAFRAGUA #2447
 844 4650389 / 844 2860018
 Saitillo, Coch

Buenavista, Saitillo, Coahuila CP 25315
 Computadora (844) 411-0700 ext. 2278. Tel. Dir. (844) 411-0708

OBRA : MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL
 CLAVE :
 CONTRATISTA : CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO 1539

UBICACIÓN: Saitillo, Coch DIRECCIÓN: Calzada Antonio Narro #1993 Col. Buenavista C.P. 25315
 CONTRATO No : 01924 AD. MITO

FECHA: 25/03/2024 - 30/04/2024
 ESTIMACION: 1,00 FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	NÚMEROS GENERADORES					VOLUMEN			E S T I M A C I O N						
		EDIF	LARGO	ANCHO DIAM.	ALTO Kg-Ml.	PZA	VOL. EJECUTADO	VOLUMEN CONTRATADO	UNI	ESTA ESTIMACION	ACUM. TOTAL	EXCEDENTE	POR EJERCER	P.U.	IMPORTE	
1.4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MESAS DE LABORATORIO "1,80 X 5 MTS" (EL SERVICIO CONSTA DE APLICACION DE RESINA EPOXICA EN TODA EL AREA DE CUBIERTA PARA CREAR UNA CAPA RESISTENTE Y UN ACABADO BRILLOSO TIPO HUMEDO EN LAS MESAS, PINTURA DE 24 VALVULAS DE GAS, PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO A CAJONES Y GAVETAS EN INTERIOR Y EXTERIOR DE MESAS).					4,00	4,00	4,00	PZA	4,00	4,00	0,00	0,00	4,000,00	\$	16,000,00
PRELIMINARES INTERIAL																

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Claudia Veronica Duran Arellano
 CONTRATISTA



SOLUCIONES INTEGRALES
 JOSE MARIA LAFRAGUA #2447
 844 4650389 / 844 2860018
 Saltillo, Coah

Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315
 Comutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dlr (844) 411-0208

OBRA : MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL

CLAVE : CONTRATISTA CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO 1539

UBICACIÓN: Saltillo, Coah DIRECCIÓN: Calzada Antonio Narro #1963 Col. Buenavista C.P. 25315

FECHA: 25/03/2024 - 30/04/2024

1.00 FINQUITO

CONTRATO No : 019/24 AD. MITO

CLAVE	CONCEPTO	EDIF	LARGO	ANCHO DIAM.	ALTO Kg-ML	PZA	VOL. EJECUTADO	VOLUMEN CONTRATADO	UNI	ESTA ESTIMACION	VOLUMEN			ESTA ESTIMACION				
											ACUM. TOTAL	E EXCEDENTE	POR EJERCER	P.U.	IMPORTE			
PRELIMINARES INTERIAL																		
1.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED CON MEDIDAS DE 1.20 M, (INCLUYE DESMONTAJE DE LAMPARAS DAÑADAS EXISTENTES CON RECUPERACION PARA LA UNIVERSIDAD, E INTERCONEXIONES DE LAMPARAS NUEVAS, FIACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION)					12,00	12	12,00	PZA	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	\$	850,00	\$	10.200,00
1.6	SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS EN AMBAS CARAS DEL LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DE SER NECESARIO, AL IGUAL QUE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA LIMPIEZA)					30	30,00	30,00	PZA	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	\$	30,00	\$	900,00
1.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARIA DE ACERO INOXIDABLE, MEZCLADORA, JUEGO DE HERRAJES Y FABRICACION DE MUROS LATERALES DE CONCRETO CON ACABADOS PARA RECIBIR TARIA (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACION Y ACABADO)					1,00	1,00	1,00	PZA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	\$	9.200,00	\$	9.200,00
1.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA TIPO BARRA, MARCA PHILIPS O SIMILAR (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION)					1,00	1,00	1,00	PZA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	\$	1.800,00	\$	1.800,00
1.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE A PUERTAS Y ACCESOS DEL LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE PREPARACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN)					14	14,00	14,00	PZA	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	\$	800,00	\$	11.200,00

Claudia Veronica Duran Arellano
 CONTRATISTA

ARQ. MARIO GUTIERREZ
 SUPERVISOR



SOLUCIONES INTEGRALES
 JOSE MARIA LAFRAGUA #2447
 844 4550389 / 844 2860018
 Satfillo, Coah

Buenavista, Satfillo, Coahuila CP 25315
 Comutador (844) 411-9200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-9268

OBRA : MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL
 CLAVE :
 CONTRATISTA CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO 1539

UBICACIÓN: Satfillo, Coah DIRECCIÓN: Calzada Antonio Narro: #1993 Col. Buenavista C.P.25315
 CONTRATO No : 019/24 AD. MITO

FECHA: 25/03/2024 - 30/04/2024
 ESTIMACION: 1.00 FINQUITO

CLAVE	CONCEPTO	NUMEROS GENERADORES					VOL. EJECLUTADO	VOL. CONTRATADO	U N I	VOLUMEN			E S T A										
		EDIF	LARGO	ANCHO DIAM.	ALTO Kg-ML	PZA				ESTA ESTIMACION	ACUM. TOTAL	E EXCEDENTE	POR EJERCER	P.U.	ESTIMACION	IMPORTE							
PRELIMINARES INTERIAL																							
1.10	MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE EPOXICO A MAQUINA KIELDAHL EN EL AREA DE CUBICULOS DEL LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE PREPARACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION)					2	2.00	2.00	PZA	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.000,00	\$	4.000,00						
1.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE CON COLORES REPRESENTATIVOS A TUBERIAS HIDRAULICAS, DE GAS Y CONTRA INCENDIOS DEL LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE PREPARACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION)		60,00	1,00			60,00	60,00	ML	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	80,00	\$	4.800,00						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">ESTA ESTIMACION</td> <td style="width: 10%;">\$</td> <td style="width: 10%;">207.425,00</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$</td> <td>33.188,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$</td> <td>240.613,00</td> </tr> </table>															ESTA ESTIMACION	\$	207.425,00	IVA	\$	33.188,00	TOTAL	\$	240.613,00
ESTA ESTIMACION	\$	207.425,00																					
IVA	\$	33.188,00																					
TOTAL	\$	240.613,00																					

(Handwritten signature/initials)

(Handwritten signature)

Claudia Verónica Durán Arellano
 CONTRATISTA

ARQ. MARIO GUTIERREZ
 SUPERVISOR

SOLUCIONES INTEGRALES



OBRA : MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL

CLAVE : UBICACIÓN: Saltillo, Coah

CONTRATISTA : SOLUCIONES INTEGRALES

CONTRATO: 019/24

ESTIMACION No:

FECHA: 25/03/2024 - 30/04/2024

1,1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE MARCA BEREL EN COLOR BLANCO, LINEA SUMA, EN LABORATORIO DE NUTRICIÓN ANIMAL (INCLUYE: APLICACION A 2 MANOS, ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN)


ANTES:



DESPUES:





DURANTE:

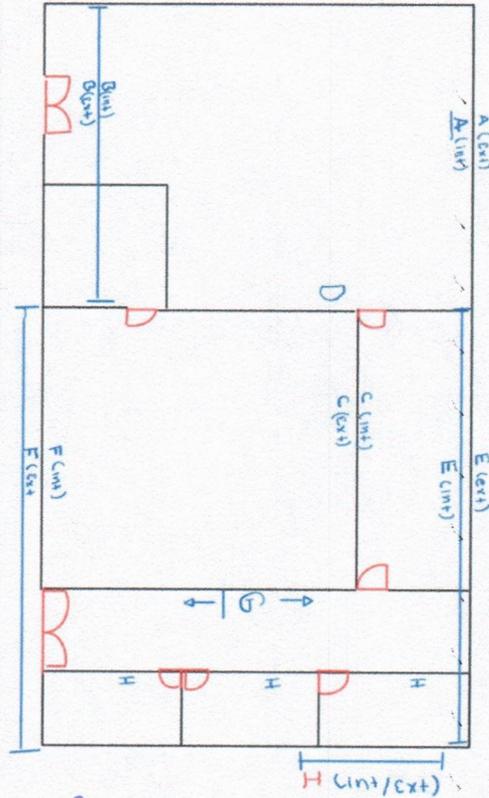

CONTRATISTA

SUPERVISION UAAAN

SOLUCIONES INTEGRALES	
	
OBRA : MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL	
CONTRATO: 01024	SOLUCIONES INTEGRALES
FECHA: 28/03/2024 - 30/04/2024	1.1
APLICACIÓN) APBOCIÓN A 2 MANOS, ANADAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA BLANCO, LINEA SUMA, EN LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE MARCA BEREL EN COLOR	



DESPUES:

ANTES:



ANTE:

SUPERVISION DAAN

CONTRATISTA

SOLUCIONES INTEGRALES



OBRA : MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL

CLAVE : UBICACIÓN: Saltillo, Coah

CONTRATISTA : SOLUCIONES INTEGRALES

CONTRATO: 019/24

ESTIMACION No:

FECHA: 25/03/2024 - 30/04/2024

1,2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA MARCA BEREL EN COLOR BLANCO, LINEA BERELINTE, EN LABORATORIO DE NUTRICIÓN ANIMAL (INCLUYE: APLICACION A 2 MANOS, ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN)


ANTES:



DURANTE:



DESPUES:

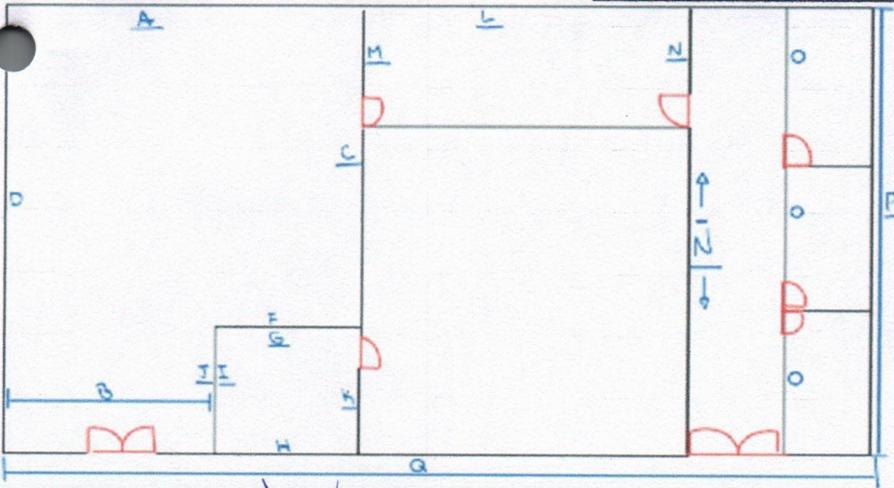

CONTRATISTA

SUPERVISION UAAAN



SOLUCIONES INTEGRALES



OBRA : MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL

CLAVE : UBICACIÓN: Saltillo, Coah

CONTRATISTA : SOLUCIONES INTEGRALES


CONTRATO: 019/24

ESTIMACION No:

FECHA: 25/03/2024 - 30/04/2024

1,3

SUMINISTRO Y COLOCACION DE YESO A PLOMO EN PLAFONES DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO DE YESO FALSAMENTE ADHERIDO EN PLAFONES, INCLUYE ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION)

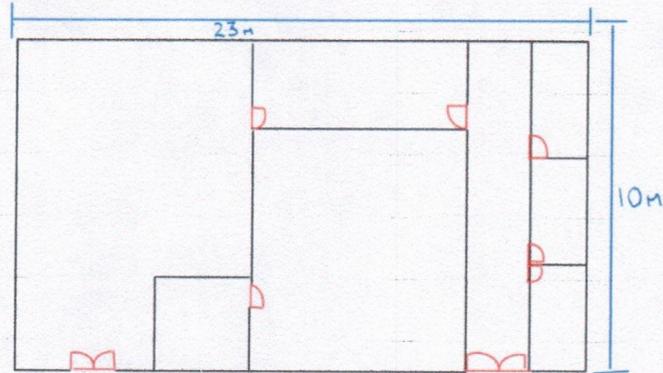

CONTRATISTA

SUPERVISION UAAAN



SOLUCIONES INTEGRALES



OBRA : MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL

CLAVE : UBICACIÓN: Saltillo, Coah


CONTRATISTA : SOLUCIONES INTEGRALES

CONTRATO: 019/24

ESTIMACION No:

FECHA: 25/03/2024 - 30/04/2024


1,4 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MESAS DE LABORATORIO "1,80 X 5 MTS" (EL SERVICIO CONSTA DE APLICACION DE RECINA EPOXICA EN TODA EL AREA DE CUBIERTA PARA CREAR UNA CAPA RESISTENTE Y UN ACABADO BRILLOSO TIPO

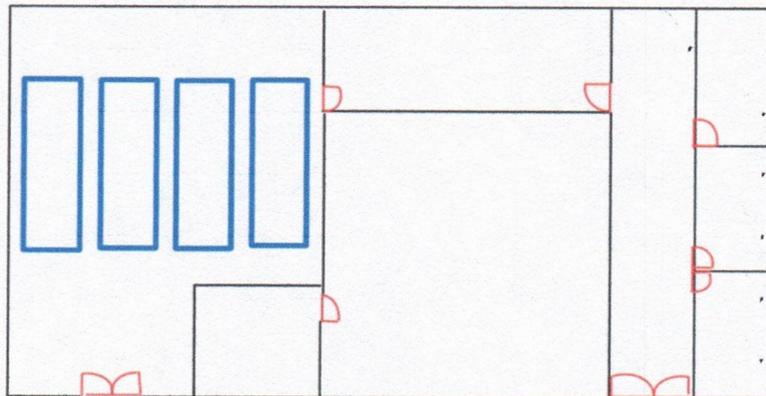

CONTRATISTA



SUPERVISION UAAAN

SOLUCIONES INTEGRALES



OBRA : MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL

SOLUCIONES INTEGRALES		CONTRATO: 01824
FECHA: 28/03/2024 - 30/04/2024		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MESAS DE LABORATORIO 1.80 X 2 MTS (EL)	SERVICIO CONSTA DE APLICACION DE RESINA EPOXICA EN TODA EL AREA DE	CUBIERTA PARA CREAR UNA CARA RESISTENTE Y UN ACABADO BRILLOSO TIPO



SUPERVISOR UAAVM

CONTRATISTA

SOLUCIONES INTEGRALES



OBRA : MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL

CLAVE : UBICACIÓN: Saltillo, Coah



CONTRATISTA : SOLUCIONES INTEGRALES

CONTRATO: 019/24

ESTIMACION No:

FECHA: 25/03/2024 - 30/04/2024

1,5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED CON MEDIDAS DE 1.20 M,
(INCLUYE DESMONTAJE DE LAMPARAS DAÑADAS EXISTENTES CON
RECUPERACION PARA LA UNIVERSIDAD. E INTERCONEXIONES DE LAMPARAS.

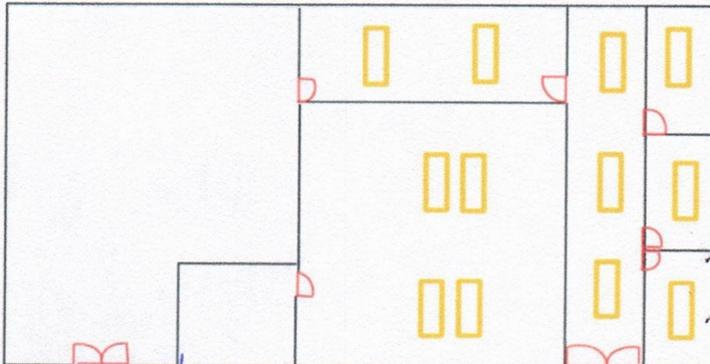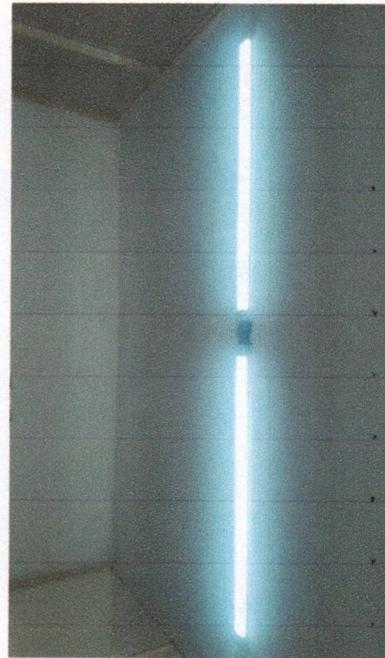

CONTRATISTA

SUPERVISION UAAAN



SOLUCIONES INTEGRALES



OBRA : MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL

CLAVE : UBICACIÓN: Saltillo, Coah


CONTRATISTA : SOLUCIONES INTEGRALES

CONTRATO: 019/24

ESTIMACION No:

FECHA: 25/03/2024 - 30/04/2024

1,6
SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS EN AMBAS CARAS DEL LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DE SER NECESARIO, AL IGUAL QUE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA LIMPIEZA)

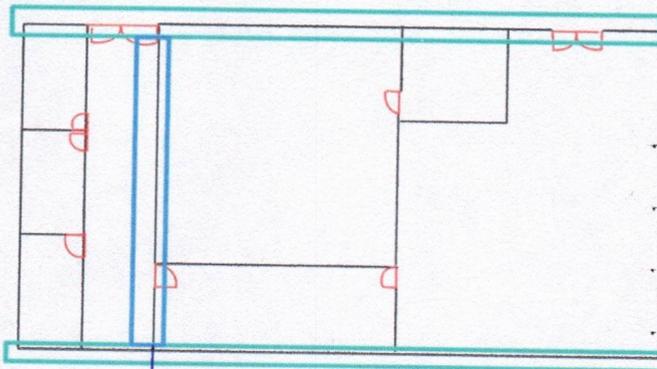

CONTRATISTA

SUPERVISION UAAAN



SOLUCIONES INTEGRALES



OBRA : MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL

CLAVE : UBICACIÓN: Saltillo, Coah

CONTRATISTA : SOLUCIONES INTEGRALES




CONTRATO: 019/24

ESTIMACION No:

FECHA: 25/03/2024 - 30/04/2024

1,7

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE, MEZCLADORA, JUEGO DE HERRAJES Y FABRICACION DE MUROS LATERALES DE CONCRETO CON ACABADOS PARA RECIBIR TARJA (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACION Y ACABADO)

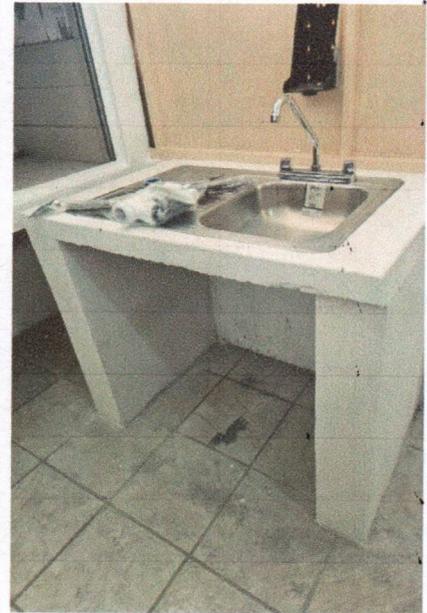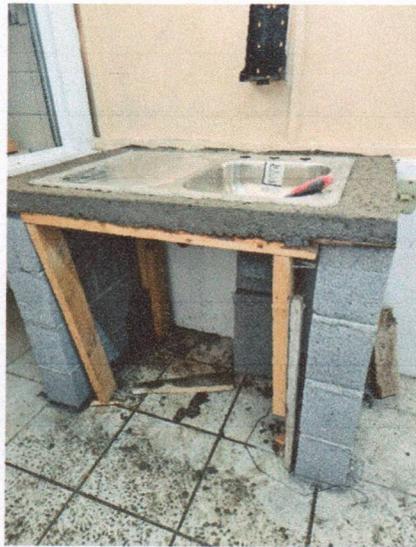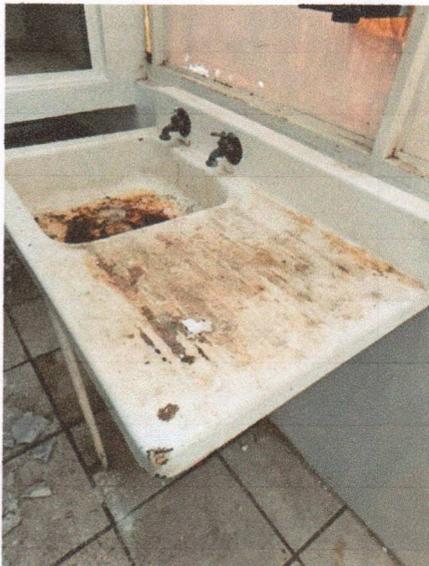

CONTRATISTA

SUPERVISION UAAAN



SOLUCIONES INTEGRALES



OBRA : MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL

CLAVE : UBICACIÓN: Saltillo, Coah

CONTRATISTA : SOLUCIONES INTEGRALES



CONTRATO: 019/24

ESTIMACION No:

FECHA: 25/03/2024 - 30/04/2024

1,8



SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA TIPO BARRA, MARCA PHILIPS O SIMILAR
(INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION)

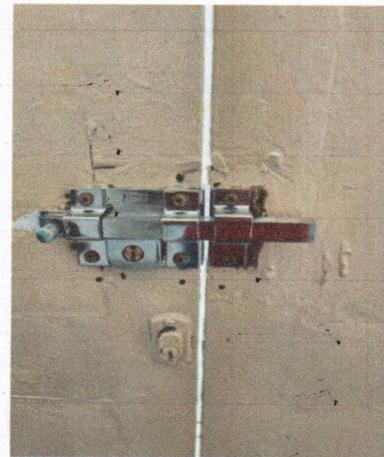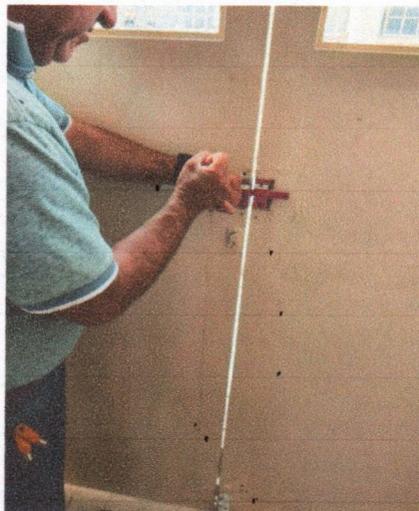

CONTRATISTA

SUPERVISION UAAAN

SOLUCIONES INTEGRALES	
 SOLUCIONES INTEGRALES <small>REGISTRADO</small> <small>INTEGRACION</small>	
OBRA : MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL	
FECHA : 25/03/2024 - 30/04/2024	
CONTRATO : 01824	
DESCRIPCION DE LA OBRA	
1.2	
(INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION) 20. MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE CHAPA TIPO BARRA, MARCA PHILIPS O SIMILAR	



SUPERVISION UAAAH

CONTRATISTA

SOLUCIONES INTEGRALES



OBRA : MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL

CLAVE : UBICACIÓN: Saltillo, Coah

CONTRATISTA : SOLUCIONES INTEGRALES

CONTRATO: 019/24

ESTIMACION No:

FECHA: 25/03/2024 - 30/04/2024

1,9

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE A PUERTAS Y ACCESOS DEL LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE PREPARACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN)



CONTRATISTA

SUPERVISION UAAAN



SOLUCIONES INTEGRALES



OBRA : MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL

CLAVE : UBICACIÓN: Saltillo, Coah

CONTRATISTA : SOLUCIONES INTEGRALES

CONTRATO: 019/24

ESTIMACION No:

FECHA: 25/03/2024 - 30/04/2024

1,1

MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE EPOXICO A MAQUINA KJELDAHL EN EL AREA DE CUBICULOS DEL LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE PREPARACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION)



X

CONTRATISTA

SUPERVISION UAAAN



SOLUCIONES INTEGRALES



OBRA : MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL

CLAVE : **UBICACIÓN:** Saltillo, Coah

CONTRATISTA : SOLUCIONES INTEGRALES

CONTRATO: 019/24

ESTIMACION No:

FECHA: 25/03/2024 - 30/04/2024

1,11

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE CON COLORES REPRESENTATIVOS A TUBERIAS HIDRAULICAS, DE GAS Y CONTRA INCENDIOS DEL LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL (INCLUYE PREPARACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN)



CONTRATISTA

SUPERVISION UAAAN



Soluciones Integrales

Bvld Juan Navarro 3181 Col Vista Hermosa
Saltillo Coahuila México
Tel. 844-174-7018 / 844-403-0088



BITÁCORA DE OBRA

Con esta fecha, 30 de abril del 2024, se apertura el presente documento que tendrá la función de bitácora de obra, mismo que se utilizará como medio de comunicación entre las partes involucradas en el proceso de ejecución de obra y servirá para registrar los resultados verificados de calidad y de volúmenes, especificaciones, anotaciones de incidencias de obra relevantes, registro del avance y demás asuntos de carácter legal, técnico, administrativo y de seguridad que se presenten durante el periodo de ejecución de los trabajos relativos a OBRA : "MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL", con número de contrato: 019/24 AD.MTTO con un importe de \$240.613.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M.N. 00/100 M.N.) IVA incluido. , cuya ubicación se encuentra dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, calz. Antonio Narro, No. 1923, col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, México, con la responsabilidad de ejecutar los trabajos a cargo de la empresa **SOLUCIONES INTEGRALES**, con un tiempo de ejecución de 37 días calendario, estableciendo como fecha de inicio el día LUNES 25 DE MARZO 2024 al MARTES 30 DE ABRIL 2024, periodo durante el que estará vigente y hasta que se levante el acta de entrega-recepción de esta obra.


CLAUDIA VERONICA DURAN ARELLANO
CONTRATISTA


ARQ MARIO GUTIERREZ
Supervisor de obra







SOLUCIONES INTEGRALES

Blvd Juan Navarro 3181 Col Vista Hermosa
Saltillo Coahuila México
Tel. 844-174-7018 / 844-403-0088



BITÁCORA DE OBRA				
OBRA:	MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL			
CONTRATO:	019/24 AD MTTO	No. De páginas		
FECHA DE INICIO:	LUNES 25 DE MARZO 2024	001	de	009
FECHA DE TERMINACIÓN:	MARTES 30 DE ABRIL 2024			

Fecha:	LUNES 25 DE MARZO 2024
Descripción:	en este día se presenta el ingeniero Leonardo Moreno con una Cuadrilla para hacer una reparación de laboratorio de nutrición animal a cargo de la doctora Camelia y que consta de lo siguiente si hay son un estudio y se detecta que toda la losa está agrietada y con yeso falsamente adherido motivo por el cual iniciaremos con la demolición de todo el yeso del área de laboratorio y de cubículos pero posteriormente cubrimos los equipos y mesas de laboratorio con plásticos y se reubican los equipos de trabajo a un cubículo de esta manera iniciamos labores de demolición el ingeniero Leonardo Moreno lleva una Cuadrilla de aproximadamente nueve personas las cuales estarán trabajando a lo largo de la reparación de laboratorio de los cubículos también se hace mención que se nos presta una llave para poder laborar en un horario de 8 de la mañana hasta 6 p.m
Fecha:	MARTES 26 DE MARZO 2024
Descripción:	llegamos a las 8 a.m y continuamos con trabajos de demolición de yeso de los laboratorios de nutrición animal y de cubículos se hace mención que el supervisor el arquitecto Mario Gutiérrez visita el lugar de la obra a las 10 a.m y revisa pendientes y que las labores continúen como él lo indica
Fecha:	MIERCOLES 27 DE MARZO 2024
Descripción:	llegamos a las 8 a.m y continuamos con trabajos de demolición de yeso en laboratorio de nutrición animal se hace mención que la doctora Camelia hace recorrido por el área y revisa que los trabajos se lleven en orden 14 horas acude el arquitecto Mario Gutiérrez supervisor de la obra y hace su recorrido se hace mención que todo el escombro que está saliendo es colocado en el exterior para que en su momento venga un camión a llevarse el desecho fuera de la universidad 18 horas nos retiramos dejando en orden
Fecha:	JUEVES 28 DE MARZO 2024
Descripción:	llegamos a las 8 a.m para continuar trabajos de demolición de yeso falsamente adherido 9 a.m el arquitecto Mario Gutiérrez hace su recorrido como de costumbre y revisa que todo vaya como él lo indicó también se hace mención que el día de hoy empezamos a tumbar la pintura falsamente adherida de las paredes pintura de vinílica y también empezamos a raspar la pintura de esmalte falsamente adherida en protecciones y puertas todo el desecho se está acumulando Afuera de laboratorio para que en su momento un camión se lo lleve se hace mención que a las 18 horas nos retiramos dejando todo en orden

ARQ MARIO GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE OBRA UAAAN

CLAUDIA VERÓNICA DURAN ARELLANO
CONTRATISTA



SOLUCIONES INTEGRALES

Blvd Juan Navarro 3181 Col Vista Hermosa
Saltillo Coahuila México

Tel. 844-174-7018 / 844-403-0088



BITÁCORA DE OBRA				
OBRA:	MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL			
CONTRATO:	019/24 AD MTTO	No. De páginas		
FECHA DE INICIO:	LUNES 25 DE MARZO 2024	002	de	009
FECHA DE TERMINACIÓN:	MARTES 30 DE ABRIL 2024			

Fecha:	Viernes 29 de marzo del año 2024			
Descripción:	llegamos a las 8 a.m y posteriormente llegamos con los primeros 40 bultos de yeso para empezar el aplanado y la colocación de este en toda el área de la losa de laboratorio de producción animal y de los cubículos también se hace mención que continúan los trabajos de resane de pinturas en paredes y en protecciones 14 horas llega el arquitecto Mario Gutiérrez a revisar los trabajos que se están realizando 18 horas nos retiramos dejando en orden			
Fecha:	Sábado 30 de marzo del año 2024			
Descripción:	se arman andamios en el interior de laboratorio y posteriormente continuamos trabajos de colocación de yeso a plomo en la Loza de laboratorio de nutrición animal también se hace mención que continúan los trabajos de resane en paredes en protecciones en puertas y a su vez empezamos a hacer el levantamiento de la cantidad de lámparas que se van a ocupar para El reemplazo de todas las dañadas que son un total de 12 piezas estas serán lámparas led de 120 que serán suministradas por el contratista 13 horas llega el arquitecto Mario Gutiérrez a la supervisión de los trabajos 18 horas nos retiramos dejando en orden			
Fecha:	Domingo 31 de marzo del año 2024			
Descripción:	continuamos con los trabajos de la colocación de yeso en el laboratorio de nutrición animal y en cubículos de nutrición animal continúan los trabajos de resanes de pintura vinílica y de esmalte se hace mención que se hace un levantamiento para ver la cantidad de manijas que se van a ocupar para la colocación en las mesas de laboratorio de nutrición animal 16 horas nos retiramos dejando en orden			
Fecha:	Lunes 1 de abril del año 2024			
Descripción:	8 a.m nos presentamos en el laboratorio de la universidad para continuar con los trabajos de colocación de yeso en el laboratorio y en cubículos Así mismo continúan trabajos de limpieza y se saca todo el escombros para dejarse fuera de laboratorio donde sera recogido por un camión para que se lo lleve fuera de la universidad , el día de hoy el arquitecto acudió a las 14 horas a realizar el recorrido de los trabajos en orden continúan los trabajos de resanes de pintura en paredes y en protecciones también se hace mención al arquitecto Mario Gutiérrez que la limpieza de vidrios inicia pero sin antes mencionar que estos debido a los ácidos a los que están expuestos en laboratorio.			

ARQ MARIO GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE OBRA UAAA

CLAUDIA VERÓNICA DURAN ARELLANO
CONTRATISTA

SOLUCIONES INTEGRALES

Blvd Juan Navarro 3181 Col Vista Hermosa
Saltillo Coahuila México
Tel. 844-174-7018 / 844-403-0088



BITÁCORA DE OBRA				
OBRA:	MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL			
CONTRATO:	019/24 AD MTTO	No. De páginas		
FECHA DE INICIO:	LUNES 25 DE MARZO 2024	003	de	009
FECHA DE TERMINACIÓN:	MARTES 30 DE ABRIL 2024			

Fecha:	Martes 2 de abril del año 2024
Descripción:	continuamos con los trabajos de colocación de yeso en las losas de laboratorio y de cubículos también iniciando trabajos a las 8 a.m 10 de la mañana Llegamos con más bultos de yeso para iniciar su colocación 12 del mediodía llega la doctora Camelia acompañado del arquitecto Mario Gutiérrez para realizar su recorrido de rutina se le hace mención de que los vidrios están muy manchados pero solo nos sugieren que los limpiemos tal y como están sin necesidad de cambiarlos continuamos con trabajos de resanes de limpiezas y de escombros 18 horas nos retiramos dejando en orden
Fecha:	Miércoles 3 de abril del año 2024
Descripción:	8 de la mañana Llegamos listos para iniciar trabajos de colocación de yeso en laboratorio de nutrición animal de la doctora Camelia 9 a.m el arquitecto Mario Gutiérrez se presenta hacer el recorrido y revisar que todo vaya en orden continuamos con labores de limpieza 18 horas nos retiramos dejando en orden
Fecha:	Jueves 4 de abril del año 2024
Descripción:	nos presentamos por la mañana a las 8 a.m para continuar trabajo de colocación de yeso en toda la losa de laboratorio en este día llega un camión y carga parte del escombro que ha salido para realizar limpieza del área 18 horas nos retiramos dejando en orden
Fecha:	Viernes 5 de abril del año 2024
Descripción:	llegamos a las 8 a.m para continuar el trabajo de colocación de yeso en toda la losa de laboratorio y cubículos se hace mención que en dos días más acabamos toda la colocación del yeso también se menciona que todos los equipos están resguardados con plástico 14 horas llega el arquitecto Mario Gutiérrez a realizar el recorrido de rutina 18 horas nos retiramos dejando en orden

ARQ MARIO GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE OBRA UAAAN

CLAUDIA VERÓNICA DURAN ARELLANO
CONTRATISTA

SOLUCIONES INTEGRALES

Sivd Juan Navarro 5181 Col Vista Hermosa
 Satélite Cuernavaca México
 Tel. 844 174-7018 / 844-403-0088



BITÁCORA DE OBRA	
OBRA: MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CURSULOS DE NUTRICION ANIMAL	
CONTRATO: 01924 ADM TITO	No. De páginas
FECHA DE INICIO: LUNES 22 DE MARZO 2024	003 de 000
FECHA DE TERMINACION: MARTES 30 DE ABRIL 2024	

Fecha: Martes 2 de abril del año 2024	Descripción: Continuar con los trabajos de colocación de yeso en las fajas de laboratorio y de cursos también intentando trapear a las 8 am a las 10 de la mañana. Llegamos con más paños de yeso para iniciar su colocación a las 12 del medio día llega la doctora Camelia acompañada del arquitecto Mario Gutiérrez para realizar su recorrido de rutina se le hace mención de que los vidrios están muy manchados pero solo nos sugieren que los limpiemos tal y como están sin necesidad de cambios continuamos con trabajos de limpieza de paredes y de escobras 18 horas nos retiramos dejando en orden.
Fecha: Miércoles 3 de abril del año 2024	Descripción: Se va mañana llegamos listas para iniciar trabajos de colocación de yeso en laboratorio de nutrición animal de la doctora Camelia y a m el arquitecto Mario Gutiérrez se presenta hacer el recorrido y revisar que todo vaya en orden continuamos con labores de limpieza 18 horas nos retiramos dejando en orden.
Fecha: Jueves 4 de abril del año 2024	Descripción: nos presentamos por la mañana a las 8 am para continuar trabajo de colocación de yeso en toda la sala de laboratorio en este día llega un camion y cargó parte del escombro que ha salido para realizar limpieza del área 18 horas nos retiramos dejando en orden.
Fecha: Viernes 5 de abril del año 2024	Descripción: llegamos a las 8 am para continuar el trabajo de colocación de yeso en toda la sala de laboratorio y cursos se hace mención que en dos días más acabamos toda la colocación del yeso también se menciona que todos los equipos están resguardados con plástico 14 horas llega el arquitecto Mario Gutiérrez a realizar el recorrido de rutina 18 horas nos retiramos dejando en orden.

SOLUCIONES INTEGRALES

Blvd Juan Navarro 3181 Col Vista Hermosa
Saltillo Coahuila México

Tel. 844-174-7018 / 844-403-0088



BITÁCORA DE OBRA

OBRA:	MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL		
CONTRATO:	019/24 AD MTTO	No. De páginas	
FECHA DE INICIO:	LUNES 25 DE MARZO 2024	004	de 009
FECHA DE TERMINACIÓN:	MARTES 30 DE ABRIL 2024		
Fecha:	Sábado 6 de abril del año 2024		
Descripción:	llegamos a las 8 a.m para continuar con las labores de colocación de yeso 16 horas nos retiramos dejando en orden		
Fecha:	Domingo 7 de abril del año 2024		
Descripción:	llegamos a las 8 a.m para continuar con las labores de colocación de yeso 16 horas nos retiremos dejando en orden		
Fecha:	Lunes 8 de abril del año 2024		
Descripción:	llegamos a las 8 a.m para continuar con las labores de colocación de yeso La idea es finalizar la colocación el día de hoy 10 a.m llega el arquitecto Mario Gutiérrez para hacer su recorrido de rutina y revisar que todo se encuentra en orden se realizan labores de limpieza Pues a las 16 horas finalizamos la colocación del yeso 18 Ahora nos retiramos dejando en orden		
Fecha:	Martes 9 de abril del año 2024		
Descripción:	llegamos a las 8 a.m e iniciamos con labores de colocación de pintura vinílica en paredes de laboratorio y en cubículos del mismo área la colocación de la pintura se hace mención que esas dos manos y es con pintura marca Berel a su vez se coloca plástico para no manchar pisos ni equipos de laboratorio 14 horas llega el arquitecto Mario Gutiérrez a realizar su recorrido y a dar su pisto Bueno del trabajo 18 horas nos retiramos dejando en orden		

ARQ MARIO GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE OBRA UAAAN

CLAUDIA VERÓNICA DURAN ARELLANO
CONTRATISTA



SOLUCIONES INTEGRALES

Bvld Juan Navarro 3181 Col Vista Hermosa
Saltillo Coahuila México

Tel. 844-174-7018 / 844-403-0088



BITÁCORA DE OBRA				
OBRA:	MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL			
CONTRATO:	019/24 AD MTTO	No. De páginas		
FECHA DE INICIO:	LUNES 25 DE MARZO 2024	005	de	009
FECHA DE TERMINACIÓN:	MARTES 30 DE ABRIL 2024			

Fecha:	Miércoles 10 de Abril del año 2024
Descripción:	llegamos a las 8 a.m para continuar con labores de colocación pintura vinílica y de esmalte en protecciones en puertas de laboratorio y cubículos de nutrición animal 18 horas nos retiramos en orden cabe mencionar que la parte de herramienta es de color crema colonial Tal como lo indica la doctora Camelia
Fecha:	Jueves 11 de abril del año 2024
Descripción:	llegamos a las 8 a.m para continuar con labores de colocación de pintura vinílica y de esmalte en cubículos y laboratorio de nutrición animal 14 horas se presenta el arquitecto Mario Gutiérrez a revisar y hacer su recorrido habitual 18 horas nos retiramos dejando en orden
Fecha:	Viernes 12 de abril del año 2024
Descripción:	llegamos a las 8 a.m para continuar con las labores de colocación de pintura vinílica en las paredes de laboratorio y de cubículos pero se hace mención que todo área se colocan plásticos también continuamos con labores de colocación de pintura de esmalte en protecciones y puertas 18 horas nos retiramos dejando en orden
Fecha:	Sábado 13 de abril del año 2024
Descripción:	nuevamente llegamos a las 8 a.m e iniciamos con la colocación y aplicación de pintura vinílica en paredes de laboratorio y de cubículos de nutrición animal llega la doctora Camelia a revisar los trabajos y el arquitecto Mario Gutiérrez se hace mención que los trabajos están llevando tal y cual como ellos lo indicaron 18 horas nos retiramos dejando en orden



ARQ MARIO GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE OBRA UAAAN


CLAUDIA VERÓNICA DURAN ARELLANO
CONTRATISTA

SOLUCIONES INTEGRALES

Bvtd Juan Navarro 2181 Col Vista Hermosa
Satlito Coahuila México

Tel. 844-174-7018 / 844-403-0088



BITACORA DE OBRA	
OBRA:	MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL
CONTRATO:	01924 ADMTO
FECHA DE INICIO:	LUNES 22 DE MARZO 2024
FECHA DE TERMINACION:	MARTES 26 DE ABRIL 2024
No. De paginas	de 002 de 002

Fecha:	Miércoles 20 de Abril del año 2024
Descripción:	Se realizaron trabajos de mantenimiento y limpieza en el laboratorio y cubículos de nutrición animal. Se revisó el estado de las pinturas y se procedió a su colocación en las áreas correspondientes. Se realizaron trabajos de pintura en las áreas de laboratorio y cubículos de nutrición animal. Se revisó el estado de las pinturas y se procedió a su colocación en las áreas correspondientes. Se realizaron trabajos de pintura en las áreas de laboratorio y cubículos de nutrición animal. Se revisó el estado de las pinturas y se procedió a su colocación en las áreas correspondientes.
Fecha:	Jueves 21 de Abril del año 2024
Descripción:	Se realizaron trabajos de mantenimiento y limpieza en el laboratorio y cubículos de nutrición animal. Se revisó el estado de las pinturas y se procedió a su colocación en las áreas correspondientes. Se realizaron trabajos de pintura en las áreas de laboratorio y cubículos de nutrición animal. Se revisó el estado de las pinturas y se procedió a su colocación en las áreas correspondientes. Se realizaron trabajos de pintura en las áreas de laboratorio y cubículos de nutrición animal. Se revisó el estado de las pinturas y se procedió a su colocación en las áreas correspondientes.
Fecha:	Viernes 23 de Abril del año 2024
Descripción:	Se realizaron trabajos de mantenimiento y limpieza en el laboratorio y cubículos de nutrición animal. Se revisó el estado de las pinturas y se procedió a su colocación en las áreas correspondientes. Se realizaron trabajos de pintura en las áreas de laboratorio y cubículos de nutrición animal. Se revisó el estado de las pinturas y se procedió a su colocación en las áreas correspondientes. Se realizaron trabajos de pintura en las áreas de laboratorio y cubículos de nutrición animal. Se revisó el estado de las pinturas y se procedió a su colocación en las áreas correspondientes.
Fecha:	Sábado 24 de Abril del año 2024
Descripción:	Se realizaron trabajos de mantenimiento y limpieza en el laboratorio y cubículos de nutrición animal. Se revisó el estado de las pinturas y se procedió a su colocación en las áreas correspondientes. Se realizaron trabajos de pintura en las áreas de laboratorio y cubículos de nutrición animal. Se revisó el estado de las pinturas y se procedió a su colocación en las áreas correspondientes. Se realizaron trabajos de pintura en las áreas de laboratorio y cubículos de nutrición animal. Se revisó el estado de las pinturas y se procedió a su colocación en las áreas correspondientes.

CONTRATISTA
CLARITA VERÓNICA MORALES
CARRANZA

SUPERVISOR DE OBRAS
RODRIGO GUTIERREZ

SOLUCIONES INTEGRALES

Blvd Juan Navarro 3181 Col Vista Hermosa
Saltillo Coahuila México
Tel. 844-174-7018 / 844-403-0088



BITÁCORA DE OBRA				
OBRA:	MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL			
CONTRATO:	019/24 AD MTTO	No. De páginas		
FECHA DE INICIO:	LUNES 25 DE MARZO 2024	006	de	009
FECHA DE TERMINACIÓN:	MARTES 30 DE ABRIL 2024			

Fecha:	Domingo 14 de abril del año 2024
Descripción:	9 a.m llegamos para iniciar labores de pintura en paredes y en protecciones y puertas interior y exterior de laboratorio de nutrición animal 16 horas nos retiramos dejando en orden
Fecha:	Lunes 15 de abril del año 2024
Descripción:	llegamos a las 8 a.m y en este día estamos iniciando labores de pintura vinílica en toda la losa interior de laboratorio de la doctora Camelia y de cubículos para asimilar el tono blanco que se está colocando en las paredes continuamos con trabajos de colocación de pintura esmalte en protecciones y puertas también se hace mención que se lubrican y se pintan extractores de toda el área dando una cantidad de seis piezas 18 horas nos retiramos dejando en orden
Fecha:	Martes 16 de abril del año 2024
Descripción:	llegamos a las 8 a.m para continuar con labores de aplicación de pintura a dos manos vinílica en el laboratorio y cubículos de nutrición animal esta colocación es en la losa para que tenga el mismo tono paredes y losas 14 horas llega el arquitecto Mario Gutiérrez a realizar su recorrido de rutina Estando todo en orden 18 horas nos retiramos dejando todo bien
Fecha:	Miércoles 17 de abril del año 2024
Descripción:	llegamos a las 8 a.m el día de hoy finalizamos la colocación de pintura vinílica en todo el laboratorio y cubículos de nutrición animal cabe mencionar que seguimos con la pintura Smart interior y exterior en protecciones y puertas se desinstalan persianas y estas al final serán colocadas nuevamente pero también se hace mención por indicaciones de la doctora Camelia que una se desechen a la basura Pues están rotas en su totalidad el día de hoy también iniciamos labores de Pulido de mesas de laboratorio con lija grano fino para posteriormente usar una aplicación de resina epóxica para su abrillantado y acabados 15 horas se presenta el arquitecto Mario Gutiérrez a revisar que todo se encuentra en orden 18 horas nos retiramos dejando en orden

ARQ MARIO GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE OBRA UAAA

CLAUDIA VERÓNICA DURAN ARELLANO
CONTRATISTA



BITÁCORA DE OBRA	
OBRA:	MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL
CONTRATO:	01924 ADM TITO
FECHA DE INICIO:	LUNES 25 DE MARZO 2024
FECHA DE TERMINACION:	MARTES 30 DE ABRIL 2024
No. De páginas	50

Fecha:	01 de abril del año 2024
Descripción:	Se van llegando para iniciar labores de pintura en paredes y en protecciones y puertas interior y exterior de laboratorio de nutrición animal. Se hacen los retiros dejando en orden.
Fecha:	02 de abril del año 2024
Descripción:	Se van llegando para iniciar labores de pintura en paredes y en protecciones y puertas interior de laboratorio de nutrición animal. Se hacen los retiros dejando en orden. Se cubren con plástico las pinturas que se están colocando en las paredes con cintas de protección de pintura. Se hacen los retiros dejando en orden.
Fecha:	03 de abril del año 2024
Descripción:	Se van llegando para iniciar labores de pintura en paredes y en protecciones y puertas interior de laboratorio de nutrición animal. Se hacen los retiros dejando en orden. Se cubren con plástico las pinturas que se están colocando en las paredes con cintas de protección de pintura. Se hacen los retiros dejando en orden.
Fecha:	04 de abril del año 2024
Descripción:	Se van llegando para iniciar labores de pintura en paredes y en protecciones y puertas interior de laboratorio de nutrición animal. Se hacen los retiros dejando en orden. Se cubren con plástico las pinturas que se están colocando en las paredes con cintas de protección de pintura. Se hacen los retiros dejando en orden.

SOLUCIONES INTEGRALES

Blvd Juan Navarro 3181 Col Vista Hermosa
Saltillo Coahuila México
Tel. 844-174-7018 / 844-403-0088



BITÁCORA DE OBRA				
OBRA:	MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL			
CONTRATO:	019/24 AD MTTO	No. De páginas		
FECHA DE INICIO:	LUNES 25 DE MARZO 2024	007	de	009
FECHA DE TERMINACIÓN:	MARTES 30 DE ABRIL 2024			


Fecha:	Jueves 18 de abril del año 2024
Descripción:	iniciamos colocación de pintura exterior e interior a cajones y gavetas de mesas de laboratorio En total son cuatro piezas a su vez se hace un levantamiento para la colocación de manijas también se realiza pintura en toda el área de cada mesa se continúa con el Pulido de las cubiertas 18 horas nos retiramos dejando en orden
Fecha:	Viernes 19 de abril del año 2024
Descripción:	en este día se continúa trabajos de Pulido de mesas y la colocación de resina epóxica también continúan trabajos de pintura de puertas cajones en exterior e interior y la colocación de manijas en este día también se desmontan 12 lámparas en mal estado y inician la colocación de lámparas nuevas tipo led de 120 con las especificaciones que pidió la doctora Camelia 18 horas nos retiramos dejando en orden
Fecha:	Sábado 20 de abril del año 2024
Descripción:	llegamos a las 8 a.m para continuar labores de colocación de lámparas En total son 12 se resanan los huecos y no queden expuestos se les ha acabado también iniciamos la colocación de unos muros de ladrillo para recibir una tarjeta nueva con todos los herrajes a su vez también se reemplaza una chapa tipo barra por el área de salida de emergencia cabe mencionar que para desmontarse esta chapa que no funcionaba se usó un pulidor y la otra se colocan la nueva con su herrajes Y si verifica su buen funcionamiento 18 horas nos retiramos dejando en orden no sin antes mencionar que el arquitecto Mario a las 10 a.m hizo su recorrido habitual encontrando Todo en orden
Fecha:	Domingo 21 de abril del año 2024
Descripción:	llegamos a las 8 a.m y se desmonta un fregadero en muy malas condiciones y se trae una tarja de acero inoxidable donde esta se monta y se le dan acabados para su colocación también se meten herrajes nuevos se mencionan a detalle que son llaves de metal trampas desagües e iniciamos la pintura epóxica a dos máquinas que estaban en muy malas condiciones se hace mención que estas están en los cubículos de laboratorio de nutrición animal 14 horas llega el arquitecto Mario Gutiérrez a realizar sus trabajos y su revisión de rutina 18 horas nos retiramos dejando en orden

ARQ MARIO GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE OBRA UAAAN

CLAUDIA VERÓNICA DURAN ARELLANO
CONTRATISTA

SOLUCIONES INTEGRALES

Blvd. Juan Navarro 2181 Col. Vista Hermosa
 Saltillo Coahuila México
 Tel: 844-71-7018 / 844-403-0088



BATAFORA DE ORO	
OBRA:	MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CLINICAS DE NUTRICION ANIMAL
CONTRATO:	01924 ADMITO
FECHA DE INICIO:	LUNES 22 DE MARZO 2024
FECHA DE TERMINACION:	MARTES 30 DE ABRIL 2024
No. De paginas	003 de 003

Fecha:	Viernes 19 de abril del año 2024
Descripción:	Iniciamos colocación de pintura exterior a pintar, 3 cajones y gavetas de mesas de laboratorio. total son cuatro piezas a su vez se hace un levantamiento para la colocación de manijas también se revisa pintura en toda el área de cada mesa se continúa con el fondo de las cubetas 18 horas nos retiramos dejando en orden
Fecha:	Sábado 20 de abril del año 2024
Descripción:	en esta día se continúan trabajos de fondo de mesas y colocación de rejillas eóxicas también se hacen trabajos de pintura de puertas cajones exterior interior y la colocación de manijas en este día también se demuestran 12 latas para el mal estado y iniciar la colocación de lámparas nuevas tipo led de 120 con las especificaciones que pide la doctora Pamela 18 horas nos retiramos dejando en orden
Fecha:	Domingo 21 de abril del año 2024
Descripción:	hacemos a las 8 am para continuar labores de colocación de lámparas en total son 12 se retiran los trozos y no quedan expuestas se les ha acabado también iniciamos la colocación de unos metros de jabón para recibir una tarjeta nueva con todas las tarjetas a su vez también se reemplaza una tarjeta tipo barra por el área de salidas de emergencia cabe mencionar que para demostrar esta tarjeta no funciona se usó un pulidor y se ordena la colocación de nueva con su tarjeta y si verifica su buen funcionamiento 18 horas nos retiramos dejando en orden no sin antes mencionar que el arreglo terminó a las 10 am. sólo se realizó habitual encontrando todo en orden
Fecha:	Viernes 26 de abril del año 2024
Descripción:	hacemos a las 8 am y se demuestran un frigorifero en muy malas condiciones y se trae una tarja de acero inoxidable donde está se monta y se le dan acciones para su colocación también se montan nuevos se mencionan a detalle que son lavas de metal frías frías e iniciamos la pintura epóxica a dos mándulos que están en muy malas condiciones se hace revisión de estas están en los cubetas de laboratorio de nutrición animal 14 horas llegó el pedido de Manijas lámparas y se revisa de 18 horas nos retiramos dejando en orden

SOLUCIONES INTEGRALES

Blvd Juan Navarro 3181 Col Vista Hermosa
Saltillo Coahuila México
Tel. 844-174-7018 / 844-403-0088



BITÁCORA DE OBRA				
OBRA:	MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL			
CONTRATO:	019/24 AD MTTO	No. De páginas		
FECHA DE INICIO:	LUNES 25 DE MARZO 2024	008	de	009
FECHA DE TERMINACIÓN:	MARTES 30 DE ABRIL 2024			

Fecha:	Lunes 22 de abril del año
Descripción:	2024 llegamos a las 8 a.m e iniciamos la colocación de pintura esmalte con colores representativos a tuberías hidráulicas de gas y contra incendios estas se hace mención que están colocadas y fijadas en la losa interior de laboratorio de nutrición animal los colores son azul marino amarillo y rojo y son una cantidad de 60 m lineales los cuales bajan a cada mesa de laboratorio también se hace mención que el día de hoy finalizamos la colocación de pintura de esmalte epóxico a máquinas Kendall en el área de cubículos de laboratorio de nutrición animal incluye su preparación su limpieza y todo lo necesario para su correcta aplicación el día de hoy también se detallan el suministro de colocación de una tarjeta de acero inoxidable Cómo se mencionó con su juego de herrajes mezcladora su fabricación de muros laterales con acabados para recibirla y todo lo necesario para su correcta funcionamiento también se hace mención que el día de hoy finaliza la limpieza de vidrios interior y exterior en todo el laboratorio y damos inicio a los trabajos de pintura exterior de laboratorio que es esmalte y vinílica las paredes 18 horas nos retiramos dejando en orden
Fecha:	Martes 23 de abril del año 2024
Descripción:	este día se realizan detalles y labores de limpieza en todo el área de laboratorio de nutrición animal y sus cubículos 10 de la mañana llega el arquitecto María Gutiérrez a realizar su recorrido marcando que todo está en orden
Fecha:	Miércoles 24 de abril del año 2024
Descripción:	en este día se detallan mesas Se vacía pintura epóxica en las cubiertas se termina de pintar cajones y gavetas así como la colocación de todas las manijas que faltan se realiza limpieza de laboratorio y se recoge toda la basura para posteriormente desecharse en un contenedor cabe mencionar que todo el material Sobrante como lo es las lámparas usadas y sin funcionar estas serán entregadas a mantenimiento 18 horas nos retiramos en orden
Fecha:	Jueves 25 de abril del año 2024
Descripción:	llegamos a las 8 a.m se realizan detalles en las cubiertas de las mesas en los cajones se realizan labores de limpieza se realizan inspección de limpieza de vidrios Se revisan a detalles que no haya faltantes de pintura 14 horas llega el arquitecto Mario Gutiérrez a realizar su inspección junto con la doctora Camelia

ARQ MARIO GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE OBRA UAAAN

CLAUDIA VERÓNICA DURAN ARELLANO
CONTRATISTA



BITACORA DE OBRA	
OBRA:	MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL
CONTRATO:	01924 ADMITO
FECHA DE INICIO:	LUNES 22 DE MARZO 2024
FECHA DE TERMINACION:	MARTES 30 DE ABRIL 2024
No. De páginas	008 de 009

Fecha:	Lunes 22 de abril del año 2024
Descripción:	Se realizaron a las 8 am e iniciamos la colocación de pintura esmalte con colores complementarios a cubiertas hidróblicas de gas y contra incendios estas se hace mención que están colocadas y fijadas en la zona interior del laboratorio de nutrición animal los colores son azul marino, amarillo y rojo y son una cantidad de 60 m lineales los cuales pasan a cada metro de laboratorio también se hace mención que el día de hoy finalizamos la colocación de pintura esmalte a máquinas Karcher en el área de cubículos de laboratorio de nutrición animal, incluye en esta mención en pintura y todo lo necesario para su correcta aplicación el día de hoy también se detalla el suministro de colocación de una tarjeta de acceso inoxidable. Como se mencionó con un juego de herramientas necesarias su fabricación de pintura laterales con acabados para recibir y todo lo necesario para su correcta instalación también se hace mención que el día de hoy finalizamos la limpieza de vitrina lateral y exterior en todo el laboratorio y damos inicio a los trabajos de pintura exterior de laboratorio que es esmalte y finalizamos las paredes 18 horas nos retiramos dejando en orden.
Fecha:	Martes 23 de abril del año 2024
Descripción:	esta día se realizan detalles y labores de limpieza en todo el área de laboratorio de nutrición animal y sus cubículos 10 de la mañana llega el arquitecto Mario Gutiérrez a realizar su recorrido marcado que todo está en orden.
Fecha:	Miércoles 24 de abril del año 2024
Descripción:	en esta día se detalla en zona de vacía pintura exterior en las cubiertas se terminan de pintar cubículos y gavetas así como la colocación de todas las manijas que faltan se realiza limpieza de laboratorio y se recoge toda la basura para posteriormente descartarse en un contenedor capacitado que todo el material sobrante como lo es las lámparas usadas y sin funcionar estas serán entregadas a mantenimiento 18 horas nos retiramos en orden.
Fecha:	Jueves 25 de abril del año 2024
Descripción:	se termina a las 8 am se realizan detalles en las cubiertas de las áreas en los colores se realizan labores de limpieza se realiza inspección de limpieza de vitrina se revisan a detalles que no haya faltantes de pintura 14 horas llega el arquitecto Mario Gutiérrez a realizar su inspección junto con la señora Camelia.

SOLUCIONES INTEGRALES

Blvd Juan Navarro 3181 Col Vista Hermosa
Saltillo Coahuila México
Tel. 844-174-7018 / 844-403-0088



BITÁCORA DE OBRA				
OBRA:	MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CUBICULOS DE NUTRICION ANIMAL			
CONTRATO:	019/24 AD MTTO	No. De páginas		
FECHA DE INICIO:	LUNES 25 DE MARZO 2024	009	de	009
FECHA DE TERMINACIÓN:	MARTES 30 DE ABRIL 2024			


Fecha:	Viernes 26 de abril del año 2024
Descripción:	llegamos a las 8 a.m continuamos con las labores de limpieza y pintura a las boquillas de gas en cada mesa de laboratorio 16 horas nos retiramos dejando en orden
Fecha:	Sábado 27 de abril del año 2024
Descripción:	9 a.m llegamos para continuar con labores de pintura boquillas y la colocación de manijas en mesas de laboratorio se realizan labores de limpieza también a su vez se colocan vitromuros en una campana de extracción que faltaban en esa área 14 horas nos retiramos dejando en orden
Fecha:	Domingo 28 de abril del año 2024
Descripción:	llegamos a las 9 a.m en este día finalizamos la pintura de las boquillas de líneas de gas se hacen labores de limpieza en cubiertas de mesas de laboratorio se retira todo la basura se deja limpieza en todo el área de cubículos y de Laboratorios de nutrición animal 14 horas nos retiramos dejando en orden
Fecha:	Lunes 29 de abril del año 2024
Descripción:	llegamos a las 8 a.m y en este día Se revisan a detalles para poder entregar laboratorio a la doctora Camelia y el arquitecto Mario Gutiérrez el día de mañana
Fecha:	Martes 30 de abril del año 2024
Descripción:	llegamos a las 8 a.m y en este día Se revisan a detalles para poder entregar laboratorio a la doctora Camelia y el arquitecto Mario Gutiérrez 13 horas llega el arquitecto en compañía de la doctora renacen hacen un recorrido por toda el área quedando todo en orden Se entregan llaves a la doctora y en este día estamos finalizando los trabajos llamado mantenimiento y laboratorio y cubículos de nutrición animal con el número de contrato 019 - 24 nos retiramos dejando el orden

ARQ MARIO GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE OBRA UAAAN

CLAUDIA VERÓNICA DURAN ARELLANO
CONTRATISTA

SOLUCIONES INTEGRALES

Blvd. Juan Álvarez 3487 Col. Vista Hermosa
 Saltillo Coahuila México
 Tel. 844-154-7018 \ 844-403-0088





BTTACORA DE OBRA	
OBRA: MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO Y CURRICULO DE NUTRICION ANIMAL	CONTRATO: 01924 ADMITO
FECHA DE INICIO: LUNES 22 DE MARZO 2024	No. de páginas: 05
FECHA DE TERMINACION: MARTES 30 DE ABRIL 2024	009



Fecha:	Viernes 26 de abril del año 2024	Descripción: Llegamos las 8 am con camioneros con las labores de limpieza y pintura a las pobladas de gas en cada mesa de laboratorio a horas nos retiramos dejando en orden
Fecha:	Sábado 27 de abril del año 2024	Descripción: Pasa llegamos para continuar con labores de pintura pobladas y la colocación de mantijas en mesa de laboratorio se realizan labores de limpieza también a su vez se colocan y retiramos en una campaña de extinción que faltaban en esa área 14 horas nos retiramos dejando en orden
Fecha:	Domingo 28 de abril del año 2024	Descripción: Llegamos a las 9 am en este día finalizamos la pintura de las pobladas de líneas de gas se hacen labores de limpieza en cubiertas de mesas de laboratorio se retira todo la basura se deja limpieza en todo el área de cubiertas y de laboratorios de nutrición animal 14 horas nos retiramos dejando en orden
Fecha:	Lunes 29 de abril del año 2024	Descripción: Llegamos a las 8 am y en este día se revisa a detalles para poder cargar laboratorio a la doctora Camelia y el arquitecto Mario Cubrex el día de mañana
Fecha:	Martes 30 de abril del año 2024	Descripción: Llegamos a las 8 am y en este día se revisa a detalles para poder cargar laboratorio a la doctora Camelia y el arquitecto Mario Cubrex 12 horas llega el arquitecto en compañía de la doctora Camelia hacen un recorrido por toda el área quedando todo en orden se entregan llaves a la doctora y en esta día se finalizan los trabajos haciendo mantenimiento y laboratorio y cubiertas de nutrición animal con el número de contrato 019 - 24 que retiramos dejando el orden

CLASIFICACIÓN TÉCNICA EN RAY X (RELLANO)
 CONTRATISTA

PROYECTO DE OBRAS DE
 EL PERSONAL DE OBRAS



Este reporte fotográfico ampara el suministro y colocación de chapas en puerta de emergencia de laboratorio de nutrición animal




[Handwritten signature]



[Handwritten signature]






ANTES

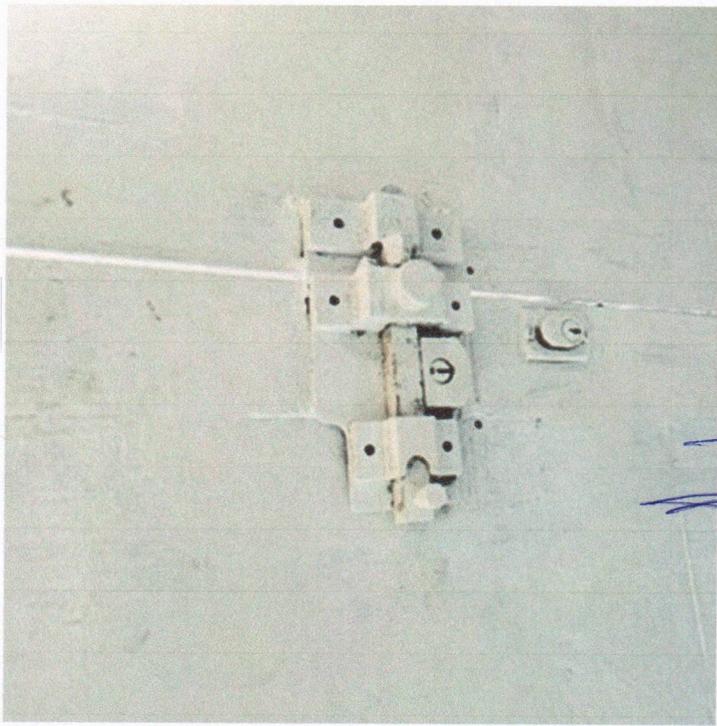






[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




DURANTE





DESPUÉS








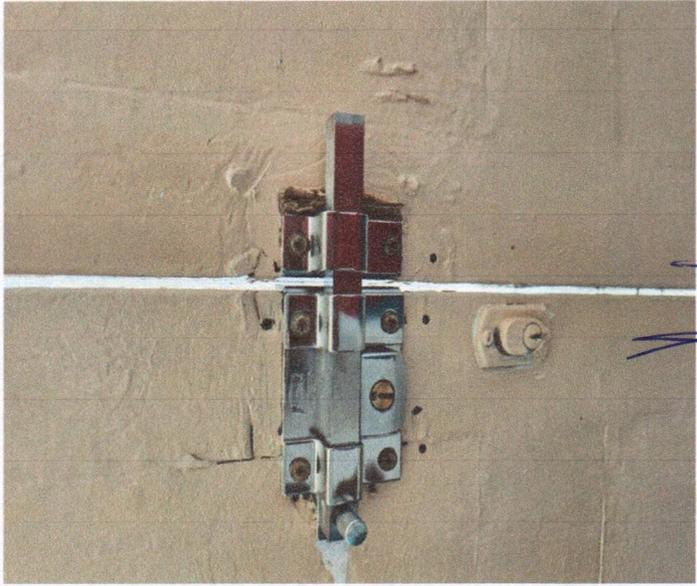



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

+

+











DESIGNÉS

+



+



Este reporte fotográfico ampara el suministro y colocacion de pintura esmalte en tuberia de laboratorio de nutricion animal










ANTES/DURANTE:



Handwritten signature





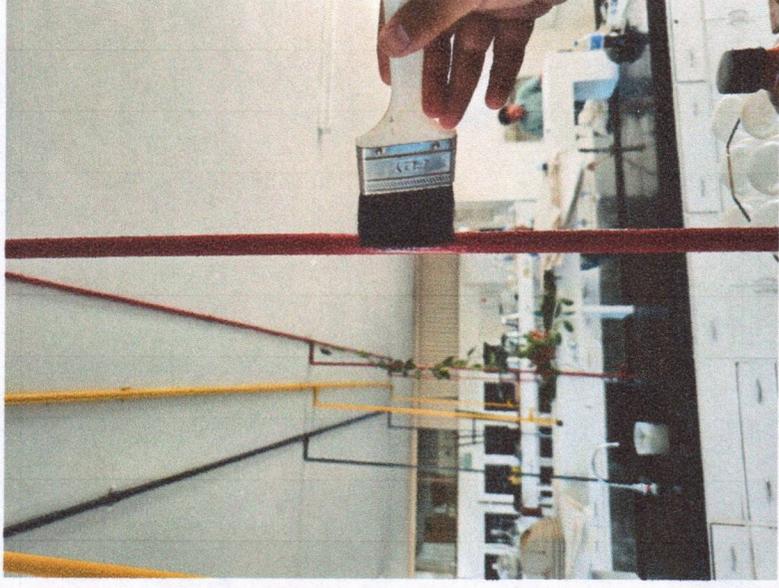


Handwritten signature












DESPUES:

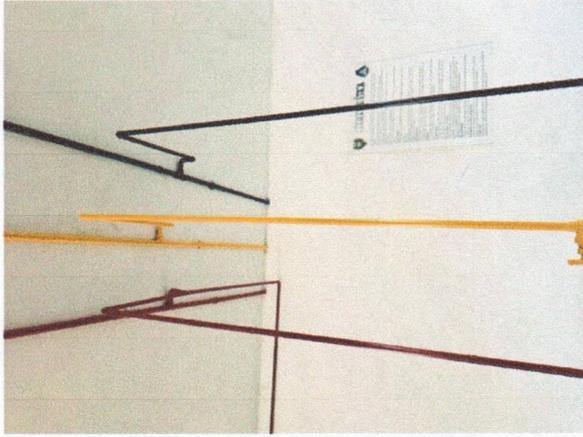





Este reporte fotográfico ampara el suministro y colocacion de pintura epoxica a aparato de kjedhal en laboratorio de nutricion animal








[Handwritten signature]



[Handwritten signature]








ANTES








DURANTE





ДНБВНЛЕ
